

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 115 年 3 月進度資料

資料截至 115/3/31

一、預定 31.58%

二、實際 30.55%

三、施作項目：

(一) P4-01、P4-03、P4-08 及 P4-09 全套管基樁施作及混凝土澆置、基樁機具檢修與維護

(二) P4 橋墩鋼筋籠加工

(三) P3 橋墩基礎開挖、地改灌漿，以及第一至三層擋土支撐（含三角架安裝、背填）施作

(四) P5 橋墩圍堰鋼板樁打設

(五) P6 橋墩中間樁打設及構台施作

(六) P7 墩柱第一、二層層混凝土 (SCC) 澆置、墩柱及帽梁鋼筋綁紮、模板組立、帽梁混凝土澆置


(七) 第一、二單元場撐段之整地、級配鋪設及預鑄 RC 墊放置

(八) 0K+901.9~0K+922 RT 側牆身混凝土澆置與模板拆除

(九) 工區噪音監測、放流水監測、海上浮球燈吊放、工區土方小搬運及物料整理、生態補償計畫執行方針會議、115 年 03 月



P1 及 P2 橋墩

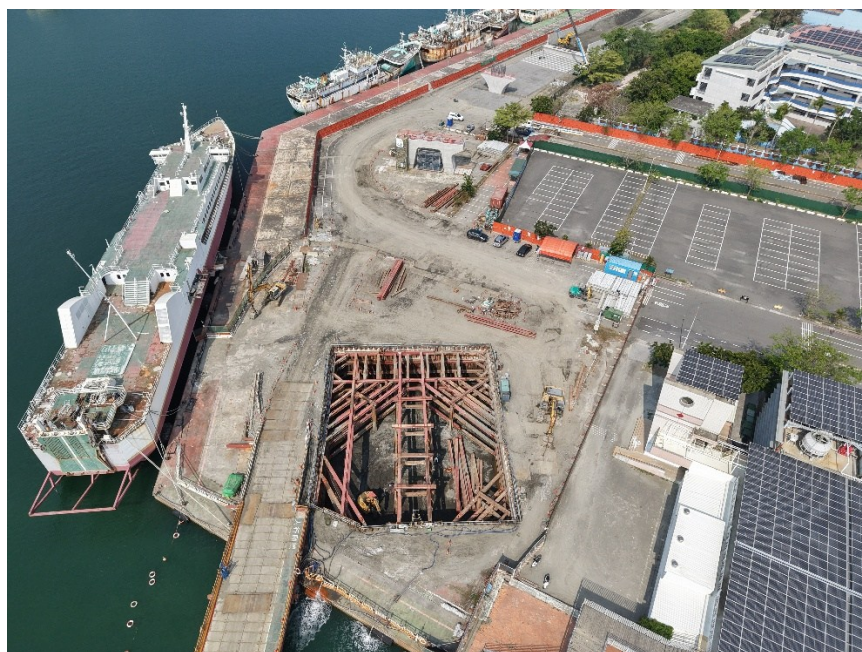


P3 橋墩擋土支撐施作

(第 23 次份)職安協
議組織會議、第 49、
50 次安衛環保暨施
工進度協調會、場撐
段第一單元施工前
教育訓練



P6 橋墩海上構台施作

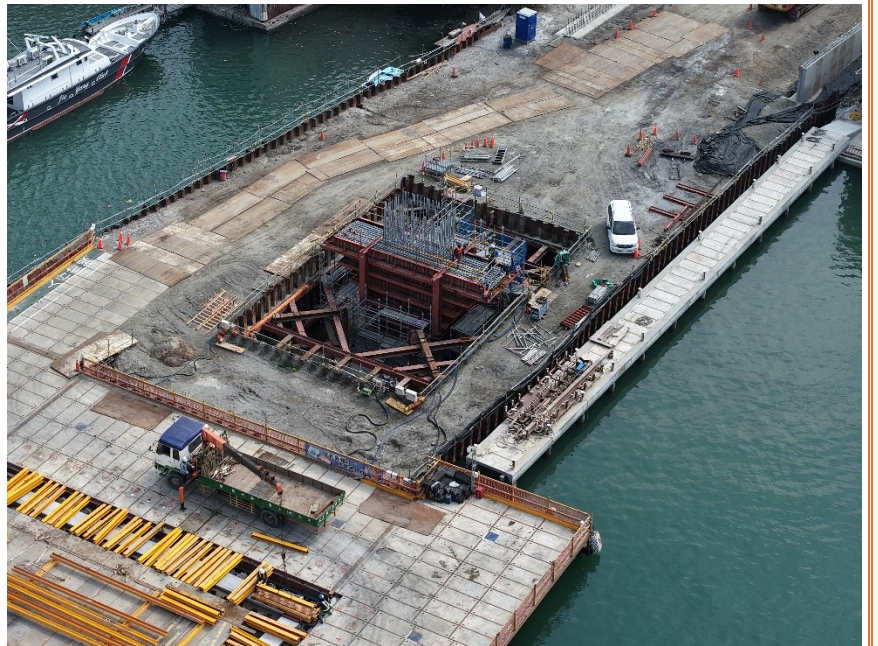

P7 橋墩帽梁施作
