

臺灣高等法院臺南分院新建辦公廳室統包工程 115 年 1 月進度資料

資料截至 115/1/29

一、預定進度：2.904%

二、實際進度：5.693%

三、施作項目：

(一) 1、2、3 區筏基筋綁紮

(二) 土方堆置場防塵網鋪設
覆蓋

(三) 1 區筏基筋層頂板位置
高層設置

(四) 邊坡不透水鋪鋪設

(五) B 棟機坑挖掘及基礎整
理


(六) 4、5 區土方開挖及搬運

工
區
照
片



工地位置：安平區育平路與建平八街交叉口

土
方
堆
置
區
照
片

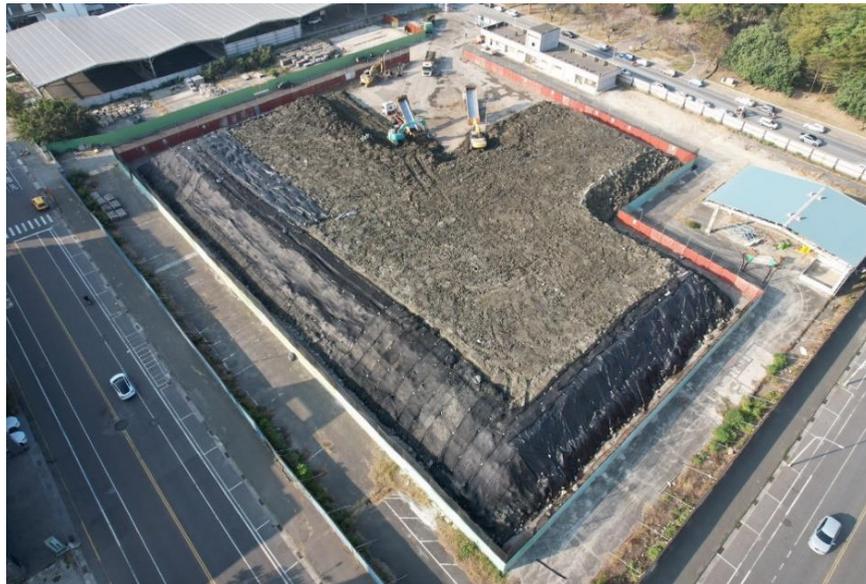

堆置區位置：臺南市安平區金華段 128 地號
