

臺灣高等法院臺南分院新建辦公廳室統包工程 115 年 2 月進度資料

資料截至 115/2/28

一、預定進度：3.26%

二、實際進度：6.34%

三、施作項目：

(一) 1、2、3 區筏基地梁牆身
模板施作

(二) 地梁牆身連通孔鋼筋切
割修改

(三) 1、2、3 區鋼構基礎螺栓
施作

(四) 4、5 區 PC 防水夾層防
水布吊運、施作


(五) A、B 棟交接處水泥砂漿
破碎及清理

工
區
照
片



工地位置：安平區育平路與建平八街交叉口

土
方
堆
置
區
照
片

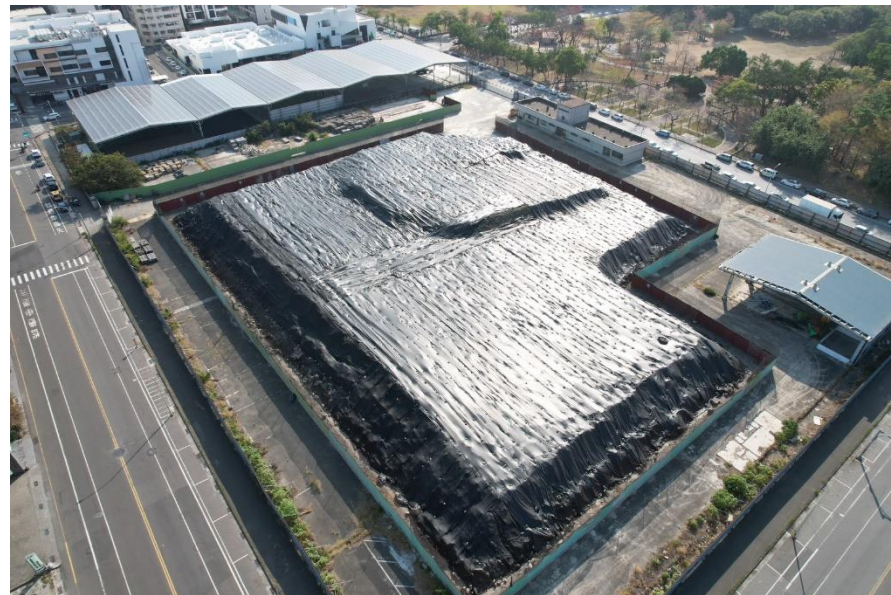

堆置區位置：臺南市安平區金華段 128 地號
