

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 115 年 8 月進度資料

資料截至 115/8/31

一、預定 44.01%

二、實際 39.37%

三、施作項目：


(一) P4 構台土方開挖及反力樁拔除、物料整運。

(二) P3 基礎墩柱樣架加工、組立、吊放與調整、P3 墩柱基礎第二昇層鋼筋綁紮。

(三) P5 構台立柱(反力樁)加工、接樁、打設與臨時過路段鋪設。

(四) P6 橋墩第二層擋土支撐拆除、P6 橋墩墩柱第一昇層混凝土 SCC 澆置、模板拆除與完成面修飾、P6 橋墩施工架搭設及剪力鋼箱設置前置作業。

(五) U1 單元底板及腹板混凝土澆置、模板拆除、U1 單元

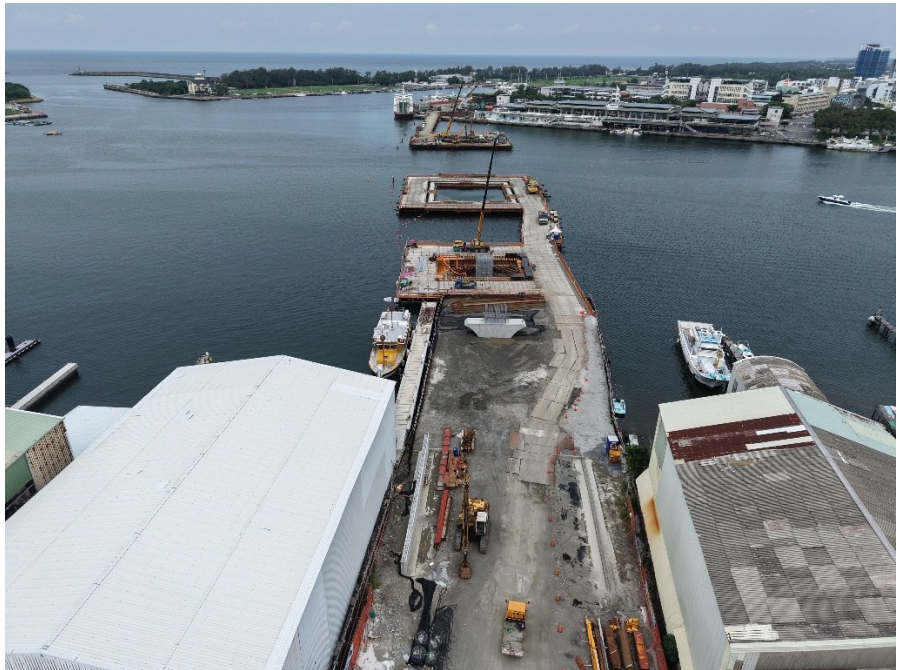

- 腹板鋼筋綁紮、模板加工組立及防震拉條安裝、頂板模板施作及橋面板鋼筋加工。
- (六) 工區噪音監測、放流水監測、生態檢核、防汛巡檢、職安協議組織會議暨施工風險協調會議、第59、60次安衛環保暨施工進度協調會議、進度管控會議、登革熱防治措施、工區積水抽水作業。
- (七) 熱危害現場救護演練、混凝土澆置精進會議、U1單元預力結構施工前教育訓練。



工區全景圖
