




工程範圍：截流設施、異常水處理設施、再生水機房、RO產水池及輸水管線新建與生物池改建



主辦機關
臺南市政府水利局
專案管理/監造廠商
艾奕康工程顧問(股)公司
統包廠商
惠民實業股份有限公司 實毅營造股份有限公司
工程經費
新臺幣861,578,130元
契約工期
730日曆天
供水量
8,000 CMD (預留最大 10,000 CMD)
開工日期
111年11月9日
預計完工日期
113年11月13日

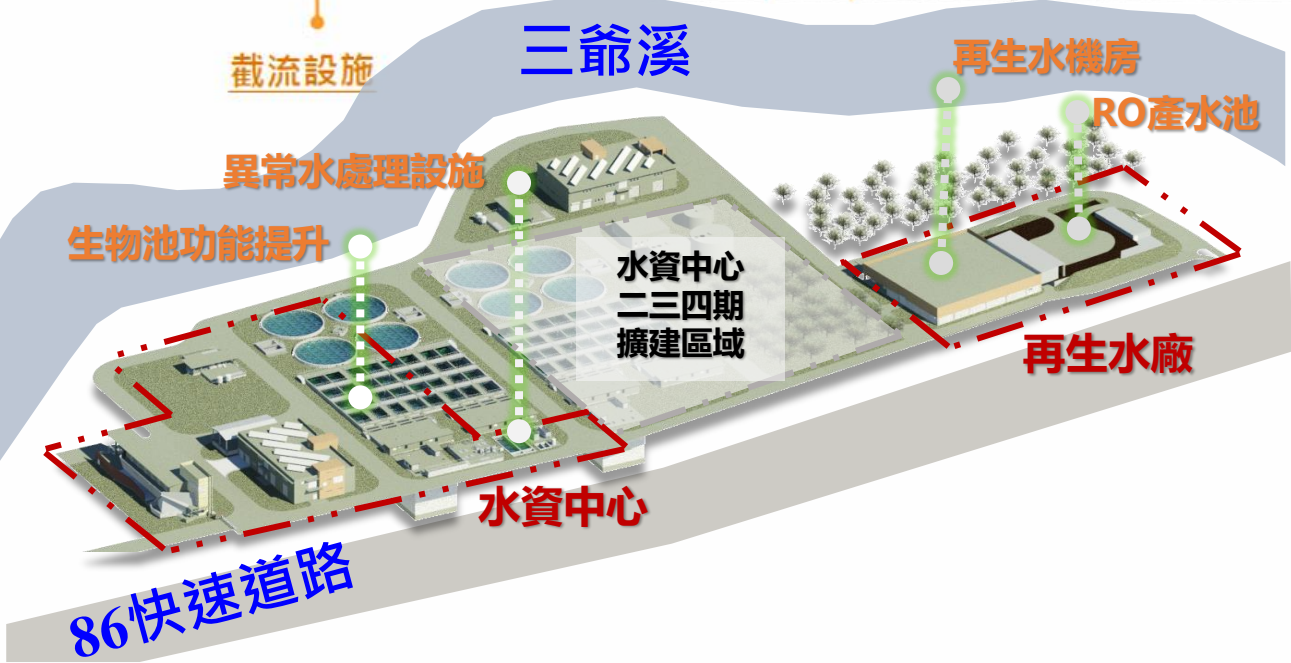

臺南市仁德再生水廠
新建工程統包計畫案

工程進度與現況

進度：實際 77.44 %，預定 77.38 % (統計至 113 年 7 月 7 日止)

施作主工項：鋼構組立、異常水質預警設施與生物池優化工程施作、材料查驗、輸水管線施作



行政院公共工程委員會施工查核



職業安全衛生優良工程金安獎評審



內政部施工查核

