

# 竹溪流域周邊景觀改善計畫-河岸周邊景觀改造工程

(承攬廠商:唐億營造)

109年03月04日

1、預定進度 :98.29% 實際進度 :98.98% 進度超前 0.69%


2、排水整地工程施作，鋪面施作，水電施作，右岸公廁施作，植栽施作，右岸擋土牆施作，府連截流設施工程施作，大林國宅無障礙設施工程鋼構組裝



出水口裝修



右岸擋土牆施作

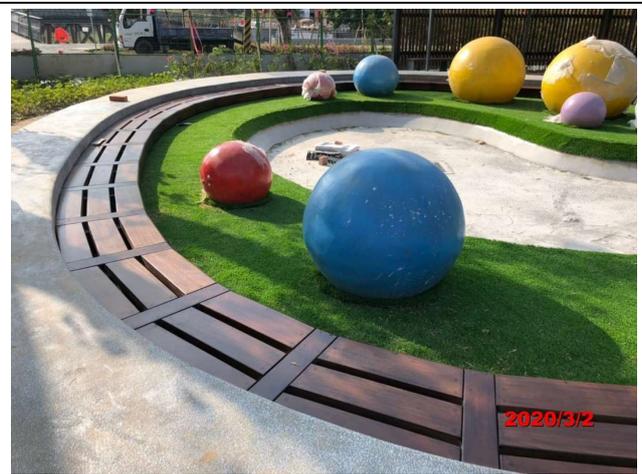

遊戲區施作完成



大林國宅無障礙設施工程施作



河道現況

