




工程範圍：截流設施、異常水處理設施、再生水機房、RO產水池及輸水管線新建與生物池改建



主辦機關
臺南市政府水利局
專案管理/監造廠商
艾奕康工程顧問(股)公司
統包廠商
惠民實業股份有限公司 實毅營造股份有限公司
工程經費
新臺幣861,578,130元
契約工期
730日曆天
供水量
最大 10,000 CMD
開工日期
111年11月9日
預計完工日期
113年11月6日

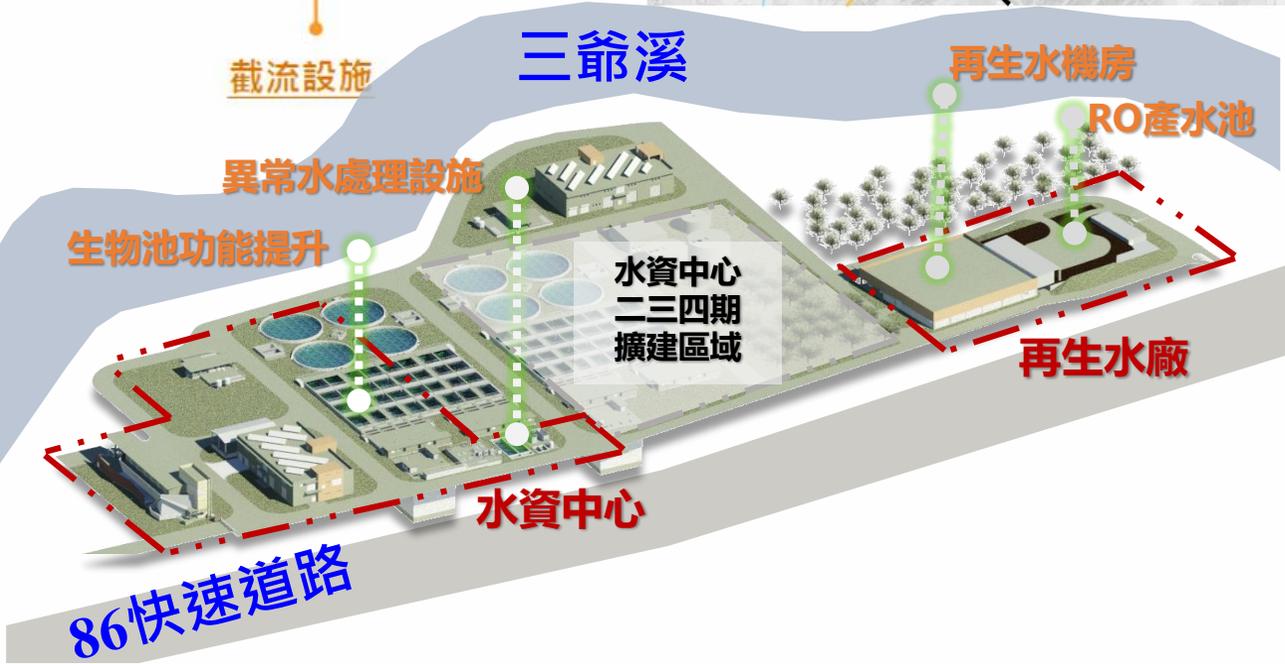

臺南市仁德再生水廠
新建工程統包計畫案

工程進度與現況

進度：預定 3.31%；實際 3.33%；+0.02%
施作主工項：地質改良工程施作及交通維持計畫審查



2023/9/11 上午8:05

