




臺南市仁德再生水廠
新建工程統包計畫案

工程基本資料

工程範圍：截流設施、異常水處理設施、再生水機房、RO產水池及輸水管線新建與生物池改建

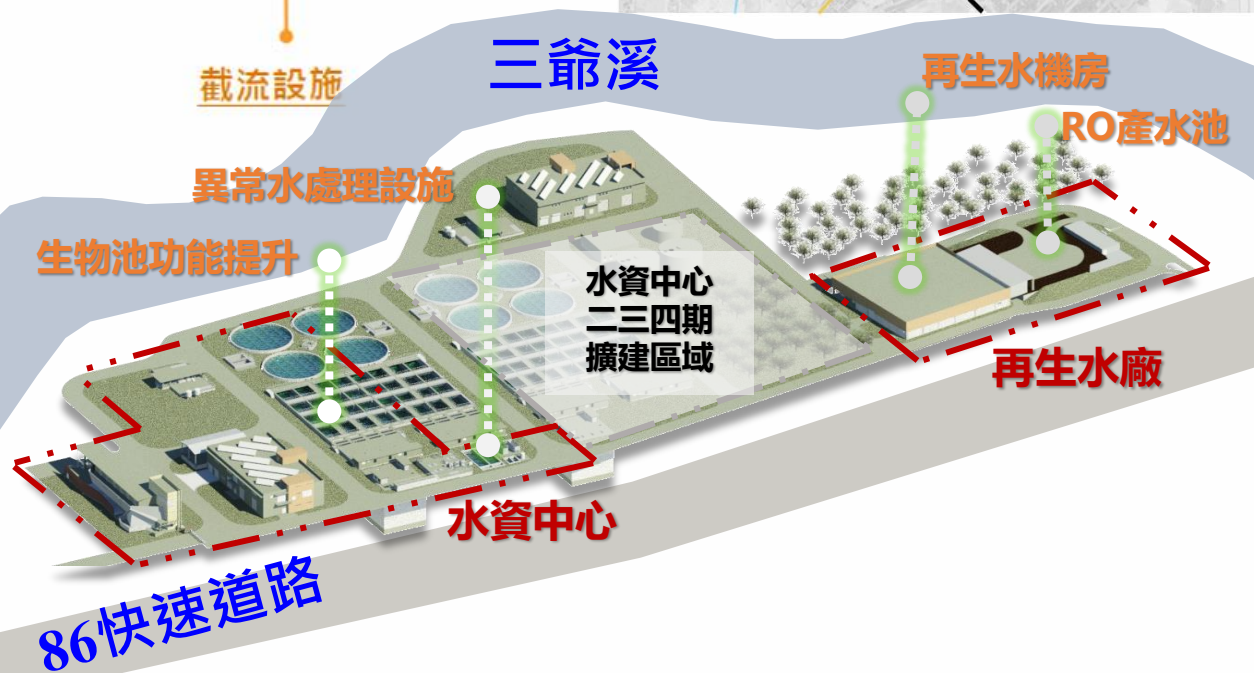

主辦機關

臺南市政府水利局

專案管理/監造廠商

艾奕康工程顧問(股)公司

統包廠商

惠民實業股份有限公司
實毅營造股份有限公司

工程經費

新臺幣861,578,130元

契約工期

730日曆天

供水量

8,000 CMD
(預留最大 10,000 CMD)

開工日期

111年11月9日

預計完工日期

113年11月12日



臺南市仁德再生水廠
新建工程統包計畫案

工程進度與現況

進度：實際 23.03 %，預定22.17 % (統計至113年2月20日止)

施作主工項：廠區RO產水池模板組立、鋼筋現場加工作業、材料查驗、輸水管線明挖施作

