




工程基本資料

輸水管線

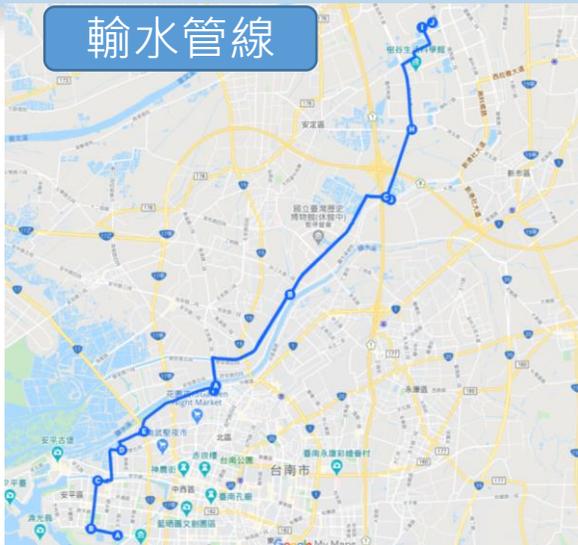

環教中心



再生水廠



環教中心



主辦機關
臺南市政府水利局
委辦機關
科技部南部科學工業園區管理局
設計/監造廠商
美商傑明工程顧問(股) 台灣分公司
施工廠商
欣達環工 股份有限公司
契約金額
新臺幣3,636,000,000元
契約工期
780日曆天(第一階段供水) 1,510日曆天(第二階段供水)
供水量
第一階段:10,000CMD 第二階段:37,500CMD
開工日期
109年6月17日
預計完工日期
113年10月13日



預定進度：4.055 % · 實際進度：4.360 % · 進度差異：+ 0.305 %。(統計至110年5月20日)

第七工作面
樹谷大道、木柵港西路
預計完成日期:2022/7/12
預定長度:2,400 m · 已完成840 m

第八工作面
安順二路、三抱竹路、南科九路
預計完成日期:2022/2/14
預定長度:1,570 m · 已完成138 m

南科配水池：


- 假設工程完成(圍籬、整地)。
- 建照執照申請
- 完成安全監測設置(水位觀測井8處、土壤傾斜管14處及沉陷觀測釘16處)。
- 開挖範圍區域欄杆架設。

環境教育中心：

- 監測點監測。
- 建照執照申請。
- 地質改良施作完成。

再生水廠：

- 假設工程完成(圍籬、整地)。
- 鋼筋籠吊裝及混凝土澆置查驗
- 基樁打設，總共97支，預計5月底完成。

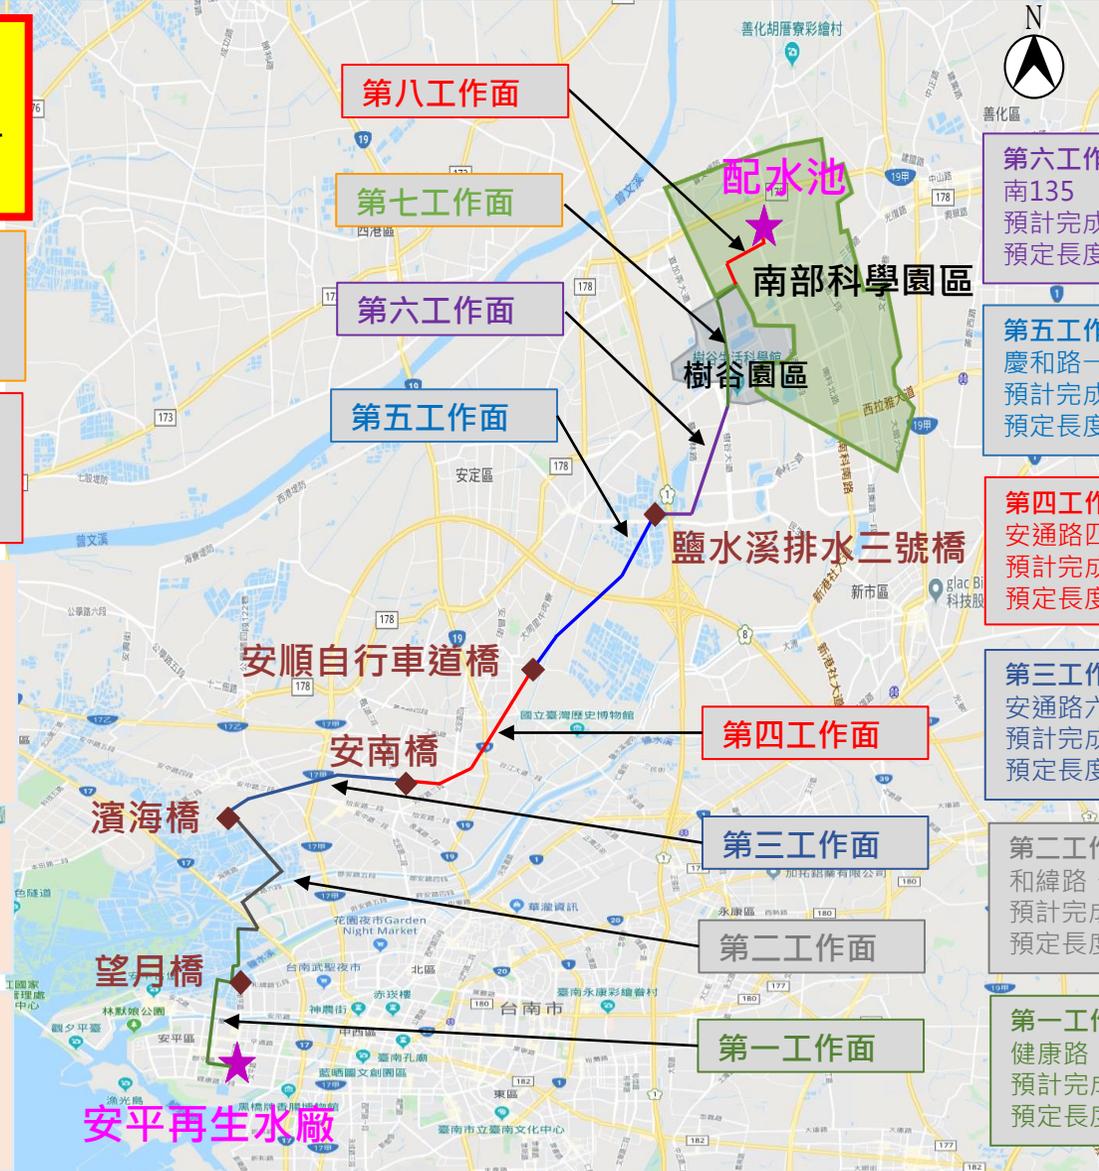

第六工作面
南135
預計完成日期:2022/6/5
預定長度:2,690 m · 已完成0 m

第五工作面
慶和路一段、慶和路二段、大洲防汛道路
預計完成日期:2022/5/10
預定長度:3,650 m · 已完成0 m

第四工作面
安通路四段、三段、二段、開安三街
預計完成日期:2022/6/30
預定長度:3,430 m · 已完成0 m

第三工作面：
安通路六段、五段
預計完成日期：2022/6/12
預定長度：3,190 m · 已完成0 m

第二工作面：
和緯路、大興街602巷、府安路七段、永續街
預計完成日期：2022/7/29
預定長度：2,900 m · 已完成0 m

第一工作面：
健康路、國平路、慶平路、民權路、華平路
預計完成日期：2022/5/24
預定長度：3,560 m · 已完成694 m

安平再生水廠



工程進度

