

臺南市安南區公所

日期：9/25
簽證號：4072

採購（費用動支）申請單暨粘貼憑證用紙

憑證編號	預算科目	金額	用途說明
	業務計畫： 工作計畫： 用途別：災害準備金 二級用途別：	\$270,077	103年度：區災害搶險搶修工程（開口契約）~第二次工程款 <input type="checkbox"/> 代扣二代健保費：元，實支270,077

經（承）辦單位	相關單位	會計單位	機關長官
經（承）辦人	<input type="checkbox"/> 所得稅	審核人員	主任秘書
驗收（證明）	保管（登記） <input checked="" type="checkbox"/> 消耗品 <input type="checkbox"/> 非消耗品 <input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 軟體	單位主管	主任秘書
會驗（使用或接管單位）	經辦人印單即用 單位主管	會計室主任 103.9.25	區長
單位主管 經建課課長 103.9.26	行政課課長		

CL 30570601

統一發票專用紙（二聯式）

一〇三年九月十月份

中華民國103年9月25日

買受人：臺南市安南區公所

地址：縣市 鄉鎮市區 路街 段 巷 弄 號 樓 室

品名	數量	單價	金額	備
103年度區災害搶險搶修工程（開口契約）	乙式	270,077	270,077	002-1030721 003-1030721 004-1030722 營業人蓋用統一發票專用章
總計			270,077	
總計新臺幣（中文大寫）	總	千	百	元
課稅別	應稅	零稅率	免稅	



※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票，並應於各該開行「✓」。

第二聯 收執聯

103.9.25	單位主管 經建課課長	審核人員	區長
意見：	經辦人	單位主管	會計室主任 103.9.26
	單位主管	單位主管 經建課課長	區長

備註：若未依規定優先採購綠色環保產品，應敘明理由，否則不予核銷。

請依規定優先採購綠色環保標章或節能標章產品，並提供產品之環保或節能證書字號。

格式二

台南市：區公所
分批（期）付款表
103年9月25日

單位：新臺幣元

所屬年度月份：103 年度 8 月份		備 註
應 付 總 額	851000 元整	一、訂有契約。 二、 <u>第二次付款</u> 。 三、契約副本或抄本黏附於 103 年 度 9 月份支出憑證簿第 冊第 號。
截至上次已付金額	146652 元整	
本 次 付 款 金 額	270077 元整	
已 付 金 額	416729 元整	
未 付 金 額	434271 元整	

承辦單
位人員

承辦單位
主管人員

會計單
位人員

主辦會計人員
或其授權代簽人

機關長官或
其授權代簽人

技士
103-9
附註：

經建課
課長

會計
主任

區

1. 本表由承辦單位人員依據實際付款情形填列，備註欄有關契約副本或抄本黏附之冊數及號數由會計單位人員填列。
2. 本表於採購案支付尾款時或分批（期）驗收後，應附驗收證明文件。
3. 機關在不抵觸本要點規定前提下，得依其業務特性及實際需要，酌予調整本表格式使用。

〈臺南市 區公所〉辦理 103 年度 區災害搶險搶修 支出明細表

項次	類別	里別	工程名稱	金額(元)	工程期限	座標		備註
						X	Y	
1		各里	002-1030721 麥德姆颱風(沙包整備工作)		103.7.22-103.7.22			
2		各里	003-1030721 麥德姆颱風(沙包整備工作)		103.7.22-103.7.22			
3		各里	004-1030722 麥德姆颱風(沙包整備工作)	270,077	103.7.22-103.7.22			
4		各里	005-1030722 麥德姆颱風(沙包整備工作)		103.7.23-103.7.23			
5		淵中里	006-1030812 0809 豪大雨(積水抽除)		103.8.12-103.8.14			

製表人：

技士

單位主管：

經建課長

主辦會計人員：

會計室主任

秘書：

主任秘書

區(局)長：

區長

臺南市政府 區公所

103 年度 區災害搶險搶修工程(開口契約)

分段竣工結算書

編號：2

工程名稱：麥德姆颱風(沙包整備工作)
0809 豪大雨(積水抽除)

工程地點：區各里

工程金額：270,077 元

施工期限：103. 7. 22~103. 7. 23
103. 8. 12~103. 8. 14

施工廠商：晉祿營造有限公司

臺南市 區公所 分段工程結算驗收證明書

填發日期：103 年 9 月 18 日

案號及契約號	11030225-A		廠商名稱	營造有限公司		
標的名稱及數量摘要	103 年度 區災害搶險搶修工程(開口契約)					
採購金額	新台幣玖拾萬零貳仟元整					
搶修地點	區各里					
完成搶修日期	103 年 8 月 14 日	開始驗收日期	103 年 9 月 17 日	驗收完畢/驗收合格日期	103 年 9 月 17 日	
逾期違約金	0		其他違約金	0		
契約金額	新台幣壹拾陸萬柒仟零捌拾元整 (擴充後新台幣捌拾伍萬壹仟元整)					
增減價款	次別	第 1 次		第 2 次		合 計
	類別	金 額	簽准日期或核准文號	金 額	簽准日期或核准文號	
	增加金額					
減少金額					0	
驗收扣款	(不包括逾期違約金及其他違約金)					
結算總價 (金額中文大寫)	新台幣貳拾柒萬零柒拾柒元整					
驗收意見	經書面審核，同意驗收。					
承辦單位主管及人員簽章	本機關監驗人員簽章	上級機關監驗人員簽章或授權自辦文號	主 驗 人 員 簽 章	(機關印信)		
技士	會計室主任		技士			
經建課課長	政風室主任/0310					

說明：

- 1、本證明書已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。
- 2、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
- 3、「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第 73 條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約、圖說、貨樣規定相符時之日期。惟其屬減價收受者，指依政府採購法第 72 條第 2 項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。
- 4、「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第 98 條第 2 項所定之減價收受懲罰性違約金。
- 5、「結算總價」之計算方式為「契約金額」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。
- 6、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
- 7、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。

工程名稱	103年度 災害搶險搶修工程(開口契約)		攬約編號								
	施工地點	安南區	廠商名稱	晉祿營造有限公司							
工程編號	11030225-A		結算期數	第2期							
項次	項目	單位	單價	合約計數(合約擴充)		以前完成		本期完成		合計完成	
				數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
1	3"(2HP)抽水機租金(含發電機)	日	3,705	5	18,525	0	0	2	7,410	2	7,410
2	120型挖土機	日	8,891	5	44,455	0	0	0	0	0	0
3	鏟土機租金(山貓)	日	5,187	20	103,740	3	15,561	3	15,561	6	31,122
4	8.8T卡(貨)車租金	日	5,927	20	118,540	0	0	7	41,489	7	41,489
5	7T全吊式卡車	日	5,927	10	59,270	0	0	0	0	0	0
6	25T全吊式卡車	日	7,409	10	74,090	0	0	0	0	0	0
7	防汛沙包用砂	M3	593	250	148,250	45	26,685	50	29,650	95	56,335
8	防汛沙包袋(含束口帶)	袋	7	15,000	105,000	5,000	35,000	16,000	112,000	21,000	147,000
9	大工	工	1,185	63	74,655	44	52,140	26	30,810	70	82,950
11	勞安及交維等費用	式	4,645	1	4,645	1	815	1	1,474	1	2,289
12	廠商利潤、管理費及保險費(約小計8%)	式	59,306	1	59,306	1	9,468	1	18,822	1	28,290
	合計(1~12)				810,476	0	139,669		257,216		396,885
	營業稅5%				40,524		6,983		12,861		19,844
	總計	金額			851,000		146,652		270,077		416,729
本期結算數			270,077	連前期實付累計數	416,729		剩餘合約數				434,271

承辦採購單位主管及人員

承辦監工(造)單位主管及人員

機關首長或其授權人員

技士

經建課 課長

技士

經建課 課長

經建課 課長

臺南市區公所工程驗收紀錄

全部 / 部分

日期：103年9月17日

地點：區

案號及契約號	11030225-A	廠商名稱	晉祿營造有限公司
標的名稱及數量摘要	103年度區災害搶險搶修工程(開口契約)	驗收批次	2
採購金額	<input checked="" type="checkbox"/> 未達公告金額 <input type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額		
履約期限	依搶險搶修通知單		
完成搶修日期	002-1030721：103年7月22日 003-1030721：103年7月22日 004-1030722：103年7月22日 005-1030722：103年7月23日 006-1030812：103年8月14日	履約有無逾期	<input type="checkbox"/> 逾期 <input checked="" type="checkbox"/> 未逾期
契約金額	新台幣167,080元(擴充後新台幣851,000元)	契約變更或加減價次數	1

[驗收經過]：

依書面審核：

1. 3"(2HP)抽水機租金(含發電機)：2日 ✓
2. 鏟土機(山貓)出勤：3日 ✓
3. 8.8T卡(貨)車租金：7日 ✓
4. 防汛沙包用砂：50m³ ✓
5. 防汛沙包袋(含束口帶)：16,000袋 ✓
6. 大工出勤(含加班)：26工 ✓

[驗收結果]：

- 與契約、圖說、貨樣規定相符。
與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：

- [備註]：**1. 本工程分批估驗，編號2估驗總價計新台幣270,077元整。
 2. 搶險搶修通知單：案件編號002-1030721、003-1030721、004-1030722、005-1030722、006-1030812

紀 錄	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">技 士</div> <p style="text-align: center;">(簽章)</p>	會 驗 人 員 (無者免)	(簽章)	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)	
廠 商 代 表	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> <p style="text-align: center;">(簽章)</p>	協 驗 人 員 (無者免)	(簽章)		
廠 商 (專任工程人員)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> <p style="text-align: center;">(非屬營造業者免)</p>	本機關監驗人員(未達公告金額者免)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> <p style="text-align: center;">(簽章)</p>	主 驗 人 員	1


技士許德安

施工日誌表

工程名稱：103 年度 災害搶險搶修工程(開口契約)
 002-1030721、003-1030721、004-1030722、005-1030722 麥德姆颱風(沙包整備工作)
 施工廠商：營造有限公司 7 月份

日期	出勤時間		災情概述	地點	機具、人力出勤情形	廠商簽名
	起算	終止				
1	:	:				
2	:	:				
3	:	:				
4	:	:				
5	:	:				
6	:	:				
7	:	:				
8	:	:				
9	:	:				
10	:	:				
11	:	:				
12	:	:				
13	:	:				
14	:	:				
15	:	:				
16	:	:				
17	:	:				
18	:	:				
19	:	:				
20	:	:				
21	:	:				
22	08:00	18:00	沙包載運	各里	鏟土機 2 台、8.8T 卡車 4 台、大工 20 工	
23	08:00	18:00	沙包整備	消防隊	鏟土機 1 台、8.8T 卡車 1 台、大工 2 工	
24	:	:				
25	:	:				
26	:	:				
27	:	:				
28	:	:				
29	:	:				
30	:	:				
31	:	:				

廠商



機關人員

技士

工程名稱	103年度 區災害搶險搶修工程(開口契約)		攬約編號								
	施工地點	區	廠商名稱	晉祿營造有限公司							
工程編號	11030225-A		結算期數								
項次	項目	單位	單價	合約計數		以前完成		本期完成		合計完成	
				數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
1	3"(2HP)抽水機租金(含發電機)	日	3,705	1	3,705	0	0	0	0	0	0
2	120型挖土機	日	8,891	1	8,891	0	0	0	0	0	0
3	鏟土機租金(山貓)	日	5,187	4	20,748	0	0	3	15,561	3	15,561
4	8.8T卡(貨)車租金	日	5,927	4	23,708	0	0	0	0	0	0
5	7T全吊式卡車	日	5,927	2	11,854	0	0	0	0	0	0
6	25T全吊式卡車	日	7,409	2	14,818	0	0	0	0	0	0
7	防汛沙包用砂	M3	593	50	29,650	0	0	45	26,685	45	26,685
8	防汛沙包袋(含束口帶)	袋	7	3,000	21,000	0	0	5,000	35,000	5,000	35,000
9	大工	工	1,185	11	13,035	0	0	44	52,140	44	52,140
11	勞安及交維等費用	式	929	1	929	0	0	1	815	1	815
12	廠商利潤、管理費及保費(新小計8%)	式	10,786	1	10,786	0	0	1	9,468	1	9,468
	合計(1~12)			1	159,124	0	0		139,669		139,669
	營業稅5%			1	7,956				6,983		6,983
	總計	金額			167,080				146,652		146,652
本期結算數			146,652	連前期實付累計數		146,652		剩餘合約數		20,428	

承辦採購單位主管及人員

承辦監工(造)單位主管及人員

機關首長或其授權人員

技 術 師

技 術 師

技 術 師

技 術 師

中華民國 103年7月31日



搶險搶修派工單

案件編號	002-1030721	限定開工時間	103.7.22
通知時間	103.7.21	限定竣工時間	103.7.22
工程位置或GPS座標	消防分隊		
損壞情形、現況概述 (得附照片)	1. 因應「麥德姆」颱風來襲，預計載運 9250 包沙包預置於易淹水潛勢區 36 里及和順工業區。 2. 本次啟動請承商於 103.7.22 開始進行沙包運載，預計於 103.7.22 前完成。		



工作項目及範圍 (以可依契約計價之項目為限)

項次	項目說明及範圍	計價單位	數量	備註
1	鏟土機租金(山貓)	日	2	
2	8.8T 卡(貨)車租金	日	4	
3	大工	工	20	

機關簽章

承辦單位	機關首長或其授權人員
 103	 103.7.22

廠商簽章

施工廠商	監造廠商 (無者免填)
 	

註：1. 機關於本單核准後立即傳真通知廠商，由廠商於本單簽章確認，傳真回復機關。
 2. 本表單格式如不敷使用，可自行調整。

影本與正本相符

技士許德安



搶險搶修派工單

案件編號	003-1030721	限定開工時間	103.7.22
通知時間	103.7.21	限定竣工時間	103.7.22
工程位置或GPS座標	區公所		
損壞情形、現況概述 (得附照片)	1. 因應「麥德姆」颱風來襲，預計備置 6000 包沙包袋及束帶材料。 2. 本次啟動請承商於 103.7.22 開始進行準備，預計於 103.7.22 前完成。		



工作項目及範圍 (以可依契約計價之項目為限)

項次	項目說明及範圍	計價單位	數量	備註
1	防汛沙包袋(含束口帶)	袋	6000	
2				
3				

機關簽章

承辦單位	機關首長或其授權人員
 103.7.22	 103.7.22

廠商簽章

施工廠商 	監造廠商 (無者免填) 
---	--

註：1. 機關於本單核准後立即傳真通知廠商，由廠商於本單簽章確認，傳真回復機關。
 2. 本表單格式如不敷使用，可自行調整。

影本與正本相符

技士許德安

創

檔 號：103/2201

保存年限：10年

簽 於 經建課


日期：103年9月22日

主旨：為辦理「103年度 區災害搶險搶修工程(開口契約)」第二批分段竣工驗收結算事宜，詳如說明，陳請 核示。

說明：

- 一、依據晉祿營造有限公司103年7月31日晉經字第10307031001號函及103年8月15日晉經字第10308012001號函辦理。
- 二、本案係為103年7月21日麥德姆颱風及103年8月9日豪大雨期間進行沙包整備載運及抽水等搶修工作，依契約項目單價計算所需支付經費共計新台幣270,077元(本案契約金額含擴充為新台幣851,000元，前期請款金額為新台幣146,652元)，本批相關施作項目及數量如分段竣工結算書(詳附件)。
- 三、經承商依前函分別於103年7月31日及103年8月15日提送工程結算明細表、搶險搶修派工單及施工照片等相關驗收結算資料，本案於103年9月15日簽報驗收並於103年9月17日完成驗收，經審查尚符規定，檢陳本案驗收紀錄、分段竣工結算書及分段工程結算驗收證明書等資料，擬准予辦理。

擬辦：奉核後，辦理後續分段驗收及結算事宜。

撥款 

敬陳

鈞長

會辦單位：會計室、政風室



* 1 0 3 0 6 2 3 4 6 3 *

103. 8. 18

晉祿營造有限公司 函

臺南市 公所



1030521736

受文者：台南市 區公所
發文字號：晉經字第 10308012001 號
發文日期：中華民國 103 年 08 月 15 日

主旨：檢送本公司承攬台南市 區公所工程名稱「103 年 區災害搶險搶修工程（開口合約）」強險搶修通知單案件編號 006-1030812 施工照片，報請核備及驗收，請查照。

單位：晉祿營造有限公司
負責人：
地址：台南市 城西街三段 467 號 1 樓
電話：(06) 2570913



接：1. 所提送資料 擬審核
完竣後，請理台批 驗收
事宜。
2. 印單後，免存

影本與正本相符

目 錄

搶險搶修派工單(002-1030721;003-1030721;004-1030722;005-1030722)

砂收據

防汛袋;束帶發票影本

7/22 人員簽到表共 20 員

7/23 人員簽到表共 2 員

各里長簽名收據

7/22	山貓 2 台;8.8T 卡車 2 台1
7/22	8.8T 卡車 2 台; 大工 8 人2
7/22	大工 8 人3
7/22	大工 4 人 送砂包前;4
7/22	防汛袋 6000 個;束帶 6000 條;沙 50m ³5
7/22	安慶里6
7/22	海西里7
7/22	溪心里8
7/22	淵西里9
7/22	鳳凰里10
7/22	梅花里11
7/22	淵東里12
7/22	布袋里13

簽到表

工程名稱：103年度 區災害搶險搶修險(開口契約)

承包商：晉祿營造有限公司

日期：103年7月27日 08時~18時(中午12時~14時休息) 本日砂包製作數量：^送 9250包

編號	簽到	簽退	備註
1	江金水	江金水	
2	黃德清	黃德清	
3	朱福春	朱福春	
4	魏榮明	魏榮明	
5	顏坤記	顏坤記	
6	王裕銘	王裕銘	
7	李俊昇	李俊昇	
8	周建忠	周建忠	
9	曾亞富	曾亞富	
10	蔡清文	蔡清文	
11	鄭輝川	鄭輝川	
12	洪嘉佳	洪嘉佳	
13	許允傑	許允傑	
14	黃信廷	黃信廷	
15	李進興	李進興	
16	楊煒	楊煒	
17	陳冠均	陳冠均	
18	杜博精	杜博精	
19	歐祐安	歐祐安	
20			
21			
22			

臺南市二南區公所

搶險搶修砂包領據

注意事項：

李順里

李順長

0932702651

搶險搶修砂包為有價物資

請領用人務必妥善保管及配合回收

因應災害搶修搶險所需，

茲領用二南區公所發放之砂包 250 包

領用人(簽章) 黃瓊祥代里長

中華民國 103 年 7 月 22 日

臺南市二區公所

搶險搶修砂包領據

注意事項：

公堤里

0928394255

搶險搶修砂包為有價物資

請領用人務必妥善保管及配合回收

為因應災害搶修搶險所需，

茲領用二區公所發放之砂包 250 包

領用人(簽章)

中華民國 103 年 7 月 22 日

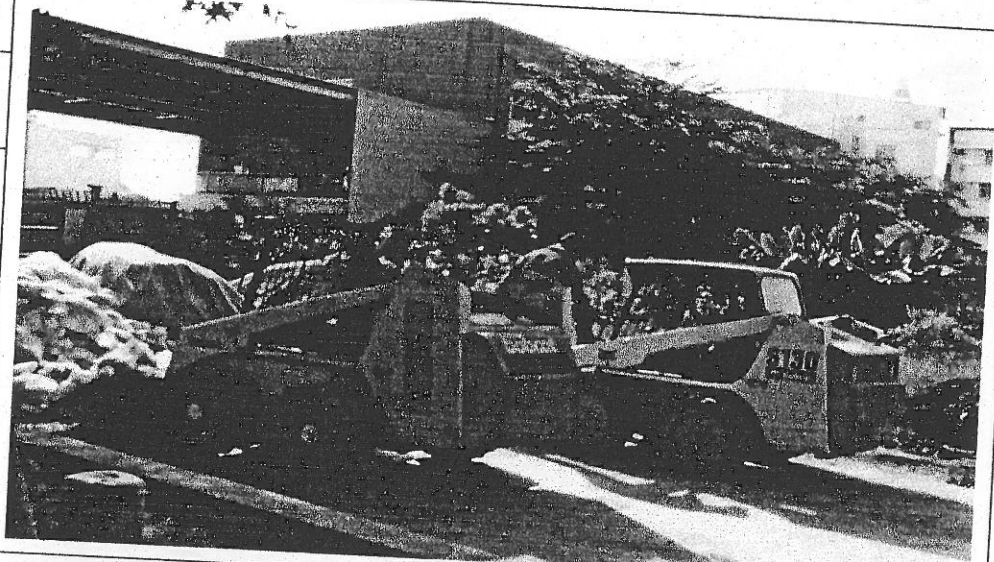

李順長


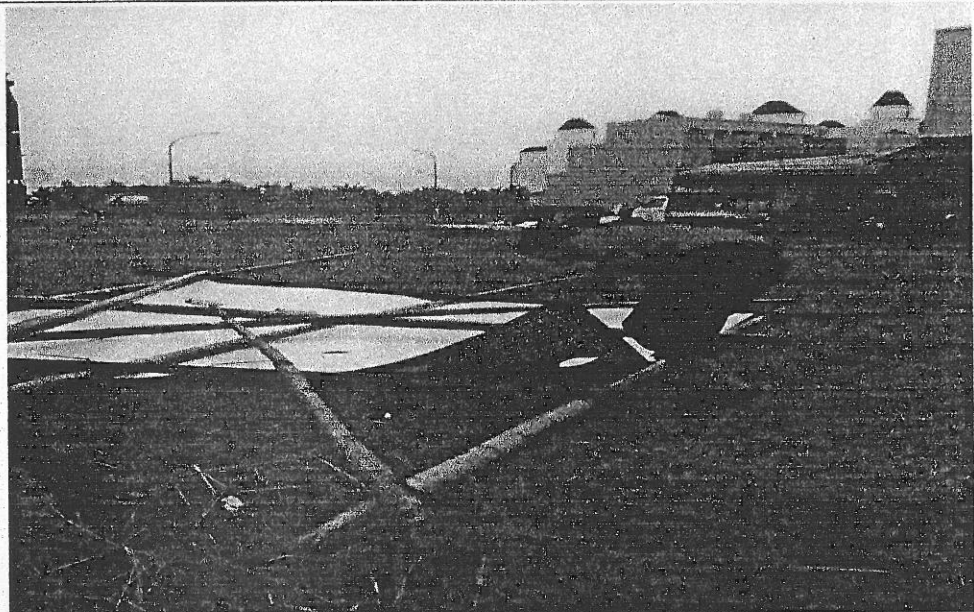

臺南市： 區易淹水地區砂包預置地點一覽表

調查日期：103.07.21

編號	里別	砂包數量(包)	砂包預置地點	備註
1	安慶里	250	長溪路一段168巷133號	
2	海西里	250	海環街334號	
3	溪心里	250	海佃路2段653巷口	
4	洲西里	250	安中路4段313巷口對面	
5	鳳凰里	250	安中路一段516巷10號旁空地	
6	梅花里	250	安中路一段557巷右側梅花友愛公園旁空地	
7	洲東里	250	智安二街70號洲東活動中心籃球場邊	
8	布袋里	250	長和路四段68號旁空地	
9	海東里	250	同安路145巷尾	
10	公塭里	250	安興街181巷78弄50號旁空地	
11	南興里	250	公學路5段897巷100號空地	
12	顯宮里	250	顯宮國小前空地	
13	城南里	250	城南里活動中心旁空地	
14	學東里	250	公學路6段469巷31弄6之1號	
15	城東里	250	城北路98巷87號邊第一波優先	

施工照片

編號	002-1030721	
拍照日期	103.07.22	
施工位置	消防隊後面	
工程項目	送砂包至里長處	
照片說明	施工前	
備註	山貓 2 部	
編號	002-1030721	
拍照日期	103.07.22	
施工位置	消防隊後面	
工程項目	送砂包至里長處	
照片說明	施工前	
備註	8.8T 卡(貨)車第一部	
編號	002-1030721	
拍照日期	103.07.22	
施工位置	消防隊後面	
工程項目	送砂包至里長處	
照片說明	施工前	
備註	8.8T 卡(貨)車第二部	

編號	005-1030722	
拍照日期	103.07.23	
施工位置	區公所	
工程項目	安中路三段 廣告鷹架倒	
照片說明	把鷹架移往 旁邊空地	
備註	施工前 (颱風出勤)2	
編號	005-1030722	
拍照日期	103.07.23	
施工位置	區公所	
工程項目	安中路三段 廣告鷹架倒	
照片說明	拆除帆布	
備註	施工中	
編號	005-1030722	
拍照日期	103.07.23	
施工位置	區公所	
工程項目	安中路三段 廣告鷹架倒	
照片說明	拆除帆布完	
備註	施工後	
