

111年 

110年搶險搶修送審檢討會議

111年3月21日 災害防救辦公室

議程

- 一、主席致詞
- 二、110年搶險搶修結算核銷送審結果說明
- 三、中央送審意見及新版表格解說
- 四、送審優缺說明參考
- 五、核銷資料觀摩
- 六、提案討論
- 七、臨時動議


一、主席致詞



二、110年搶險搶修結 算核銷送審結果說明



二、110年搶險搶修結算核銷送審結果說明



經行政院主計總處審查結果，110年中央可撥補1億5,100萬8,000元：

- 一、110年期間發生7月及8月豪雨、璨樹颱風等災害，導致本府編列之災害準備金10億6,229萬3,000元不敷支用，須向中央申請經費撥補，本府於110年12月25日函，送搶修險結算憑證資料，金額為5億4,033萬9,657元(不包含未符規定之衛生局新冠快篩試劑357萬2000元、消防局防疫出勤金121萬7,200元、市場處公有市場與困補貼718萬1,440元)，供主計總處審查
- 二、已於111年2月11日確認審認結果，認列5億4,030萬5,000元，認列比率達99.99%，並於2月18日函覆確認
- 三、110年災後復建工程（7月及8月豪雨、璨樹颱風）總核定經費6億1,698萬8000元，扣除災準金尚可支用數4億6,598萬元（本府災害準備金應編數（原編預算1%）10億628萬5000元，扣除認列數5億4,030萬5000元），中央可撥補1億5,100萬8,000元，

審認結果說明如下：

本次抽查水利局、交通局、西港區、龍崎區、玉井區及新化公所，抽查金額為89,737,856元（抽查金額比例為**16.61%**），認列金額為89,702,226元，為水利局曾文溪北至將軍溪水利設施搶修搶險工程開口契約空汙費，佐證資料為40,747元，填報數與佐證資料差異35,630元不予認列，支出明細表抽查案件核列比率為**99.96%**，抽查認列比例高，是以餘未抽查案件則依規定全數核列。

送審核銷金額總計為540,339,657元，經審查不認列35,630千元，認列540,304,027千元，認列比率99.99%



行政院撥補1億5,100萬8千元，然須辦理墊付款轉正為2億137萬8千元，尚有5,037萬元差額由市款編列，差額原因說明如下：

一、未符行政院主計總處災害準備金支用原則1,197萬640元予以刪除：衛生局新冠快篩試劑357萬2千元、消防局1,217萬2千元防疫出勤獎勵金，市場處防疫補貼市場使用費及清潔費718萬1千400元。

二、0605災後復建工程未落實註銷決標剩餘款：0605災後復建工程本府核定3億303萬9千元，送審核定經費2億8049萬4875元，差額2,254萬4125元。

三、業務機關及區公所後續擴充核定過多：110年災準金辦理7、8月、燦樹颱風災後復建工程分配已分別辦理3次註銷，總計金額為1億4832萬8千元，並均再分配於前述災後復間工程經費中，惟因年底機關決算資料仍在結算中，部分經費因業務機關及區公所未及於11月前辦理決算故未繳回註銷，經統計剩餘經費為19,864,578元。

三、中央送審意見及 新版表格解說



三-1 行政院主計總處意見



一、請依規定書表格式，將開口契約之動支項目請逐筆列示，且請詳述動支項目，包含哪一次天然災害、災害地點、災害情形及搶險修作為。

二、今年係以開口契約或區公所為準抽查，以後年度抽查方式與今年度不一定相同，將以逐筆列示動支項目之各明細抽查，倘有多個派工單一併辦理結算亦可，仍請按每個派工單列示明細，金額填表時則以合併儲存格方式一筆表達，抽查時再請提供該派工單核算明細及金額。

三、動支日期，是災害發生時，管控開口契約額度之日期，非決算請款日，請同仁填表時不要弄錯了。

三-2.支出明細表新舊交替

〈機關全銜〉辦理 000 年度 ○○ 颱風豪雨搶險搶修或緊急搶救支出明細表

項次	類別	里別	工程名稱	金額(元)	工程期限	地點	備註
1.			空汙費(開口契約)				
2.			工程管理費(開口契約)等				
3.	C2	○○里	南179線0k-120K 搶險工程	52000	6.10-6.12		
4.	C2	○○里	玉山區道125K-200K 搶修工程	78000	6.11-6.12		

(舊) 支出明細表

111年度開始，原支出明細表已不再使用，若要申請後續擴充、申報中央，使用新式「00年度災害準備金書審支用明細表」



○○年度災害準備金書審支用明細表

○○年度災害準備金書審支用明細表																				
地方政府別：○○直轄市、○○縣(市)政府或○○直轄市山地原住民區、○○鄉(鎮、市)公所																	單位：元			
序號	動支日期	動支項目 (請詳述)	辦理進度 (未發包、已發包、已完工)	執行數		檢核項目 (如有一項條件為否，即非屬災害準備金認列範圍，請自行刪除)													備註	
				金額	類型 (動支數、發包數或決算數)	是否為本年度天然災害所致	是否符合中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則第3點各款規定								是否非屬行政院核定復建經費	是否非屬中央核定撥補後自行增列未經中央審議通過之復建經費	是否非屬預防性或例行性之維護、清理、疏通等費用	是否已扣除附帶相關收入(如逾期違約金、道路剝除殘料收入等)		是否非屬原有功能擴充及改善或僅具景觀功能項目之工程項目
							災害防救法所定第48條所定之救助金	災區緊急搶救所需費用	搭建災民臨時收容所或其他安置場所費用	購置災民緊急救濟必需物資等費用	購置或租賃緊急救災必需物品、器材或設備等費用	災區環境清理或消毒等費用	災區復建經費							
		合計		-																
1	X年X月X日	範例	已完工	XXX	決算數	是	是		V						是	是	是	是		

(新) 支出明細表



三-3.新版支出明細表格式解說

○○年度災害準備金書審支用明細表

地方政府別：○○直轄市、○○縣（市）政府或○○直轄市山地原住民區、○○鄉（鎮、市）公所

單位：元

序號	動支日期 1	動支項目 (請詳述) 2	辦理進度 (未發包、已發包、已完工) 3	執行數		檢核項目 (如有一項條件為否，即非屬災害準備金認列範圍，請自行刪除)										備註			
				金額(元) 4	類型 (動支數、發包數或決算數) 4	是否為本年度天然災害所致	是否符合中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則第3點各款規定							是否非屬行政院核定復建經費	是否非屬中央核定撥補後自行增列未經中央審議通過之復建經費		是否非屬預防性或例行性之維護、清理	是否已扣除附帶相關收入(如逾期違約金、道路剷除殘料收入等)	是否非屬原有功能擴充及改善或僅具景觀項目之工程項目
							災害防救法所定第48條所定之救助金	災區緊急搶救所需費用 5	搭建災民臨時收容所或其他場所用	購置災民緊急救濟必需物資等費用	購置或租賃緊急救濟必需物品、器材或設備等費用	災區環境清理或消毒等費用	災區復建經費						
		合計		10,934															
2	例：110年6月1日-110年7月9日	例：6月豪雨尖山埤產業道路、尖山產業道路、尖山大峽谷樹木及土石崩落清除	已完工	4,562	決算數	是	是		V					是	是	是	是	是	
4	例：110年8月9日	例：8月豪雨公所旁及新吉里沙包巡視及補給	已完工	2,369	決算數	是	是		V					是	是	是	是	是	
6	例：110年6月10日	例：6月豪雨牛稠埔路口水溝阻塞清淤搶通	已完工	1,355	決算數	是	是		V					是	是	是	是	是	
7		例：施工安全衛生費	已完工	456	決算數	是	是		V					是	是	是	是	是	
8		例：工程品管費	已完工	1,265	決算數	是	是		V					是	是	是	是	是	
9		例：包商利潤及管理費	已完工	236	決算數	是	是		V					是	是	是	是	是	
10		例：保險費	已完工	456	決算數	是	是		V					是	是	是	是	是	
11		例：營業稅	已完工	235	決算數	是	是		V					是	是	是	是	是	

備註：動支項目請按事由明細逐項填列，以開口契約辦理者，亦請逐項列示契約內各案件資料。

三-3新版支出明細表格式解說-(1)動支日期

- 1.動支日期請寫 **災害發生的日期** (也就是災害發生當下要去搶修的當天日期)，並清楚標示年、月、日。
- 2.請不要寫工程結算日期或給付金額的日期。

動支日期

1


X年X月X日




三-3新版支出明細表格式解說-(2)動支項目

地方政府別：○○		或○○直轄市山地原住民區、○		單位：元	
序號	動支日期	執行數	類型 (動支數 包數或決 算數)	是否為 本年度 天然災 害所致	備註
1	X年X月X	XXX	決算數	是	

**動支項目
(請詳述)**





1. 填入動支項目 (包含哪一次天然災害、災害地點、災害情形及搶險修作為，例如「搶險」、「搶修」、「清理」、「清除」、「搶通」、「修復」、「扶正」、「待命」、「封橋」、「封橋防水檔板及沙包運送」字樣等等..)

e.g. 6月豪雨(哪一次天然災害) 尖山埤產業道路、尖山產業道路、尖山大峽谷(災害地點) 樹木及土石崩落(災害情形) 清除(搶險修作為)



三-3新版支出明細表格式解說-(2)動支項目-工程管理費等各項費用

地方政府別：		或○○直轄市山地原住民區、○○										單位：元				
序號	動支	動支項目 (請詳述)	執行數		是否為 本年度 天然災 害所致						是否非 原有 功能擴 充及改 善或僅 具景觀 功能項 目之工 程項目				備註	
		合計	類型 (動支數 包數或決 算數)	是否為 本年度 天然災 害所致												
		例:6月豪雨牛稠埔路 口水溝阻塞清淤搶 通														
		例:施工安全衛生費														
		例:工程品管費														
1	X年X	例:包商利潤及管理費	XXX	決算數	是	是		V					是	是	是	是
		例:保險費														
		例:營業稅														


1.開口契約辦理結算作業時，會出現工程管理費、保險費等費用，請統一填在工程案之後(即最後面)，例如左圖



三-3新版支出明細表格式解說-(3)辦理進度

○○年度災害準備金書審支用明細表															
地方政府別：○○直轄		轄市山地原住民區、○○鄉（鎮、市）公所										單位：元			
序號	動支日期	執行數	類型 (會計科目 及預算數)	是否為 本年度 天然災害所致	是否符 合	是否符 合	是否符 合	是否符 合	是否符 合	是否符 合	是否符 合	是否符 合	是否符 合	備註	
															是否符 合
1	X年X月X日	X	決算數	是	是		V					是	是	是	是

辦理進度
(未發包、
已發包、已
完工)



對應動支項目的狀態填寫辦理進度(未發包、已發包、已完工)



三-3新版支出明細表格式解說-(4)執行數

執行數

〇〇年度災害準備金書審支用明細表

市山地原住民區、〇〇鄉（鎮、市）公所

單位：元

檢核項目

(如有「項條件為否」即非屬災害準備金認列範圍，請自行刪除)

是否

是否為
天然災
害所致

類型
(動支數、
發包數、
決算數)

非有擴收僅觀項目

備註

對應動支項目填寫執行金額及類型(動支數、發包數、決算數)

金額(元)

類型
(動支數、
發包數或決
算數)

4

決算數

是

是

v

是

是

是

是

地方

序號

1



三-3新版支出明細表格式解說-(5)是否為本年度天然災害所致和是否符合支用災準金審查原則第3點各款規定

○○年度災情				是否符合中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則第3點各款規定									
地方政府別：○○直轄市、○○縣（市）政府或○○直轄市山地原住民區、○○鄉（鎮、市）				執行數	是否為本年度天然災害所致	災害防救法所定第48條所定之救助金	災區緊急搶救所需費用	搭建災民臨時收容所或其他安置場所費用	購置災民緊急救濟必需物資等費用	購置或租賃緊急救災必需物品、器材或設備等費用	災區環境清理或消毒等費用	災區復建經費	元

對應“**動支項目**”來填寫
 是否為本年度天然災害所致及是否符合中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則第3點各款規定



三-3新版支出明細表格式解說-(6)是否為災後復建工程經費..等

○○年度災害津貼

地方政府別：○○直轄市、○○縣（市）政府或○○直轄市山地原住民區、○○鄉（鎮、市）公所

序號	動支日期	動支項目	辦理進度 (未發包、)	執行數		是否為	災害防
1							

對應動支項目填寫是否非屬行政院核定復建經費等.....共五項

是否非屬行政院核定復建經費	是否非屬中央核定撥補後自行增列未經中央審議通過之復建經費	是否非屬預防性或例行性之維護、清理、疏通等費用	是否已扣除附帶相關收入（如逾期違約金、道路刨除殘料收入等）	是否非屬原有功能擴充及改善或僅具景觀項目之工程項目
是	是	是	是	是



三-3新版支用明細表格式解說-(7)範本1

序號	動支日期	動支項目 (請詳述)	辦理進度 (未發包、已發包、已完工)	執行數		檢核項目	
				金額(元)	類型 (動支數、發包數或決算數)	是否為 本年度 天然災 害所致	是否符
		合計		587,344			
4		臺南市新營區110年災害搶險搶修工程					
1	110年6月4日	『0604豪雨』轄內急水溪水溪便橋預警性封橋及災後橋面垃圾清除並清洗橋面淤泥後解除封閉管制。	已完工	42,049	決算數	是	
2	110年6月4日	『0604豪雨』轄內急水溪水位暴漲，中營里水門無法開啟排水，啟動水利行政-06移動式抽水機排水作業。	已完工	1,851	決算數	是	
3	110年6月5日	0604豪雨本區轄內預佈移動式抽水機加滿柴油。	已完工	32,565	決算數	是	是
8		工程管理費	已完工	6,219	決算數	是	是
1		110年度新營區行道樹災害搶修開口契約					

若機關有2個以上開口契約，可用開口契約的方式區分契約項下做了多少搶修工作，如左圖



三-3新版支用明細表格式解說-(7)範本2

序號	動支日期	動支項目 (請詳述)	(未發包、已發包、已完工)	金額(元)	類型 (動支數、發包數或決算數)	是否為本年度天然災害	是否符合中央對各
合計				36,991,668			
110年度東山區轄內農路及野溪災害緊急應變搶險與搶修工程(開口契約)-第1次驗收							
1	110年5月27日	5月、6月豪雨中旬崙農路搶修	已完工	23,257	決算數		
2	110年6月15日	5月、6月豪雨山腳部落農路搶修	已完工	328,295	決算數		
		工管費34152、安全措施費63220、廠商利潤140835、營業稅182675、材料試驗費33075	已完工	453,957	決算數		
110年度東山區轄內農路及野溪災害緊急應變搶險與搶修工程(開口契約)-第2次驗收							
1	110年6月30日	7月豪雨墓仔埔農路搶修 黃李鶴	已完工	4,910	決算數	是	是

若機關有2次以上分段驗收，要將分段驗收內的細項寫出來



三-3新版支用明細表格式解說-(7)錯誤態樣1

序號	動支日期	動支項目 (請詳述)	序號	動支日期	動支項目 (請詳述)	辦理進度 (未發包、已發包、已完工)	金額(元)	類型 (動支數、發包數或決算數)	是否為本年度天然災害所致		備註
		合計			合計		411,220				
1	110年8月23日	8月豪雨萬松路及和平路水溝搶通、南6線積淹水側凝濘搶通、下林里過路雜草清除及泥沙清除、歡雅里南73-1道路側溝號水門水溝搶通、田寮段路面下陷搶修	1	110年8月23日	8月豪雨萬松路及和平路口兩側水溝搶通	已完工	1,235	決算數	是	是	中洋第一批
2	110年7月31日-110年8月13日	7/31~8/1豪雨進駐、8/1駐、8/12~8/13樹木倒下林過水橋橋面雜	2	110年8月23日	南6線積淹水道路兩側凝濘搶通	已完工	4,563	決算數	是	是	中洋第一批
			3	110年8月23日	下林里過路便橋上雜草清除及泥沙清除	已完工	78,963	決算數	是	是	中洋第一批
3	110年8月23日	8月豪雨南6線積淹水凝濘搶通、康樂路及口場陷開挖搶修、60搶修腳路整理	4	110年8月23日	歡雅里南73-1道路側溝搶通及42號水門水溝搶通	已完工	45,689	決算數	是	是	中洋第一批
			5	110年8月23日	田寮大排姑爺段路面下陷搶修	已完工	3,789	決算數	是	是	中洋第一批

若同一天有好幾個個災損位置，不能寫在同一欄位，要拆開來(左圖2)



三-3新版支用明細表格式解說-(7)錯誤態樣2

序號	動支日期	動支項目 (請詳述)	辦理進度 (未發包、 已發包、已 完工)	執行數		檢核項目	
				金額(元)	類型 (動支數、 發包數或決 算數)	是否為 本年度 天然災 害所致	是否符
		合計		339,738			
1	110年12月02日	10年度6-8月豪雨佳里區災害嘉興里南23泉等防汛及搶險搶修工程	已完工	338,000	決算數	是	是

不能將多數案件合併成一項表示，需一案一案拆開填寫



四、送審優缺說明參考



四、送審優缺說明參考

一. 業務機關或區公所如有2個以上的契約，合併一份書審支用明細表

優點：

- 資料依序排列整理，標籤製作用心清楚
- 配合度良好 準時繳交，資料修正速度快
- 事前主動溝通
- 落實分段驗收，部分機關資料災害說明清楚

待改進：

- 各案需有結算金額
- 所檢附照片部分為彩色，部分為黑白
- 未統一資料部分沒有依序整理，標籤沒貼資料凌亂
- 照片前中後標錯位置，部分照片顯示不出前中後，施工位置描述不夠詳細
- 資料甚至多次修正，繳交時間拖延太久，補件多次
- 搶修工程完工結算過慢，窗口未能掌握各契約結算進度，未能有效彙整

搶險(修)地點	本區轄內 5 座急水溪過水便橋
現場勘查時間	110 年 7 月 15 日 16 時 30 分
損害情形、現況概述	「0715 豪雨」轄內 5 座跨急水溪便橋為防範溪水淹沒橋面影響通行安全，需進行預警性封橋；豪雨災後，急水溪水位消退，轄內 5 座過水便橋應清除橋面垃圾並清洗橋面淤泥後解除封閉管制。
相關勘查資料	

搶險(修)工作分項報價清單

項次	項目說明	計價單位	數量	備註
1	60 型挖土機(含 60 以下)	日	0.5	$1 \times 0.5 = 0.5$
2	一般作業工	工	3.0	$2 \times 0.5 + 2 \times 0.25 + 3 \times 0.5 = 3.0$
3	小貨車 < 1.75 公噸以上 >	日	1.25	$0.5 + 0.25 + 0.5 = 1.25$

預計開工時間	110 年 7 月 15 日 18 時 00 分
預計完工時間	110 年 7 月 20 日 17 時 30 分
現場勘查廠商簽名欄	現場勘查機關人員簽名欄
實際完工時間	110 年 7 月 17 日 12 時
完工確認現場勘查廠商簽名欄	完工確認現場勘查機關人員簽名欄

優點：派工單註明災害事件

缺點：派工單補充災害事件

搶險搶修派工單

案件編號	C01	限定開工時間	110/7/25	
通知時間	110/7/23	限定竣工時間	110/7/26	
工程位置或GPS座標	(TWD-67) : X=188083 Y=2542866、X=188016 Y=2543162、X=186865 Y=2545073			
損壞情形、現況概述 (待復照片)	土崎里(土崎高分164、176、尖峰高幹286左5)等3處樹木倒塌搶修工程			
工作項目及範圍(以可依契約計價之項目為限)				
項次	項目說明及範圍	計價單位	數量	備註
15	挖土機【120MP(不含)以下】	半日	1	
17	挖土機【120MP以上】	半日	1	
29	電鋸工	半日	2	
機關簽章				
承辦單位		機關首長或其授權人員		
廠商簽章				
施工廠商		監造廠商(無者免填)		

註：1. 機關於本單核准後立即通知廠商，由廠商於本單簽章確認。
2. 本表單格式如不敷使用，可自行調整，工作項目及範圍乃概估數量仍以實做數量為準。

第一次後擴派工通知單

工程名稱： 110年臺南市新設、改善、搶修及維修交通設施工程(東南工區)(開口契約)(第一次後續擴充)

合約編號： 1100204-1

一、本施工通知單由甲方通知開工。(本次派工路口皆已於7月30日、7月31日、8月6日、8月7日及8月9日口頭搶修通知時修復完畢，本派工單為補正式派工程序)

施工通知單自 110 年 11 月 12 日。

二、施工期限：自開工之日起 11 日曆天內完成。

三、預算金額： 新台幣 901,134 元整。

四、本次通知施工金額： 新台幣 901,134 元整。

五、累計施工金額： 新台幣 901,134 元整。


六、剩餘預算金額： 新台幣 0 元整。

七、新設閃光 0 處，新設三色 0 處，閃光改三色 0 處，維修改善 10 處。

八、附派工數量總表 10 頁，工程計算表 1 頁，施工圖 10 頁。

九、本通知單一式 3 份。


優點：派工單註明實際施作日期
缺點：派工單需補充災害事件

拍照日期	110.08.01	
施工位置	172 線 32K+800	
工程項目	0801 豪雨轄管市道道路坑洞修補	
照片說明	施工前	
備註		

拍照日期	110.08.01	
施工位置	172 線 32K+800	
工程項目	0801 豪雨轄管市道道路坑洞修補	
照片說明	施工中	
備註		

拍照日期	110.08.01	
施工位置	172 線 32K+800	
工程項目	0801 豪雨轄管市道道路坑洞修補	
照片說明	施工中	
備註		

優點：照片註明災害事件及搶修作業

拍照日期	110/7/31	
施工位置	太南里急水溪越堤便道兩側	
工程項目	0730 豪雨預警性緊急封閉過水便橋	
照片說明	施工前	
備註	舊廟新營側	

拍照日期	110/7/31	
施工位置	太南里急水溪越堤便道	
工程項目	0730 豪雨預警性緊急封閉過水便橋	
照片說明	施工中	
備註	舊廟新營側	

拍照日期	110/7/31	
施工位置	太南里急水溪越堤便道	
工程項目	0730 豪雨預警性緊急封閉過水便橋	
照片說明	施工後	
備註	舊廟新營側	

拍照日期	110年08月06日	
施工位置	南區新樂路76號附近(新樂路與新和路)	
工程項目	更換燈面 綠燈*1	
照片說明	施工前	
備註	8月豪雨夾帶閃電造成綠燈遭雷擊損毀無法運作	
拍照日期	110年08月06日	
施工位置	南區新樂路76號附近(新樂路與新和路)	
工程項目	更換燈面 綠燈*1	
照片說明	施工中	
備註	8月豪雨夾帶閃電造成綠燈遭雷擊損毀無法運作	
拍照日期	110年08月06日	
施工位置	南區新樂路76號附近(新樂路與新和路)	
工程項目	更換燈面 綠燈*1	
照片說明	施工後	
備註	8月豪雨夾帶閃電造成綠燈遭雷擊損毀無法運作	

優點：照片註明災害事件

缺點：施工位置需有文字說明

南 106 線牛山高幹 158 左 8 搶險搶修工程施工照片

拍照日期	110.06.11	
施工位置	X:189458 Y2573316	
工程項目	掏空	
照片說明	施工前	
備註		
拍照日期	110.06.11	
施工位置	X:189458 Y2573316	
工程項目	掏空	
照片說明	施工中	
備註		
拍照日期	110.06.11	
施工位置	X:189458 Y2573316	
工程項目	掏空	
照片說明	施工後	
備註		

拍照日期	110年6月29日
施工位置	玉峰里 蘆芝坑農路
工程項目	施作矩型明溝 及部分路面改善
照片說明	施工前
備註	工區1



拍照日期	110年8月30日
施工位置	玉峰里 蘆芝坑農路
工程項目	構造物開挖
照片說明	施工中
備註	工區1



拍照日期	110年8月31日
施工位置	玉峰里 蘆芝坑農路
工程項目	鋼筋綁紮
照片說明	施工中
備註	工區1




缺點：照片補充災害事件

缺點：工程項目勿空白

拍照日期	2021.6.4
施工位置	(觀江溝排水) 護岸掏空補強
工程項目	
照片說明	施工前
備註	



拍照日期	2021.6.4
施工位置	(觀江溝排水) 護岸掏空補強
工程項目	施工前
照片說明	施工中
備註	

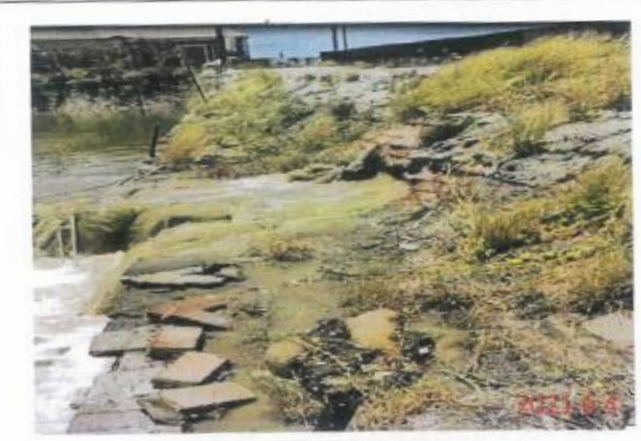

拍照日期	2021.6.4
施工位置	(觀江溝排水) 護岸掏空補強
工程項目	技術工
照片說明	施工中
備註	



拍照日期	110.8.10
施工位置	鹽水坑
工程項目	1 60型挖土機(含60型以下搬運費及作業人員)
	2 大工
照片說明	施工前
備註	道路土石崩落清除



拍照日期	110.8.10
施工位置	鹽水坑
工程項目	1 60型挖土機(含60型以下搬運費及作業人員)
	2 大工
照片說明	施工中
備註	道路土石崩落清除



拍照日期	110.8.10
施工位置	鹽水坑
工程項目	1 60型挖土機(含60型以下搬運費及作業人員)
	2 大工
照片說明	施工後
備註	道路土石崩落清除



優點：搶修作業說明清楚

缺點：照片補充災害事件

拍照日期	110年6月23日
施工位置	平陽里後山農路上邊坡
工程項目	施作重力式擋土牆
照片說明	施工前
備註	工區3



拍照日期	110年8月20日
施工位置	平陽里後山農路上邊坡
工程項目	構造物開挖
照片說明	施工中
備註	工區3



拍照日期	110年8月21日
施工位置	平陽里後山農路上邊坡
工程項目	基礎模板施工
照片說明	施工中
備註	工區3



五、核銷資料觀摩(20分鐘)



六、提案討論



六、提案討論

(一)自111年起各業務機關及區公所動支災害準備金辦理緊急搶救依前述調整辦理，相關表格放入防災資訊服務網，後續納入“臺南市政府辦理天然災害緊急搶救及復建工程作業要點”修訂

(二)當年度如提報中央申請經費撥補，府核定之災後復建工程標餘款須同步註銷(如需使用須註明)

(三)落實分段驗收，搶修險開口契約結算須儘速完成



七、臨時動議

