

九份子國中小、鹽行國中 及小新國小第二校區 設校進度簡報



CONTENT / 簡報大綱

- 一、設校緣起
- 二、學校規劃
- 三、結語



一、設校緣起


1. 九份子國中小：

問題

- A. 新興重劃區人口迅速移入
- B. 學區僅有海佃國小，**無法容納超額新生**
- C. 有半數學子跨區就讀北區之大港、文元國小，**有交通安全疑慮之問題**

解決

- A. 規劃「永續城市生態社區」的示範專區
- B. **建構臺南市第一所國民中小學校園**

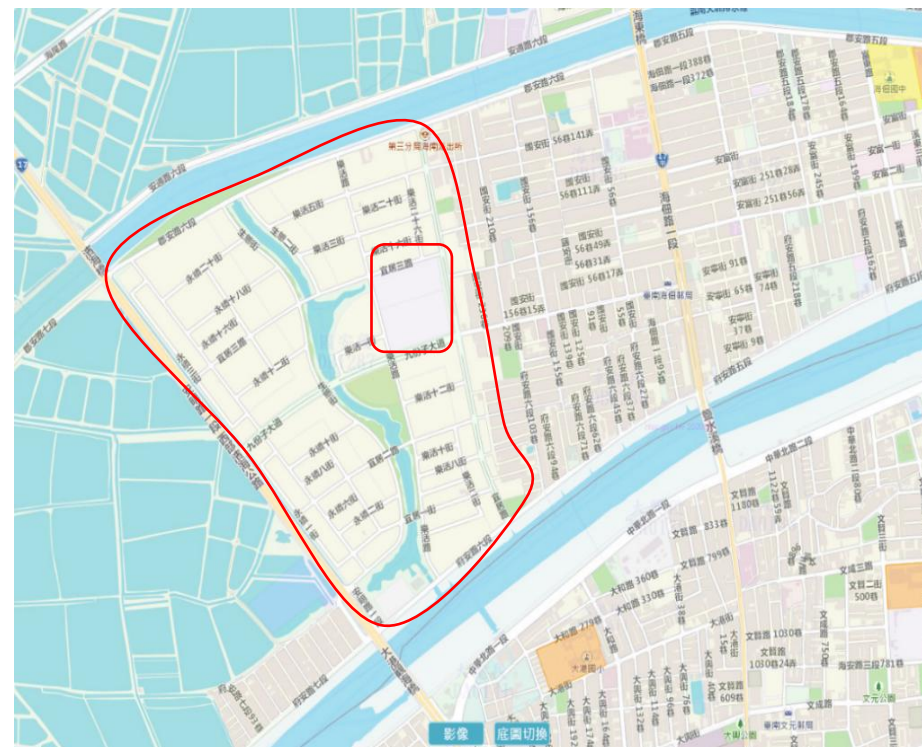

一、設校緣起


2. 鹽行國中：

問題

- A. 鹽行地區無劃設學校用地
- B. 學生就學須穿越台1省道、縱貫鐵路及工業區至永康國中，
有就學安全之虞

解決

設立新校，**以提升學童就學
便利性及安全性**

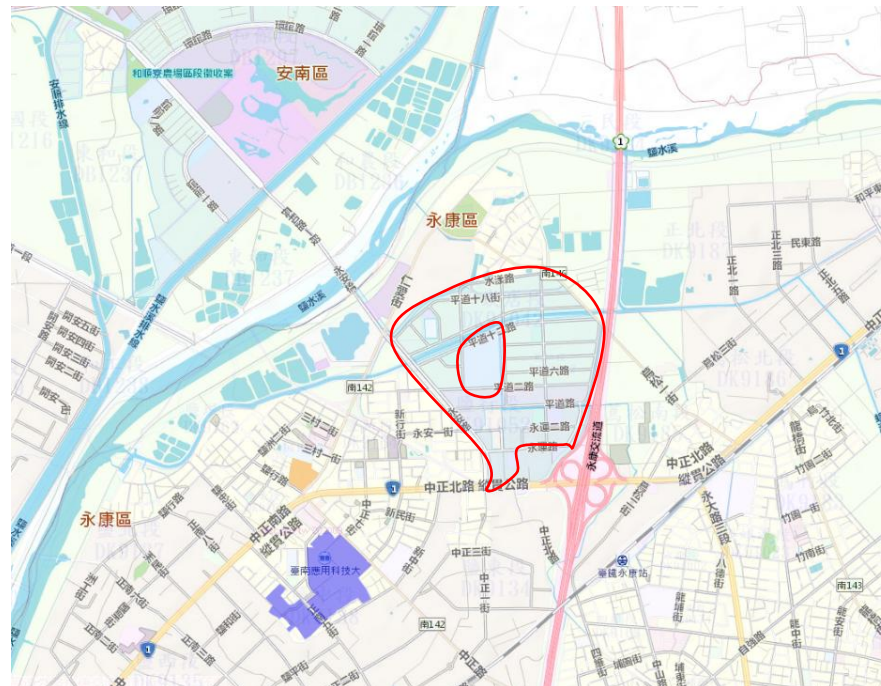

一、設校緣起

3. 小新國小第二校區：


問題

A. 南科LM區新住戶快速移入

B. 學齡兒童激增，促使小新國小量體將不足招收新生

解決

LM區擴充新校區方式，以滿足當地學童就學需求

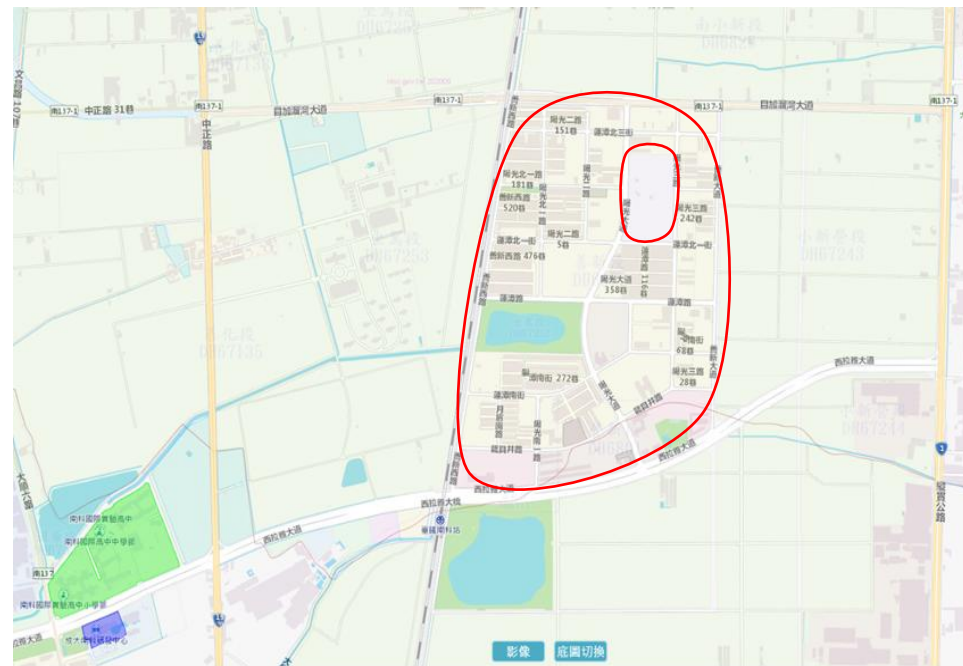

二、學校規劃

1. 九份子國中小新設校 A. 招生規劃

學校規模	幼兒園：2班 國小部：共24班、每年級4班 國中部：共18班、每年級6班
110學年度 預計招收班級數	初步調查 幼兒園：2班 國小部 1年級：4班 2-5年級：3班 國中部 7年級：3班
入學類型	總量管制
學區劃分	基本學區 ：國安里9鄰 共同學區 (國中-海佃、文賢；國小海佃、大港)：國安里1-8鄰、10-15鄰、幸福里、海南里、海佃里

學校願景



二、學校規劃

B. 工程進度：

- 截至109.9.30
預定進度**46.15%**
實際進度**50.01%**
超前**3.86%**。
- 預定完工日：**110.08.31**
- 預定啟用日：**110.09.01**



二、學校規劃

2. 鹽行國中新設校 A. 招生規劃

學校規模	共18班、每年級6班
110學年度 預計招收班級數	初步調查 7年級：4班 8年級：2班
入學類型	總量管制
學區劃分	基本學區 ：三民里1鄰
	共同學區 (永康國中)： 三民里2-11鄰、塩行里、塩洲里 塩興里、蔦松里

鹽讀在地·行向國際



二、學校規劃

B. 工程進度：

- 截至109.9.30
預定進度**69.96%**
實際進度**68.48%**
落後**1.48%**，持續趕工中。
- 預定完工日：**110.03.06**
- 預定啟用日：**110.09.01**



二、學校規劃

3. 小新國小新校區 A. 招生規劃

學校規模	共24班、每年級4班
110學年度 預計招收班級數	1年級：4班 2-6年級：由原校區搬遷至新校區
入學類型	總量管制
學區劃分	基本學區 ：小新里、蓮潭里
	共同學區 (新市、大社國小) 新市區大營里12鄰



二、學校規劃

B. 工程進度：

- 截至109.9.30
預定進度**83.33%**
實際進度**84.07%**
超前**0.74%**
- 預定完工日：**109.12.13**
- 預定啟用日：**110.02.18**



三、結語

如期如質完工；

打造具有特色的學校；

培養具國際競爭力的學生。



簡報結束・感謝聆聽

