

# 公園特色遊戲場

Chapter



1 1 2 年 1 1 月 0 7 日

TAINAN CITY GOVERNMENT 臺南市政府工務局

## 簡報大綱

一、特色遊戲場總表

二、近期完工將開放特色遊戲場

三、施工中特色遊戲場

四、結語

# 一、特色公園總表(1/3)-期程與經費

## 特色公園-共45座

## 完工19座

進度	特色公園名稱	期程	遊戲場經費(萬)
已完工 19座	大恩特色公園	已於 108 年 03 月 26 日啟用	480
	明和公園	已於 108 年 01 月 31 日完工	335
	水萍塢公園	已於 108 年 05 月 07 日完工	470
	永康區公 7 公園	已於 108 年 12 月 17 日完工	(永康公所) 80
	北區凱德公園	已於 108 年 12 月 13 日完工	(北區公所) 177
	北區公 66 公園(長興生態公園)	已於 109 年 11 月 24 日完工	304
	中西區頂美公園(公所)	已於 110 年 02 月 11 日完工	(中西區公所) 499.7
	永康總圖特色遊戲場(閱之森公園)	108 年 12 月底開工 110 年 04 月完工	(文化局) 1,400
	竹溪水岸園區特色遊戲場	109 年 04 月完工 10 月驗收	(水利局) 1,300
	新營區公 3 公園	110 年 07 月 09 日完工	(新營公所) 150
	歸仁區公兒 6	110 年 10 月 13 日完工	(歸仁公所) 202
	南區公 61(健康市場)	110 年 12 月完工	800
	安平區怡平公園特色	110 年 07 月 26 日完工	(安平區公所) 128
	南區灣裡人工溼地公園	111 年 06 月完工，111 年 7 月 5 日開放	445
	港濱歷史公園	111 年 6 月完工，111 年 7 月 15 日開放	4,388
	北區希望公園特色遊戲場設置工程	111 年 12 月 8 日申報完工，112 年 1 月 20 日開放	(北區公所) 500(110 年)
	新化區虎頭埤全齡式地景遊憩服務設施及環境改善工程	111 年 11 月 1 日完工，111 年 12 月 1 日啟用	(觀旅局) 410 萬
	北區文元公園新設特色遊戲場工程	112 年 8 月 15 日完工，8 月 19 日啟用	(北區公所) 500(110 年)
	柳營區櫻花滯洪池特色公園	112 年 8 月 28 日完工，已取得合格檢驗，9/21 辦理驗收	(柳營公所) 80(111 年)；920(112 年)
小計			1 億 3,568.7



# 一、特色公園總表(2/3)-期程與經費

## 特色公園-共45座 施工中16座

進度	特色公園名稱	期程	遊戲場經費(萬)	遊戲場面積(公頃)	開闢經費(含用地費)(萬)
施 工 中 16 座	永康區公3公園(遊戲場移轉永康小橋公園)	111年9月7日停工(施工中挖到文化遺跡，俟遺跡程序完成續辦)	880	0.2634	880
	臺南市中西區體3地下停車場新建工程特色遊戲場	施工中，預計112年12月底完工 (交通局)	440	0.0442	5,500
	安南區商60(公AN29-1)	111年5月31日開工，預計113年1月11日竣工 (地政局)	1821.40	0.2100	5220.97
	安南區商60(公AN29-2)	111年5月31日開工，預計113年1月11日竣工 (地政局)	1945.66	0.2500	9169.33
	學甲華宗公園特色遊戲場新建工程	112年3月1日開工，預計11月完工 (學甲公所)	500(110年)	0.0666	500
	關廟大潭埤特色遊戲場	112年3月1日開工，預計12月底完工 (關廟公所)	50(111年); 670(112年)	0.0645	720
	東區公87公園特色公園	112年3月20日開工，預計113年1月18日完工	500(111年); 700(112年)	0.2000	1,200
	麻豆公11遊戲場新建及排水改善工程	112年3月1日開工，預計11月底完工 (麻豆公所)	1000(110年)	0.1250	1,000
	鹽水公20公園(第二期)	112年7月3日開工	2,000(110年)	0.6000	7,000
	臺南都會公園遊戲設施暨景觀改造統包工程	目前施工中，預計11月27日完工，目前進度87.6% (文化局)	2600		2600
	體育局--仁德區體育公園-特色遊戲場工程	6/27決標，7/21開工，預計112年12月完工 (體育局)	1096		1,096
	體育局--歸仁區體育公園-特色遊戲場工程	6/17開工，預計113年1月完工 (體育局)	950		950
	體育局--玉井區體育公園-特色遊戲場工程	8/23決標，預計9月底開工，113年1月完工 (體育局)	950		950
	體育局--佳里區體育公園-特色遊戲場工程	9/12決標，目前辦理簽約中 (體育局)	1096		1,096
	新營區南瀛綠都心公園	10月11日決標，訂約中，預計112年11月開工 (體育局)	300(109年); 700(110年)	0.13	1,000
	體育局--新化區體育公園-特色遊戲場工程	預計112年10月底工程上網招標 (體育局)	930		930
小計			1億9,129.06	1.9537	3億9,812.30

# 一、特色公園總表(3/3)-期程與經費

## 特色公園-共45座 規劃設計中10座

進度	特色公園名稱	期程	遊戲場經費(萬)	遊戲場面積(公頃)	開闢經費(含用地費)(萬)
規 劃 設 計 中 1 0 座	新市區南科公滯 11 特色遊戲場新建工程	併善化全民運動館辦理預計 112 年 11 月 9 日委託設計監造上網招標(體育局)	80(112 年) ; 1020(113 年)		1,100
	永康區小橋公園特色遊戲場工程(永康公所)	目前辦理細部設計中 (永康公所)	80(112 年) ; 620(113 年)		700
	善化區文昌里公 6 公園特色遊戲場工程(善化公所)	112 年 10 月 17 日辦理說明會，預計 11 月底提送細部設計圖說 (善化公所)	80(112 年) ; 1020(113 年)		1,100
	關廟區森林公園特色遊戲場工程(關廟公所)	預計 113 年 7 月至 9 月辦理設計，113 年 10 月工程發包，預計 113 年 12 月底開工，114 年 6 月完工 (關廟公所)	50(113 年) ; 750(114 年)		800
	仁德二空新村等 3 處興關公園工程(仁德公所)	2 處併案活動中心工程預計 11 月底完成規劃設計，1 處工作坊招標中 (仁德公所)	2150		2,150
	東山區公所-東山區體育公園-風雨共融式遊具場域建置工程	目前體育局計畫簽辦中 (體育局)	2000		2,000
	中西區交通公園	目前細部設計中，預計工程 11 月發包 (交通局)	1100		1100
	正統鹿耳門聖母廟共融公園	設計中 (安南區公所)	960		960
	總爺藝文中心特色遊戲場	統包案經費簽辦中，預計 10 月底公告 (文化局)	800		800
	新市區社內滯洪池特色遊戲場	基本設計中，預計監造 113 年 6 月發包，工程 113 年 9 月發包 (新市區公所)	3000		3000
小計			1 億 3,710.00	0	1 億 3,710.00
共 45 座	總 計		4 億 6,407.76	8.5508	10 億 9,833



## 二、近期完工

### 柳營區櫻花滯洪池特色公園工程

工程概述：

工程面積：2.09公頃

工程金額：新臺幣1,000萬元整

工程內容：以既有滯洪池為發想主體，規劃滯洪減災教育解說及微氣候觀測環境教育場域；並利用地景式設計手法搭配共融式遊具，發展多元變化之休憩停留空間於112年8月28日完工，112年9月21日驗收



特色遊戲區空拍照片



### 三、 施工中(1/10)

#### 三-1. 鹽水區公20公園-特色遊戲場 (溪北特色遊戲場示範區)

##### 工程概述:

- 工程面積：0.6公頃
- 工程金額：新臺幣2,000萬元整
- 規劃方向：以冒險刺激作為主要分區構想。
- 進度時程：112年7月3日開工
- 預計113年7月完工




公20公園現況照片





# 分區規劃構想

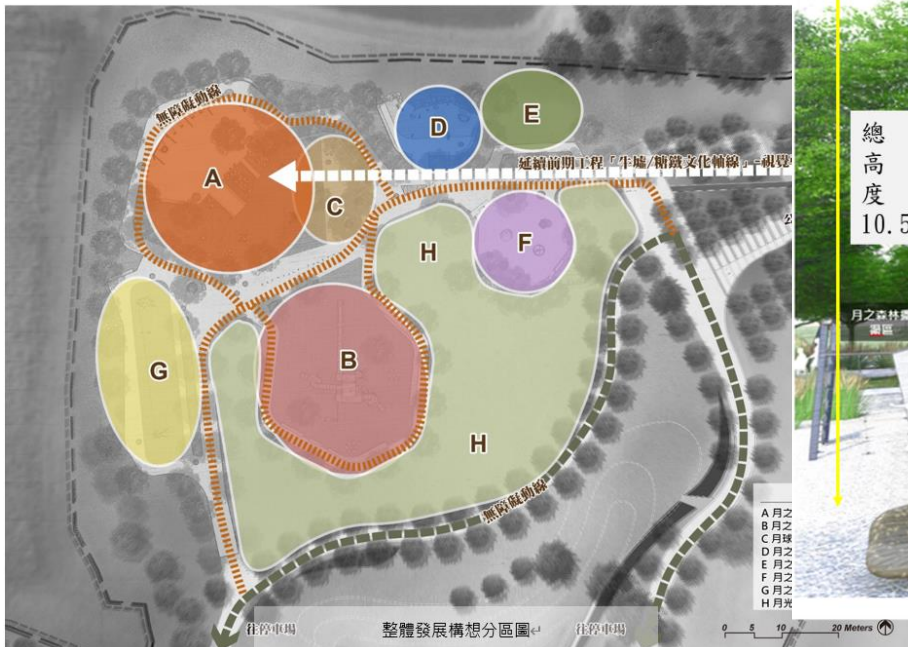

依據工作坊成果及民眾票選結果，  
以「冒險刺激」為主要空間分區構想，  
以「自然大地」為輔  
➔初步設計 主要分區為B(冒險)及A(自然)區






# 三、施工中(2/10)

## 三-2.東區公87特色公園興關工程 - 軍事主題公園

- 工程概述：「小小兵保衛家園，勇闖叢林障礙賽」
- 工程面積：約0.2公頃
- 工程金額：新臺幣1,200萬元整
- 工程內容：以「軍事基地」與「五百障礙挑戰」為發想主題  
規劃特色遊戲場
- 進度時程：112年3月20日開工，預計113年1月18日完工



東區公87基地位置

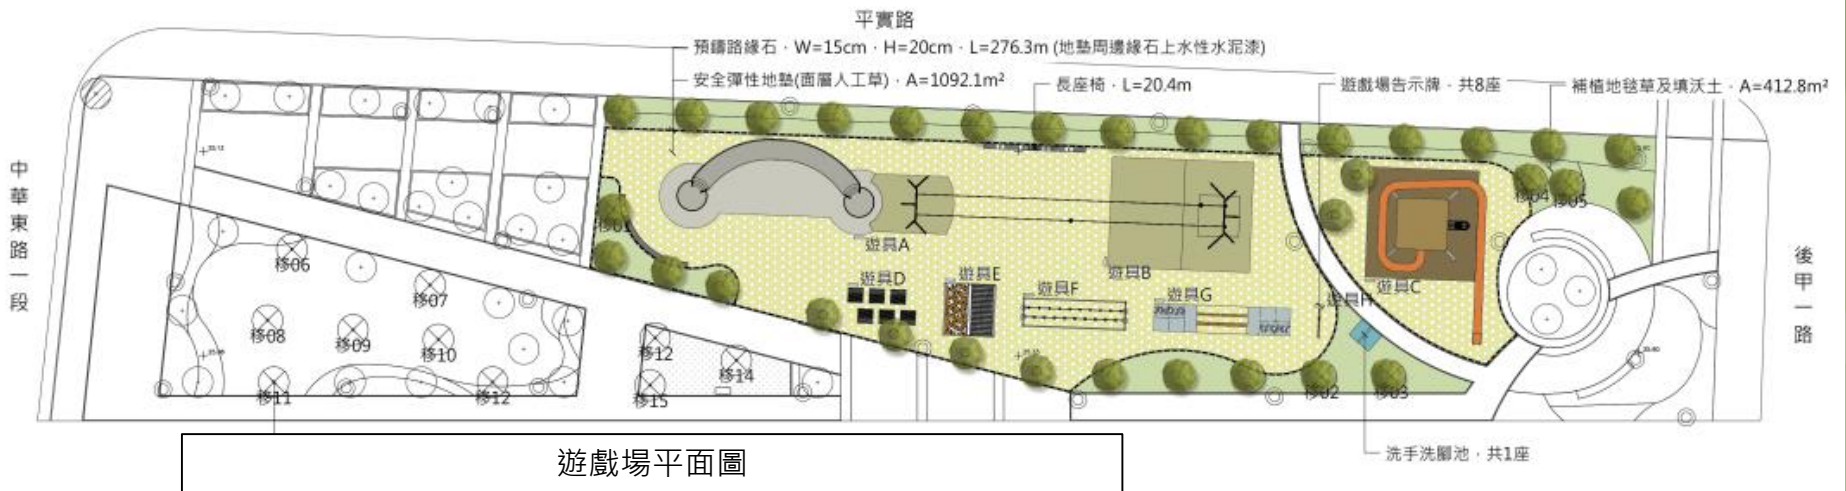

遊戲場平面圖



遊戲堡壘(示意圖)



踏板牆(示意圖)



平衡遊具組(示意圖)



走繩索(示意圖)

## 三-3.關廟大潭埤特色遊戲場工程 - 鳳梨旺旺萊主題遊戲場

工程概述：


「來一場鳳梨派對，挑戰快樂極限」

工程面積：約0.0645公頃

工程金額：預計新臺幣720萬元整

工程內容：以「關廟鳳梨」為主題，從遊戲中認識關廟的農產文化特色


進度時程：112年3月1日開工，預計112年12月底完工

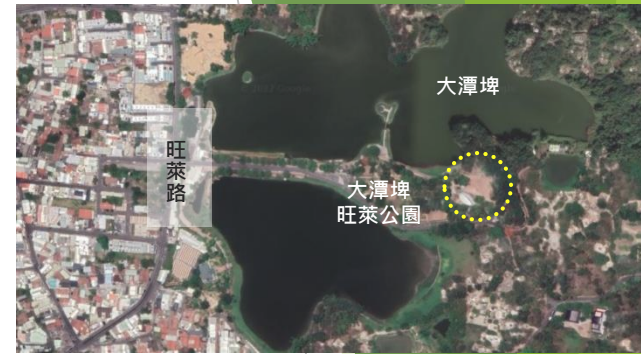

大潭埤公園基地位置



遊戲場平面圖

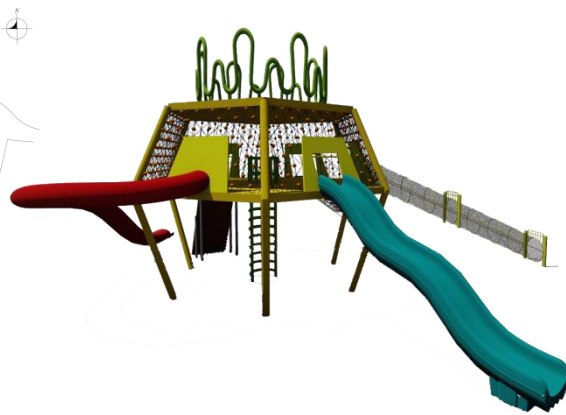

鳳梨派對小屋(模擬圖)



旋轉鞦韆(示意圖)



共融轉盤(示意圖)



旋轉飛輪(示意圖)



小花傳聲筒(示意圖)



三-4.學甲華宗公園特色遊戲場新建工程 - 虱目魚兒活蹦亂跳遊戲場

「魚兒魚兒·樂悠游」

工程概述：

工程面積：約0.0666公頃

工程金額：預計新臺幣500萬元整

工程內容：規劃能滿足旋轉、滑溜、攀爬及擺盪的遊戲迴圈，並設計造型獨特的魚兒遊戲丘

進度時程：112年3月1日開工，預計112年11月完工



遊戲場平面圖



學甲華宗公園基地位置



旋轉盤(示意圖)



旋轉盤(示意圖)




旋轉杯(示意圖)



多人繩索鞦韆(示意圖)



三角攀網(示意圖)

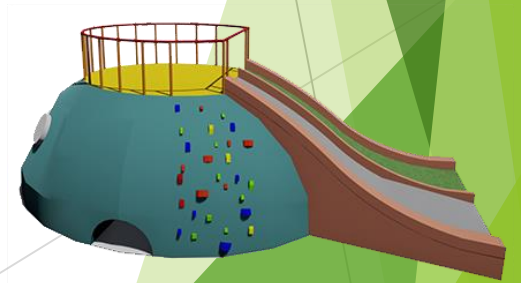

魚兒遊戲丘(模擬圖)



## 三-5.麻豆公11遊戲場新建及排水改善工程 - 倒風內海登頂攀爬遊戲場

「麻豆從潟湖的港口到陸化故事」

工程概述：

工程面積：約0.125公頃

工程金額：預計新臺幣1,000萬元整

工程內容：運用高低且傾斜的設計，再現「倒風內海」的故事

進度時程：3月1日開工，預計112年11月底完工



麻豆公11基地位置



遊戲場平面圖



環型攀網遊戲區(示意圖)



滑草小丘(示意圖)



涼涼海風鞦韆組(示意圖)



## 三-6、安南區公29-1及公29-2特色遊戲場 (安南區北安商業區重劃工程)


工程概述:(地政局公辦市地重劃)

- 工程面積：**0.21公頃**(公AN29-1)、**0.25公頃**(公29-2)
- 工程金額：**新臺幣3,767.06萬元**
- 工程內容：以草湖寮(魚塭四周搭建草寮居住)及安南區古稱台江(形如月眉，狀似鯨背)發想公園及遊樂場設計。
- 進度時程: 111年5月31日開工，預計113年1月11竣工。

公29-2  
(台江地景)



公29-1  
(草湖寮地景)

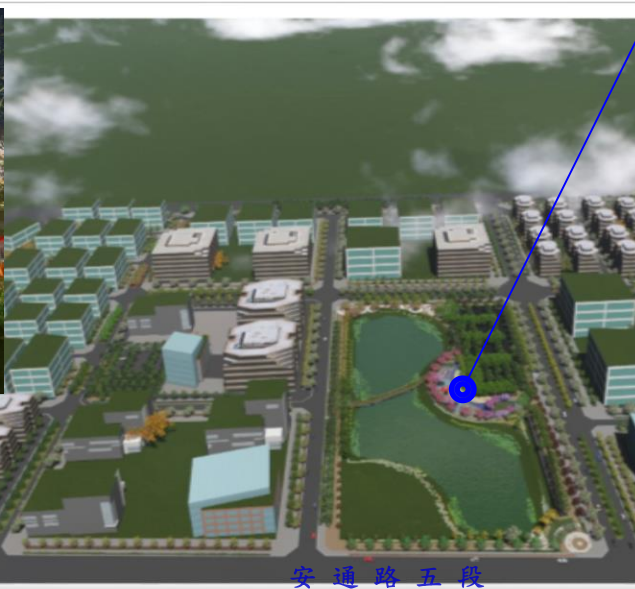


# 三、施工中(7/10)

## 三 - 7 . 臺南市新營區南瀛綠都心公園特色遊戲場 ( 併入全民運動館新建工程設置 )

### 工程概述

- 工程面積：**0.13公頃**
- 工程金額：預計新臺幣1,000萬元整
- 規劃方向：結合全民運動館營造及當地特色元素。
- 進度時程:112年10月11日決標，預計112年11月開工。

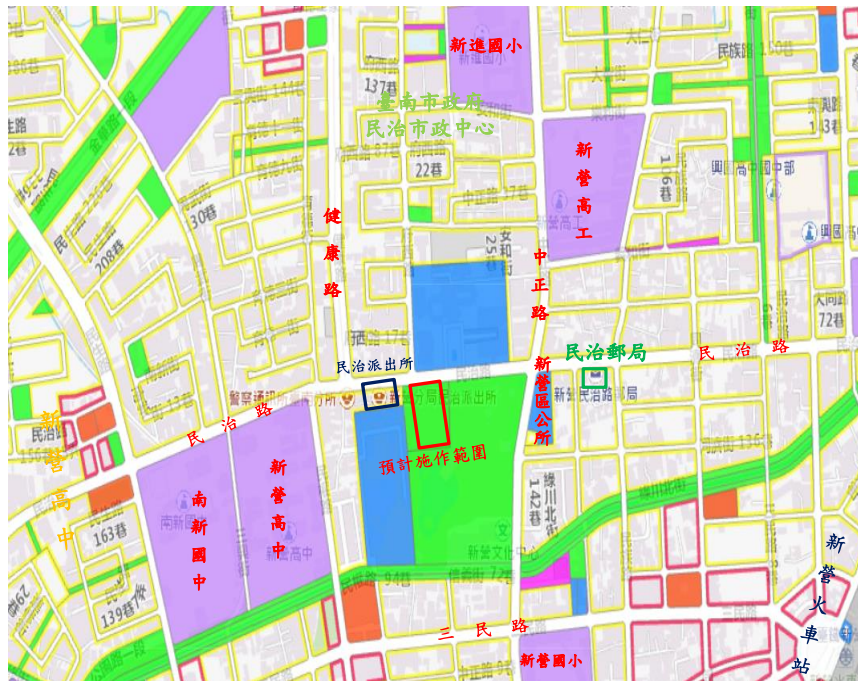




### 工程概述

- 工程面積：約1,400m<sup>2</sup>
- 工程金額：約993萬元
- 工程內容：地坪改善，增設特色遊戲場
- 施作進度：112年6月17日開工，預計113年1月27日完工



基地位置

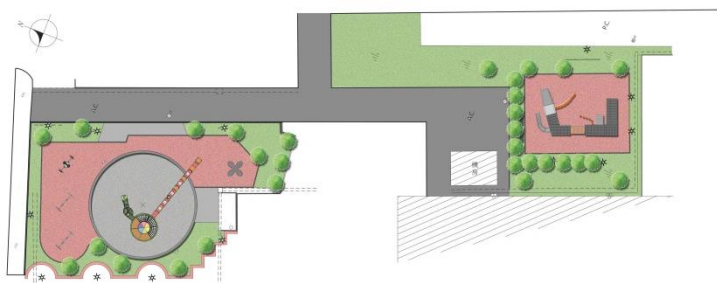

遊戲場平面圖



大齡釋迦遊戲場(示意圖)



大齡釋迦遊戲場(示意圖)



大齡釋迦遊戲場(示意圖)



小齡高鐵遊戲場(示意圖)



小齡高鐵遊戲場(示意圖)



現場施作狀況(長座椅)



### 三、 施工中(9/10)

#### 三 - 9 . 玉井運動公園特色遊戲場


工程概述：芒果樹木自然遊戲場

工程面積：約0.16公頃

工程金額：新臺幣950萬元整

工程內容：以芒果為主題形塑結合在地喬木林相的自然遊戲場

進度時程：112年10月23日開工，預計113年1月完工

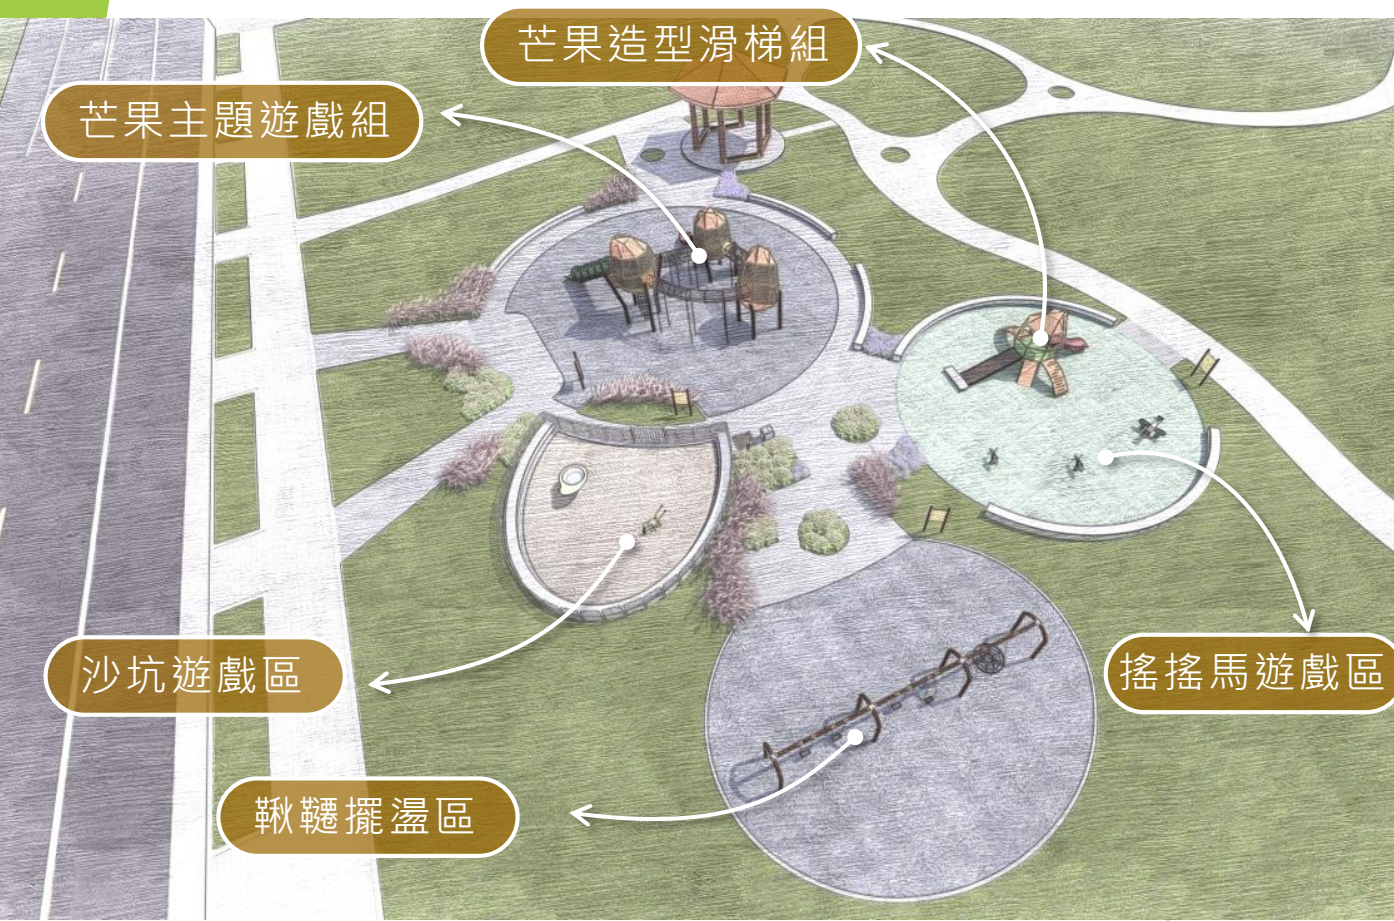



# 三、施工中(10/10)

## 三-10.佳里體育公園特色遊戲設施及道路景觀計畫


工程概述：鹽份地帶特色遊戲場

工程面積：約0.26公頃

工程金額：新臺幣914萬元整

工程內容：以鹽份地帶「鹹鹹」及「甜甜」的地景、產業主題作為整體遊戲場的設計展現。

進度時程：112年10月06日開工，預計113年3月6日完工。

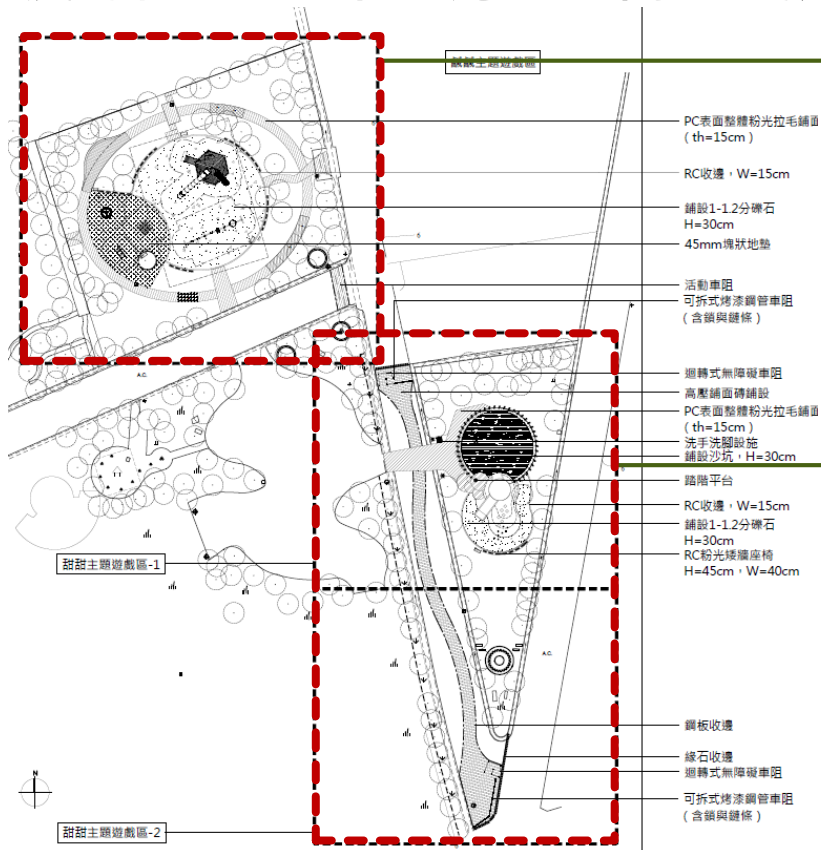

鹽分地帶地景元素，成為設計配置布局；將鹽結晶轉化為遊戲結構，成為遊戲場主要主題遊具的呈現。



以佳里糖業出發，設置五分車意象、融入甘蔗意象與自然地景，強化兒童遊戲以及休憩機能。



## 落實參與機制重視兒童遊戲權

拒絕遊具  
罐頭化

設計要考慮  
遊戲的趣味  
及環境結合

設置要考  
慮空間的  
安全性

兒童遊戲場  
需要維護  
及管理

簡報結束敬請指教
