



2024 臺灣燈會
Taiwan Lantern Festival

2024 台灣燈會在臺南
TAIWAN LANTERN FESTIVAL IN TAINAN



2024臺灣燈會- 場地及電力佈設工作報告

龍耀臺南
GLORIOUS TAINAN

報告單位：工務局

報告人：林科良科長

112年10月31日



- ◆ 電力佈設
- ◆ 整地狀況
- ◆ 人行道及路面AC改善



高鐵燈區電力設施規劃

用電規劃7,847KW





安平燈區電力設施規劃


用電規劃1,394KW



- 電力佈設：9,241KW，經費8,500萬元
- 工程計畫：配合外電外線、變電箱及策展花燈位置布設，臨時用電錶後MP盤60座設置施作(電力錶箱)及中繼電力錶箱90座(PP盤)。
- 執行情形：
 - ✓ 10/27日完成細設，預計11月底完成決標。12月初施工，113年1月中旬完工。
 - ✓ 用電申請登記單於10/27日送台電辦理外線規劃設計。



高鐵燈區整地工程進度

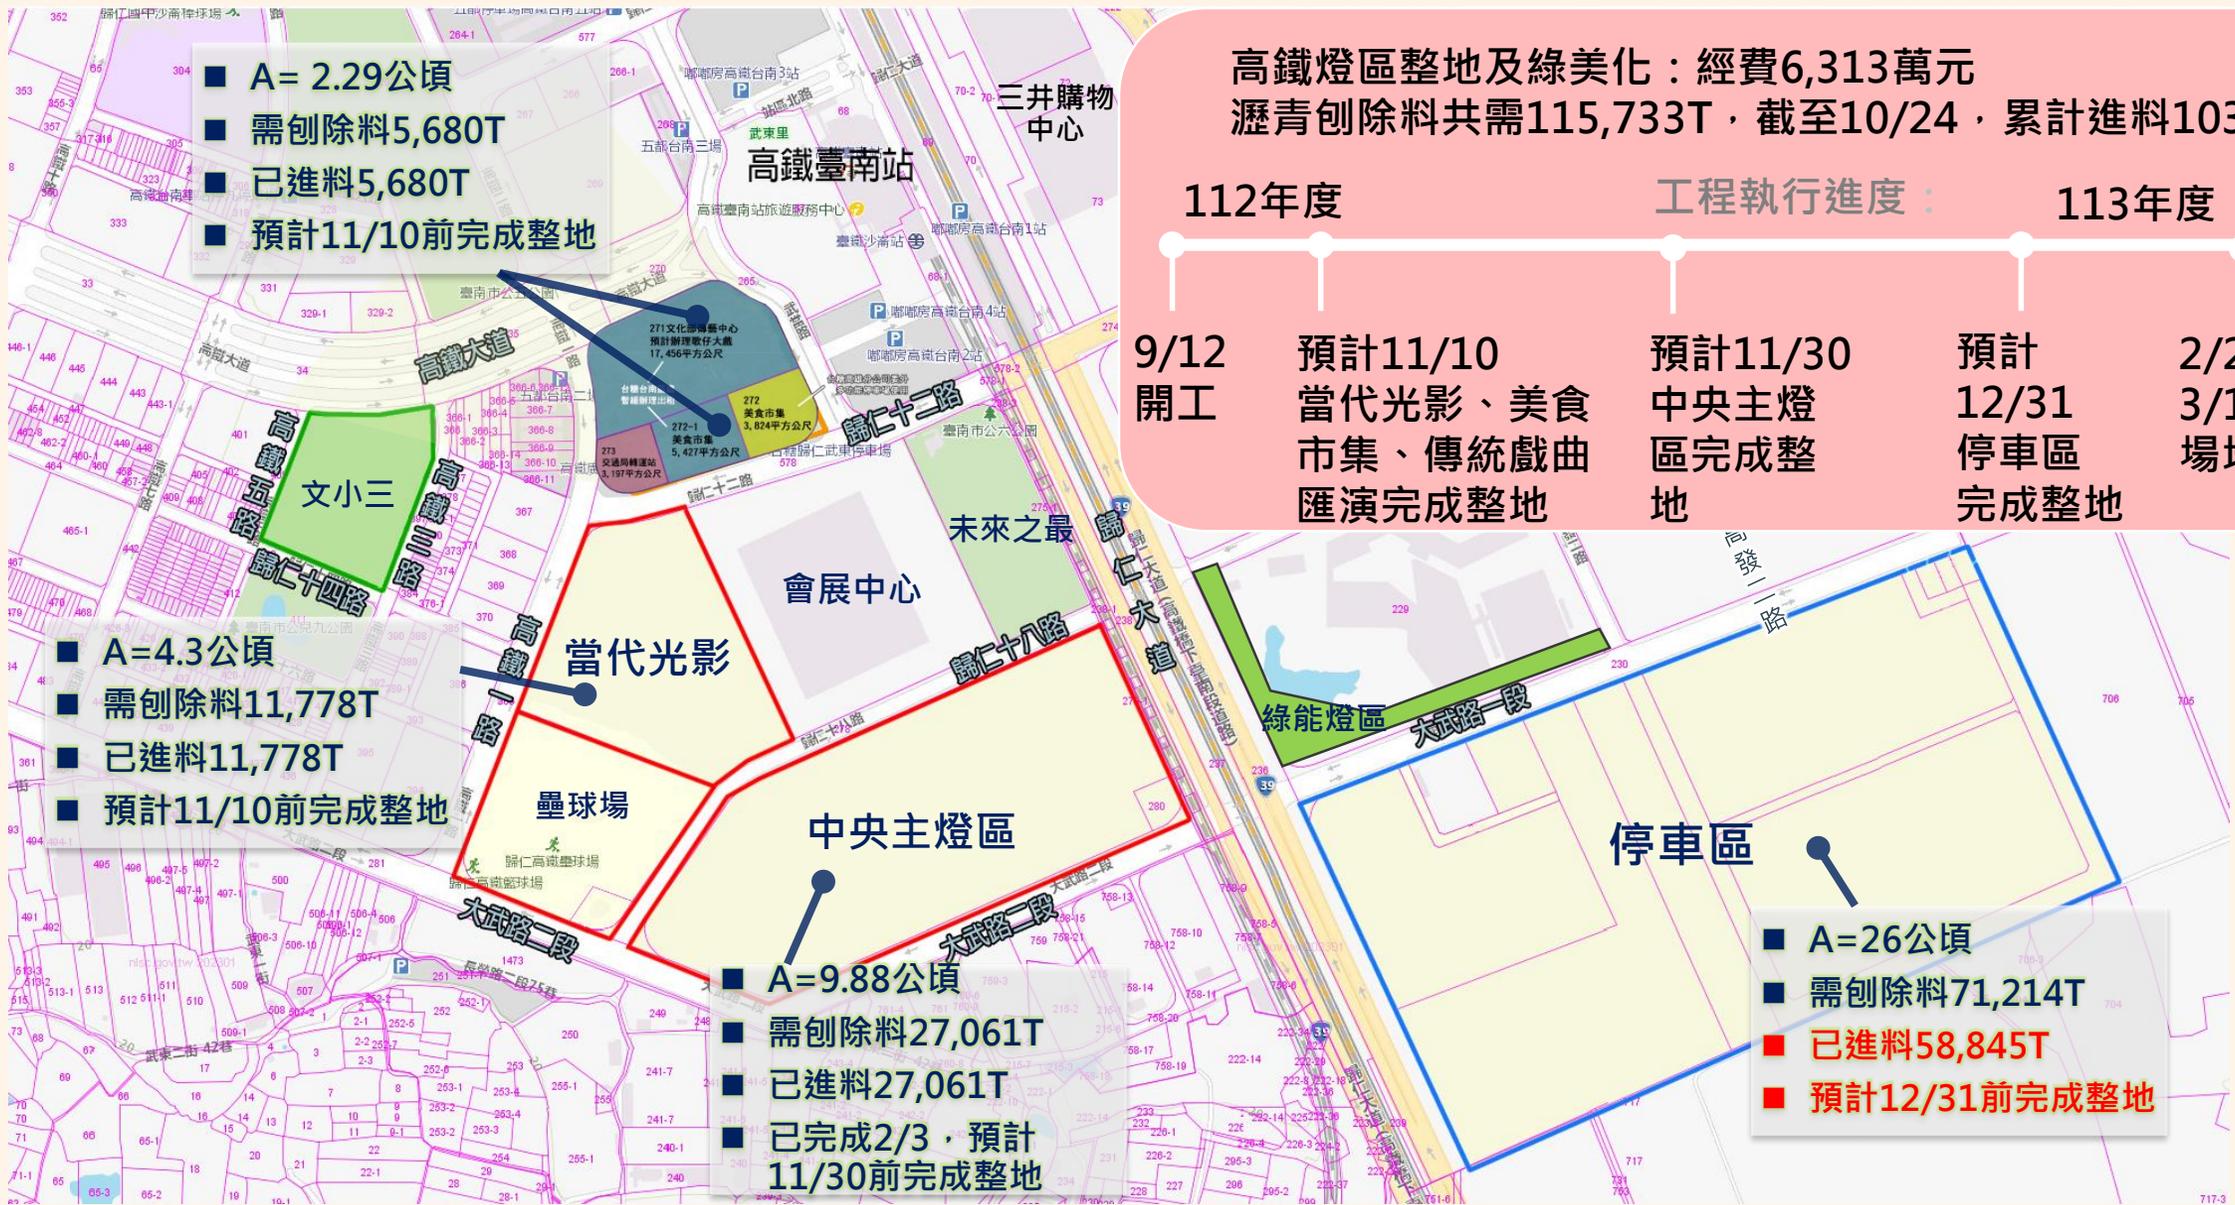

**高鐵燈區整地及綠美化：經費6,313萬元
瀝青刨除料共需115,733T，截至10/24，累計進料103,364T**

112年度 **工程執行進度：** **113年度**


9/12 開工 預計11/10 當代光影、美食市集、傳統戲曲匯演完成整地 預計11/30 中央主燈區完成整地 預計12/31 停車區完成整地 2/24~3/10 場地維護



高鐵燈區整地現況



中央主燈區(9.88公頃)

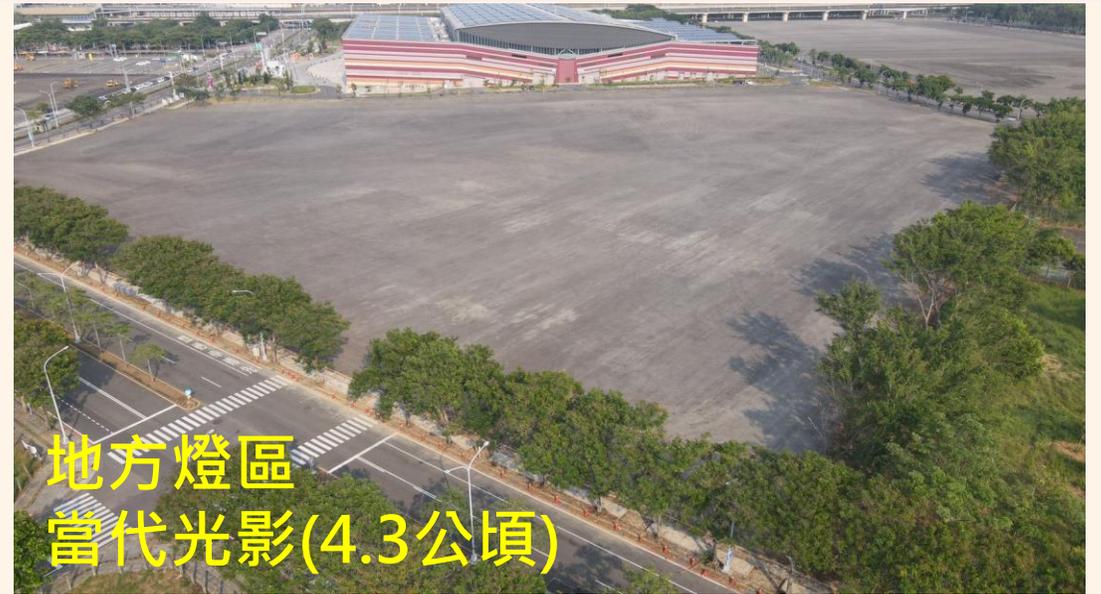

地方燈區
當代光影(4.3公頃)



美食市集&歌仔大戲區(2.29公頃)



停車場(26公頃)



高鐵燈區人行道設施作進度



2024 台灣燈會在臺南
TAIWAN LANTERN FESTIVAL IN TAINAN





高鐵燈區人行道施工中現況



高鐵一路東側



大武路二段



大武路一段



大武路一段



大武路一段



高鐵燈區人行道已完成現況



歸仁十二路南側



歸仁大道西側
(部份改善)



歸仁十六路



歸仁十三路



歸仁十八路北側



歸仁十八路北側



歸仁大道東側



歸仁大道東側



高鐵燈區道路AC改善進度





簡報結束
敬請指教
