



臺南亞太國際棒球訓練中心 進度報告

報告人：王郁傑科長
日期：110年9月28日

① 計畫緣起

② 1期工程

③ 2期工程

計畫緣起

1. 臺南市是棒球發展的重鎮，棒球參與人口達數十萬。
2. 臺南市氣候適合棒球訓練，完成後可提供亞洲地區職業、國家代表隊訓練。
3. 辦理國際賽的場館，可提升國際競爭力。



- 2期 成棒主場
- 1期 少棒副場
- 2期 內野練習場
- 1期 少棒主場
- 2期 戶內外投打練習場
- 2期 成棒副場



1期 8.72 億

+

2期 19.35 億

=

28.07 億

1期工程-少棒主場

期別	第 1 期工程
工程內容	少棒球場 8,000 觀眾席
開工	107/02/22
完工	109/08/20
特色與效益	臺灣唯一通過WBSC認可的少棒球場



少棒主場現況照片



1期工程-少棒副場

期別	第 1 期工程
工程內容	少棒球場 1,000 觀眾席
開工	107/02/22
完工	109/08/20
特色與效益	少棒、壘球複合球場，可多元使用



少棒副場現況照片



2019年 U12 我國奪冠



2期工程-內野練習場

期別	第 2 期工程
工程內容	內野練習場
開工	109/09/28
完工	110/06/30
特色與效益	臺灣首座鄰接棒球場的內野練習場



內野練習場現況照片




2期工程-成棒副球場

期別	第 2 期工程
工程內容	成棒球場 3,000 觀眾席
開工	109/09/28
預計完成	111/12/31
特色與效益	主、副球場相鄰，可吸引更多球迷，增加比賽熱度



成棒副場模擬圖

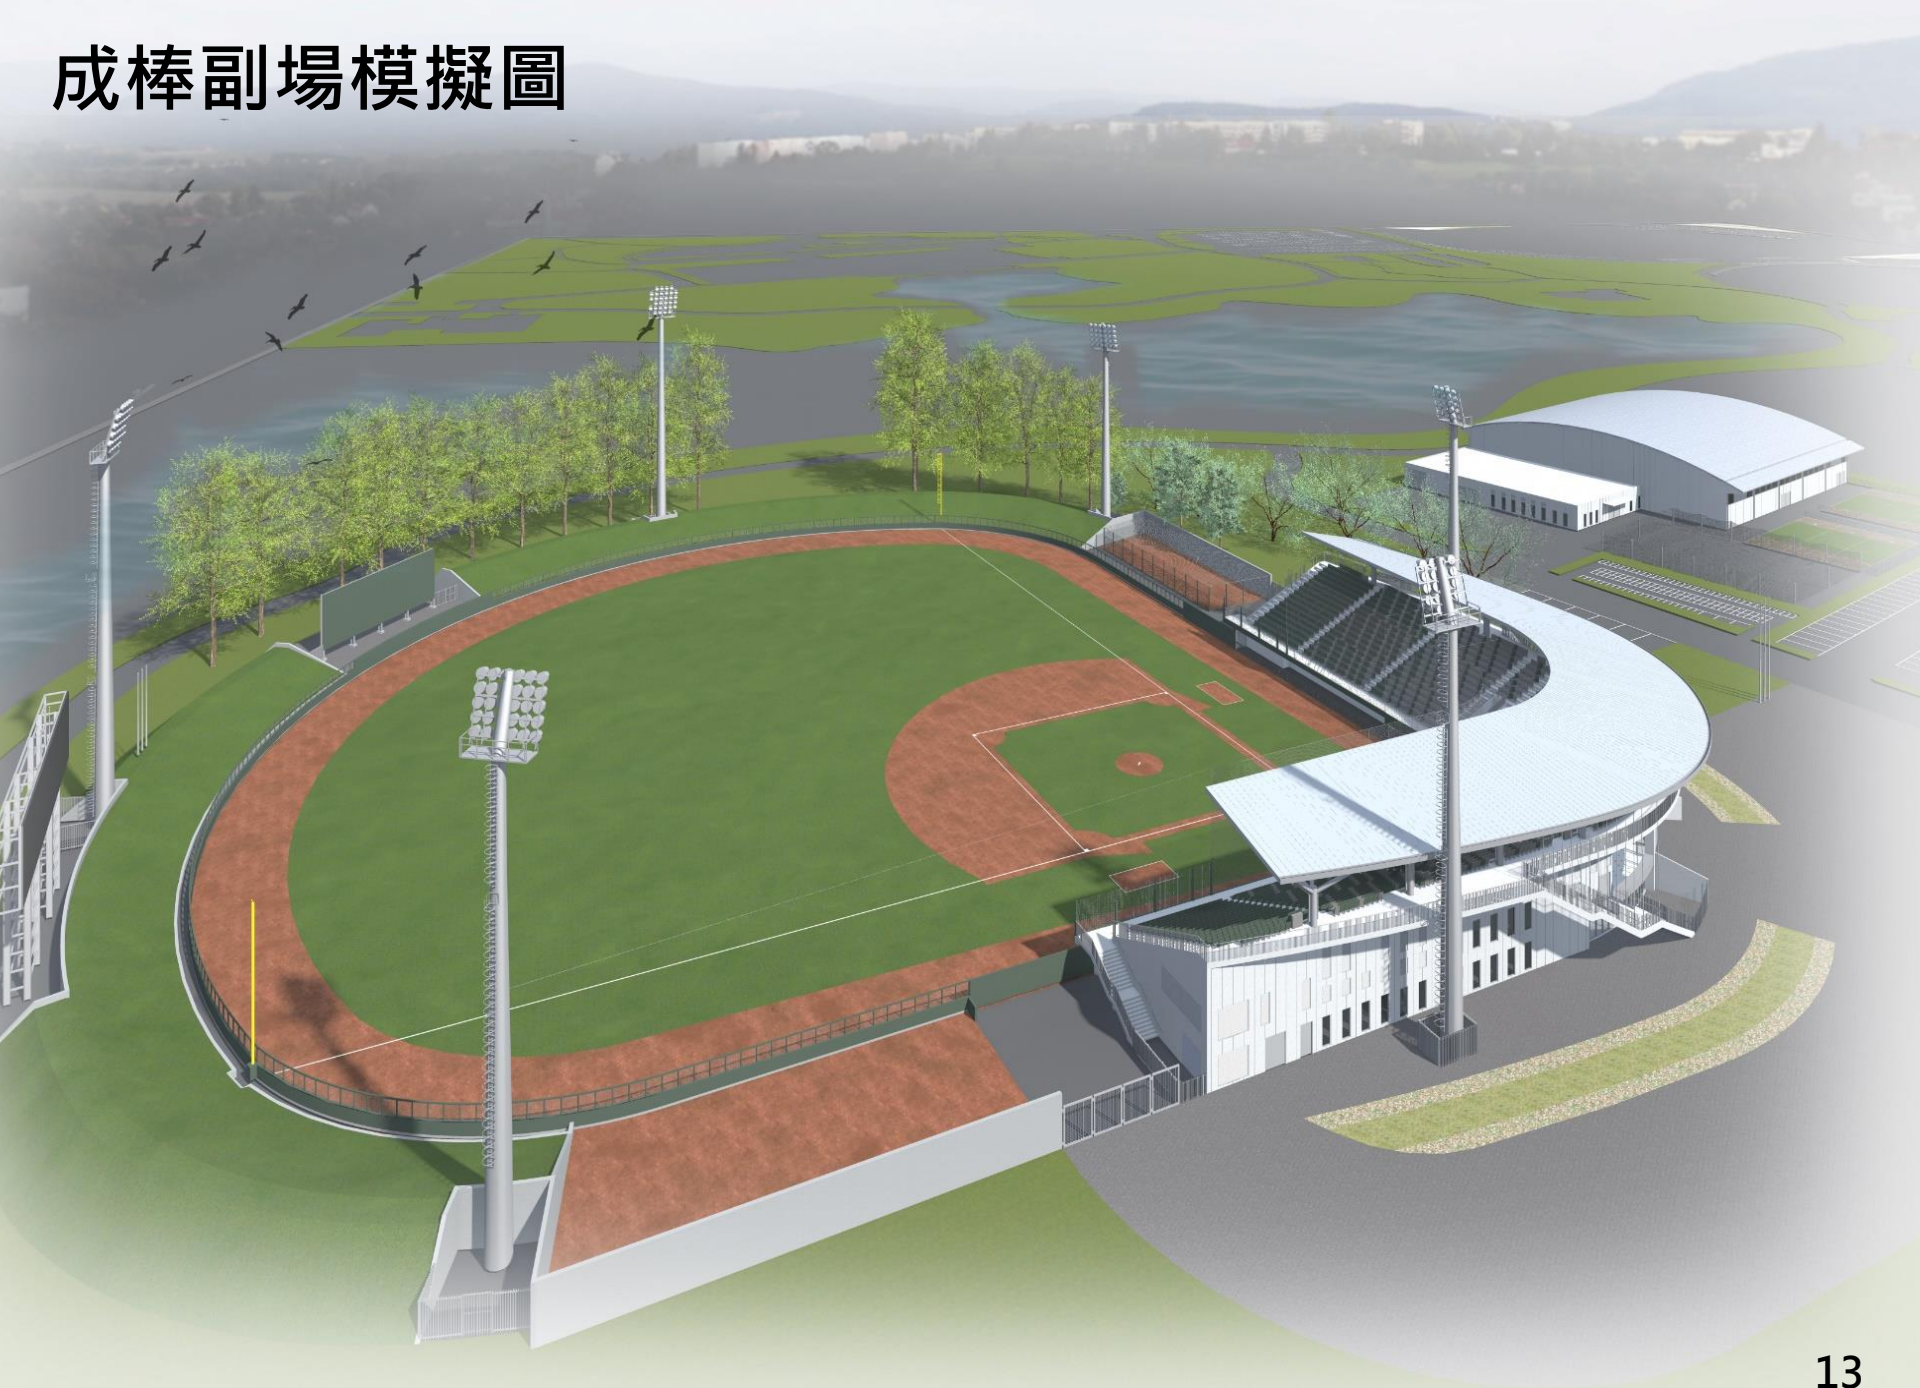

2期工程-室內外投打練習場

期別	第 2 期工程
工程內容	室內投打練習場
開工	109/09/28
預計完成	111/12/31
特色與效益	51x51m 空間內 無柱子的訓練場 ，空間寬敞



室內外投打練習場模擬圖



2期工程-成棒主球場

期別	第 2 期工程
工程內容	成棒球場 25,000 觀眾席
開工	109/09/28
預計完成	112/12/31
特色與效益	臺灣 最多席位 棒球場



成棒主場模擬圖



要成為台灣最好的球場

台南亞太國際棒球訓練中心

預計2023年完工

