


「仁德之心-滯(蓄)洪池景觀營造計畫」基本資料

- (1)工程位置座標(TWD97 二度分帶): (2540831.314, 172984.161)
- (2)主要工項: 環湖步道、花旗木及其他植栽工程、景觀綠籬及生態解說設施
- (3)核定金額:43,462 千元
- (4)預算金額:40,304 千元(發包工程費)
- (5)決標金額: 40,000 千元
- (6)施工廠商: 穎昌工程企業有限公司
- (7)開工日期:109 年 6 月 8 日
- (8)完工日期:110 年 1 月 13 日
- (9)按月施工進度:

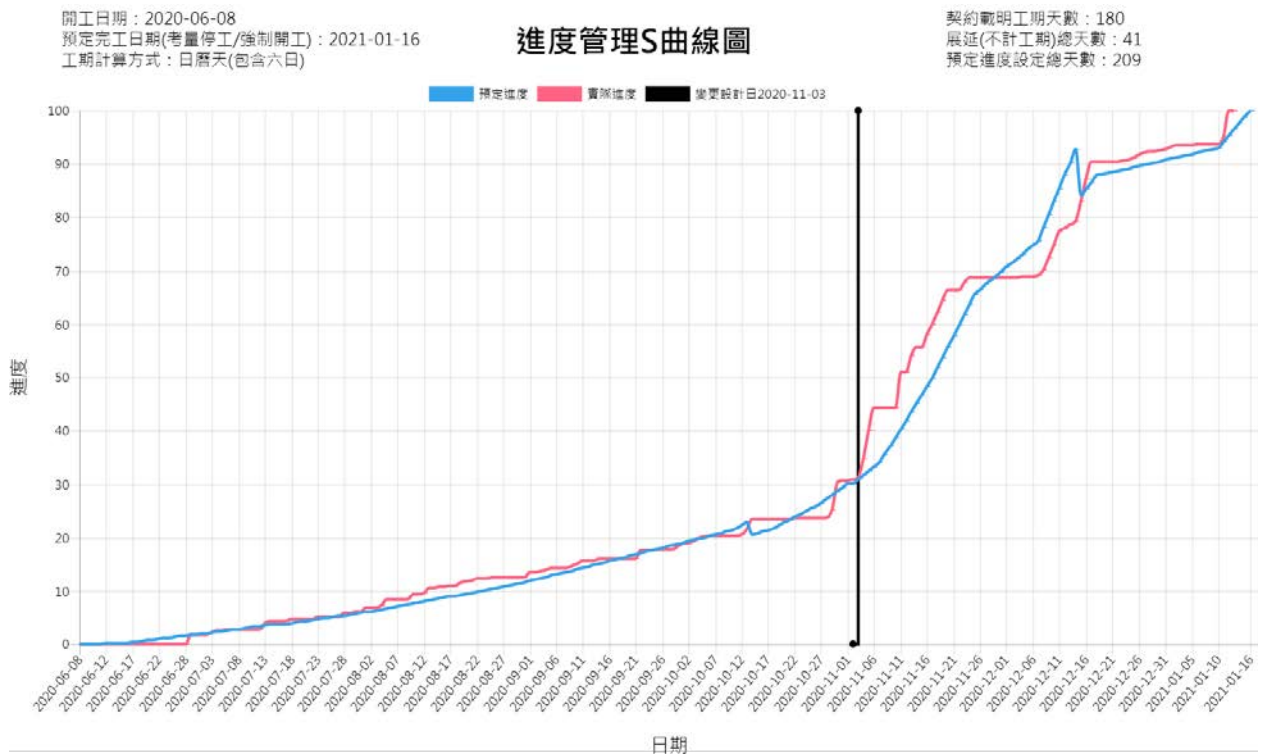

(10)異常事件處置概況:無

(11)生態保育措施執行情形:詳生態保育措施計畫書

(12)施工前中後照片:

施工前



施工中



施工後



