

「月津港環狀水域綠色水岸整建計畫(既有部份)」基本資料

(1)工程位置座標:(23.317040, 120.267383)

(2)主要工項:月津港既有水域營造

(3)核定金額:70,000 千元

(4)預算金額: 64,670 千元(發包工程費)


(5)決標金額: 59,360 千元

(6)施工廠商:義興營造有限公司

(7)開工日期:107 年 3 月 15 日

(8)完工日期:108 年 5 月 25 日

(9)按月施工進度:

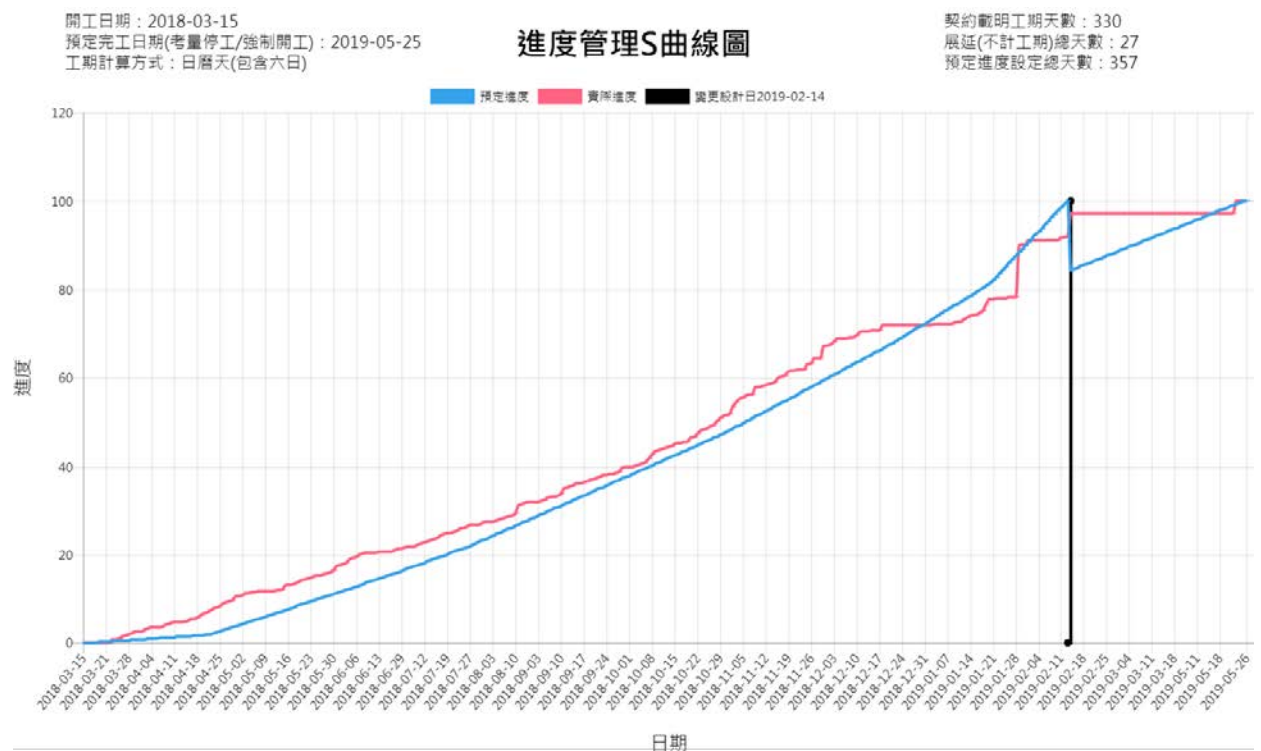

(10)異常事件處置概況:無

(11)生態保育措施執行情形:無

(12)施工前中後照片:

施工前



施工中




施工後



「月津港環狀水域綠色水岸整建計畫(新闢部份)」基本資料

- (1)工程位置座標:(23.315295, 120.273590)
- (2)主要工項:月津港公 18-3、18-5 滯洪池水域營造
- (3)核定金額:66,672 千元
- (4)預算金額: 61,890 千元(發包工程費)
- (5)決標金額: 58,700 千元
- (6)施工廠商:萬田營造有限公司
- (7)開工日期:107 年 3 月 15 日
- (8)完工日期:109 年 4 月 30 日
- (9)按月施工進度:

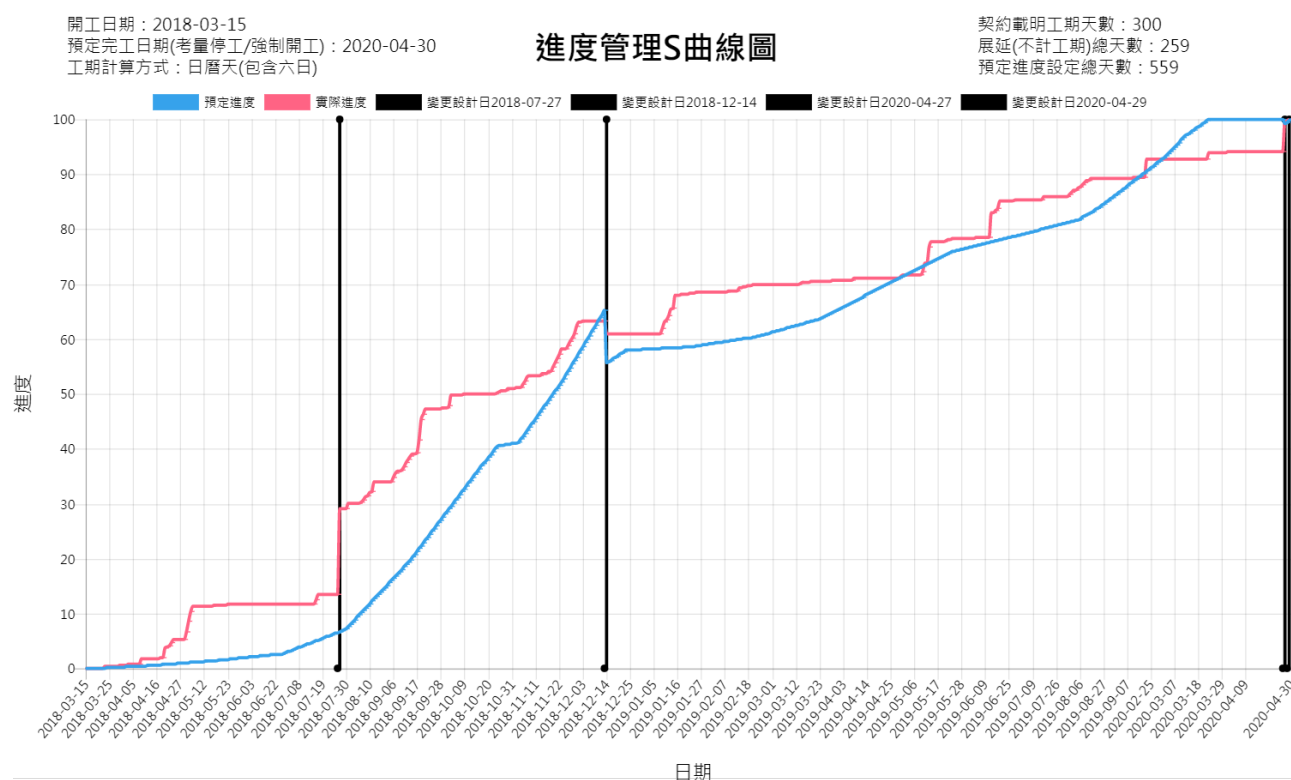

(10)異常事件處置概況:無

(11)生態保育措施執行情形:無

(12)施工前中後照片:

施工前



施工中



施工後

