

災後復建工程經費審議及執行資訊系統

執行控管 操作說明

行政院公共工程委員會
災後復建工程經費審議及執行資訊系統

高雄縣政府A1-數值-彙出

最新公告 | 技術文件 | 查詢統計 | 災後復建提報 | 復建執行控管

請選擇地區：99年9月莫拉威風災

篩選條件
 工程類別：A1-水利工程 | 金額：全部 | 狀態：
 機關名稱：高縣政府 | 執行日期：全部 | 狀態：全部

機關名稱	工程代碼	核定序號	復建工程名稱	災害地點 鄉(鎮)市	村(里)	經費	執行狀態
高雄縣政府	A1	001	大社鄉水庫池30-7號及2-10號護土牆修復工程	大社鄉	高城村	2457	工程變更處註銷
高雄縣政府	A1	002	高橋鄉大社鄉中甲路護土牆修復工程	大社鄉	高城村	1404	完工期限展延
高雄縣政府	A1	003	高橋鄉大社鄉水庫池保甲路護土牆修復工程	大社鄉	高城村	1406	經費調整
高雄縣政府	A1	004	高橋鄉大社鄉保甲路護土牆及石牆修復改善工程	大社鄉	保社村	1553	
高雄縣政府	A1	005	大社鄉護土牆11-3號及石路二號21-1號護土牆及石牆修復工程	大社鄉	保甲村	3035	完工期限展延
高雄縣政府	A1	006	高橋鄉大社鄉中甲路右側護土牆及石牆修復工程	大社鄉	保甲村	3403	
高雄縣政府	A1	007	大寮鄉池潭區龍津水庫護土牆工程	大寮鄉	保甲村	744	經費調整
高雄縣政府	A1	008	大寮鄉龍津水庫仁仁橋護土牆工程	大寮鄉	橋脚村	719	

行政院公共工程委員會
災後復建工程經費審議及執行資訊系統

高雄縣政府A1-數值-彙出

最新公告 | 技術文件 | 查詢統計 | 災後復建提報 | 復建執行控管

高橋鄉政府99年9月莫拉威風災公共設施災後復建工程

- 工程代碼：A1-水利工程
- 核定序號：001
- 復建工程名稱：大社鄉水庫池30-7號及2-10號護土牆修復工程
- 災害發生地點：大社鄉 高城村 水庫池
- 核定經費：2,457
- 完工日期：2011.03.19

衛星定位點：N 座標 189132 Y座標 2517258

項目	單位	數量	報價(元)	備註
石砌	(1M*1M*1M)	2,700	910,245,000	每邊行米每段13個每段石砌(含五層築放旁路高4*3*3*2*1)、修復L=70M

七、審查意見：
 一、經查該項公共設施工程計畫，係屬水利經費管理案。
 二、建議每邊行米每段13個每段石砌(含五層築放旁路高4*3*3*2*1)、修復L=70M，經費5,970M，石砌每段10M-10M-10M圍堰的為2700元/M，請於估價單內註明，應以基礎土方加護欄及旁路等費。
 三、總金額：2,700*4*3*3*2*1=487,500元。

八、變更紀錄

狀態	變更類別	申請日期	申請原因	核可日期

大綱

1 經費調整

- 1.1 經費調整-個案填報
- 1.2 經費調整-整批填報
- 1.3 經費調整-整批審查

2 工程變更或註銷

- 2.1 工程變更或註銷-個案填報
- 2.2 工程變更或註銷-個案審查

3 完工期限展延

- 3.1 完工期限展延-個案填報
- 3.2 完工期限展延-整批提送
- 3.3 完工期限展延-個案審查

4 復建執行控管狀態查詢

附錄 標案管理系統配合作業

復建執行控管-辦理事項

人員屬性	機關	系統使用功能
地方提報人員	公所、學校、其他縣轄機關	<ul style="list-style-type: none"> • <u>工程變更或註銷</u>、<u>完工期限展延</u>等申請之<u>填報</u>。
縣市政府業管人員	縣市政府	<ul style="list-style-type: none"> • <u>經費調整</u>之<u>填報</u>。（僅含個案經費調整填報功能） • <u>工程變更或註銷</u>、<u>完工期限展延</u>等申請之<u>填報</u>。
縣市政府業管管理員	縣市政府	<ul style="list-style-type: none"> • <u>經費調整</u>、<u>工程變更或註銷</u>、<u>完工期限展延</u>等申請之<u>填報</u>及<u>送出</u>。
縣市政府管理人員	縣市政府	無
審議小組業管人員	工程會	<ul style="list-style-type: none"> • <u>經費調整</u>、<u>工程變更或註銷</u>、<u>完工期限展延</u>等申請之<u>審查</u>。

登入系統

The screenshot shows the top navigation bar of the system. On the left is the logo of the Executive Yuan Public Works Commission and the title '災後復建工程計畫管理資訊系統'. On the right are links for '註冊', '加入我的最愛', and '瀏覽人數: 登入'. A red box highlights the '登入' link. Below the navigation bar is a horizontal menu with '最新公告', '技術文件', and '查詢統計'. The main content area features a light blue background with the text '請先登入系統' and a login form. The form has two input fields labeled '帳號' and '密碼', and a '登入' button. A red box highlights the entire login form area. A yellow callout box points to the '登入' link with the text '1. 按右上方之[登入] 進入系統登入畫面'. Another yellow callout box points to the login form with the text '2. 輸入[帳號]與[密碼] 即可登入系統'.

行政院公共工程委員會
災後復建工程計畫管理資訊系統

註冊 加入我的最愛 瀏覽人數: 登入

1. 按右上方之[登入]
進入系統登入畫面

最新公告 | 技術文件 | 查詢統計

請先登入系統

帳號 密碼 登入

2. 輸入[帳號]與[密碼]
即可登入系統

登入系統



最新公告

參考資料

查詢統計

災後復建審議

復建執行控管

請選擇颱風: 100年8月南瑪都颱風

篩選條件

工程類別: 全部 復建經費: 全部
機關名稱: 全部 鄉(鎮市): 全部 狀態: 全部
工程名稱: 執行狀態: 全部
工程狀況: 全部

經審議後建議變更類別之案件

執行狀態顏色說明: 未送出 申請中 退回 已核可 不同意


1 2 3 4 5 6 7 8

機關名稱	工程代碼	核定序號	復建工程名稱	災害地點		經費	執行狀態	工程狀況
				鄉(鎮市)	村(里)			
嘉義縣政府	A1	001	大林鎮三角里北勢仔排水災修復重建工程	大林鎮	三角里	613	完工期限展延	已完工
屏東縣政府	A1	001	內田村龍頸溪護岸災修工程	內埔鄉	內田村	1,070	完工期限展延	已完工
嘉義縣政府	A1	002	大林鎮中坑里田寮段0126號旁排水改善工程	大林鎮	中坑里	644	完工期限展延	已完工
屏東縣政府	A1	002	東勢村東興巷護岸災修工程	內埔鄉	東勢村	371	完工期限展延	已完工
嘉義縣政府	A1	003	同仁村柚仔宅17鄰護岸掏空復建工程	中埔鄉	同仁村	403	完工期限展延	已完工

1. 點選[復建執行控管]

1 經費調整

(中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法第15條)

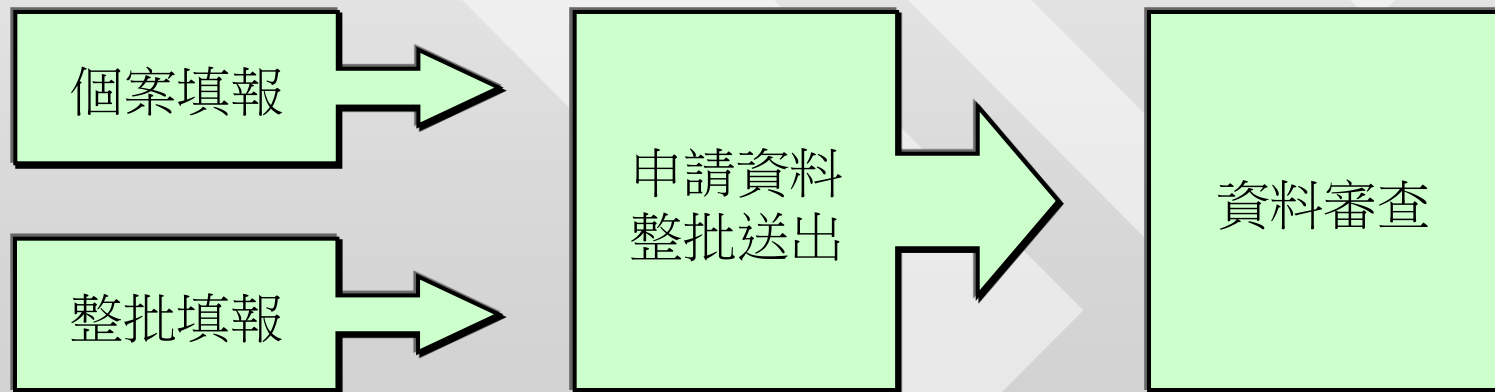

1.1 經費調整-個案填報

最新公告 | 參考資料 | 查詢統計 | 災後復建審議 | **復建執行控管**

請選擇颱風: 100年8月南瑪都颱風

篩選條件

工程類別: 全部

機關名稱: 全部 鄉(鎮市): 全部

工程名稱:

經審議後建議變更類別之案件

執行狀態顏色說明: 未送出 申請中 退回 已核可 不同意

機關名稱	工程代碼	核定序號	復建工程名稱	災害地點		經費	執行狀態	工程狀況
				鄉(鎮市)	村(里)			
嘉義縣政府	A1	001	大林鎮三角里北勢仔排水災修復建工程	大林鎮	三角里	613	完工期限展延	已完工
屏東縣政府	A1	00	內田村龍頸溪護岸災修工程	內埔鄉	內田村	1,070	完工期限展延	已完工
嘉義縣政府	A1	002	大林鎮中坑里北勢仔排水改善工程	大林鎮	中坑里	644	完工期限展延	已完工
屏東縣政府	A1	002	東勢村東勢村護岸災修工程	內埔鄉	東勢村	371	完工期限展延	已完工
嘉義縣政府	A1	003	同仁村龍頸溪護岸掏空復建工程	中埔鄉	同仁村	403		已完工
屏東縣政府	A1		東勢村東勢村護岸掏空復建工程	內埔鄉	東勢村	1,950	完工期限展延	已完工
屏東縣政府	A1		東勢村東勢村護岸掏空復建工程	內埔鄉	東寧村	1,925	完工期限展延	已完工

1. 選取風災專案


2. 點選[復建工程名稱]

1.1 經費調整-個案填報

打鋼軌樁	M	2,800	60	168,000	H=6M, 10支
混凝土路面修復	M	750	20	15,000	W=2M, L=10M

九、審查意見：
依抽查案件核列比率 96.49% 計算

十、照片



九、相關技師：

無技師資料

新增技師

十、變更紀錄

狀態	變更類別	申請日期	申請原因	核可日期	核復日期
申請中	完工期限展延	2013/05/27	(2) 已在規定期限內辦理勞務標或工程標招標經流標者		

申請經費調整

申請工程變更或註銷

申請完工期限展延

點選[申請經費調整]
(必須須為一千萬以下且未經現勘審查之案件)

1.1 經費調整-個案填報

行政院公共工程委員會
災後復建工程經費審議及執行資訊系統

註冊 變更密碼 加入我的最愛 瀏覽人數：26229
高雄縣政府A1，歡迎。 登出

最新公告 | 技術文件 | 查詢統計 | 災後復建提報 | 復建執行控管

高雄縣政府09年5月高市公共設施災後復建工程

申請經費調整

變更經費 (千元)

說明
(請註明工項的變更及說明)

A1 004 經費調整

確定 取消

七、審查意見： 依抽查案件核列比率74.88%計算

八、變更紀錄
無變更紀錄

申請經費調

客服信箱：tcrlservice@tcrl.org.tw 客服電話：(02) 8919-5030 傳真：(02) 2917-8427

輸入變更經費金額及說明事項，按[確定]

1.1 經費調整-個案填報

最新公告

技術文件

查詢統計

災後復建提報

復建執行控管

高雄縣政府99年9月凡那比颱風公共設施災後復建工程

一、工程代碼：A1 - 水利工程

核定序號：003

二、復建工程名稱：高雄縣大社鄉水哮巷傑生上游路面擋土牆修復工程


三、災害發生地點：大社鄉 嘉誠村 水哮巷

四、核定經費：1,406

五、完工期限：2011.03.19

六、復建工程內容、數量及單價：

備註：X序號 195561 X序號 251607

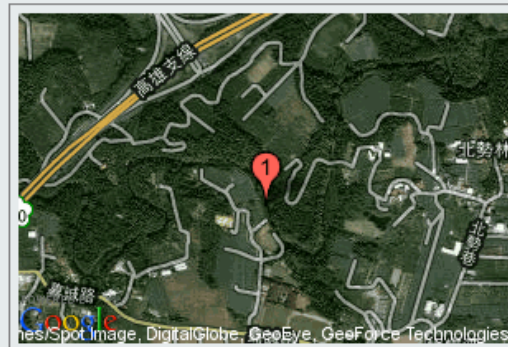

回到申請頁面，即顯示
剛才所填資訊，如需再
修改可按[暫存]進入修
改畫面

複價(元)	備註
1,170,000	
270,000	
72,000	

八、變更

狀態	變更類別	申請日期	申請原因	核可日期
暫存	經費調整	2011/01/20	test	

申請經費調整

申請工程變更或註銷

申請完工期限展延

1.2 經費調整-整批填報

執行狀態顏色說明：■未送出 ■申請中 ■退回 ■已核可

機關名稱	工程代碼	核定序號	復建工程名稱	災害地點		經費	執行狀態
				鄉(鎮市)	村(里)		
高雄縣政府	A1	001	大社鄉中興橋三奶增排水上游段左側護岸等災修工程	大社鄉	三奶	2175	
高雄縣政府	A1	002	大社鄉水埭巷往越湖護岸復建工程	大社鄉	嘉誠村	465	
高雄縣政府	A1	003	大社鄉杆宅巷4號護岸復建工程	大社鄉	嘉誠村	278	
高雄縣政府	A1	004	大社鄉典寶溪牛食坑支線排水改善工程	大社鄉	保社村	3480	
高雄縣政府	A1	005	大社鄉蟬蜩潭美國學校後方護岸修復工程	大社鄉	嘉誠村	1305	
高雄縣政府	A1	006	大社鄉嘉誠村水埭巷22號擋土護岸修復工程	大社鄉	嘉誠村	2170	
高雄縣政府	A1	007	岡山鎮田厝排水田厝一路63號前護岸災害復建工程	岡山鎮	嘉峰里	480	
高雄縣政府	A1	008	美濃鎮成功路379巷排水護岸修復工程	美濃鎮	合和里	1858	
高雄縣政府	A1	009	燕巢鄉深水村典寶溪排水護岸塌壞修建工程	燕巢鄉	深水村	3752	
高雄縣政府	C1	001	田寮高40線015-700濬疏修繕工程	田寮鄉	高40線	670	
高雄縣政府	C2	001	岡山			2322	
高雄縣政府	C2	002	美濃			222	
高雄縣政府	G1	001	新光			2594	
高雄縣政府	H3	001	杉林			7324	
高雄縣政府	H3	002	六龜鄉六龜村	六龜鄉 六龜鄉	六龜村 六龜村	5371	

按[管理【經費調整申請】]，
可整批輸入經費調整內容。
(縣市業管管理員)

管理【經費調整申請】 管理【完工期限展延】

客服信箱：tcriservice@tcrl.org.tw 客服電話：(02) 8919-5030 傳真：(02) 2917-8427

1.2 經費調整-整批填報

053	美濃鎮廣興街慈聖宮後方排水護岸修復工程	3	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
054	美濃鎮龍肚國小後茶頂街17號-7排水護岸修復工程	6	9	<input type="text"/>	<input type="text"/>
056	路竹鄉營前排水匯入二仁溪護岸修復工程	15	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
057	旗山鎮東平里竹寮巷排水護岸崩塌災修工程	3	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
063	燕巢鄉角宿村角宿排水支流護岸損壞修復工程	10	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
065	燕巢鄉典寶溪排水燕鳳橋下游護岸損壞修復工程	9	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
067	燕巢鄉橫山村典寶溪排水護岸損壞修復工程	11	9	<input type="text"/>	<input type="text"/>
068	燕巢鄉橫山村破車籠排水護岸損壞修復工程	10	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>
069	燕巢鄉瓊林村瓊林排水護岸損壞修復工程	14	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>
070	彌陀鄉凡那比颯水六塊厝段災後				
071	彌陀鄉凡那比颯水南岸災後復建				
072	彌陀鄉凡那比颯水災後復建工程				

可整批輸入經費調整結果（如將經費及原因兩欄位資料刪除並儲存，即可刪除該件之經費調整申請）

按[儲存]可暫存不送出，按[申請]即送出申請

儲存 申請

1.2 經費調整-整批填報

■ 註冊 ■ 變更密碼 ■ 加入我的最愛 ■ 瀏覽人數：33945

行政院公共工程委員會
災後復建工程經費審議及執行資訊系統



按  可匯出經費調整總表之XLS檔

最新公告 | 技術文件 | 查詢統計 | 災後復建提報 | 復建工程管

縣市：高雄縣政府 工程代碼：A1 水利工程



核列序號	復建工程名稱	審議經費	變更經費	申請原因	核定經費	回覆意見
003	高雄縣大社鄉水哮巷傑生上游路面擋土牆修復工程	1406	1006	test		
004	高雄縣大社鄉保舍甲路面修復及石籠護岸改善工程	1553				
007	大寮鄉拷潭區域排水修復工程	744	844	test2		
008	大樹區域排水大仁橋段災損工程	719				
009	大樹鄉久堂村湖底1巷16號前(湖底區域排水)護岸修補工程	698	798	test3		
011	大樹鄉久堂村湖底區排298號後護岸修復工程	233				
012	大樹鄉久堂村湖底橋(湖底區域排水)護岸修復工程	140				
013	大樹鄉大坑區域排水(小木屋段)護岸修復工程	725	825	test4		

99年9月凡那比颱風公共設施災後復建經費 經費調整總表

99年9月凡那比颱風 公共設施災後復建經費 經費調整總表													
單位：(千元)													
核列序號	工程代碼	工程名稱	災區地點	災情類別	災情描述	原核定經費	申請調整經費	核定經費	調整原因	審核意見	是否通過	申請原因	審核意見
003	A1	003	高雄縣大社鄉水哮巷傑生上游路面擋土牆修復工程	崩塌	凡那比颱風來襲，致勞勞人兩管沖刷，導致護岸崩塌4m，陸產沉入湖底，嚴重影響行人與行車安全。	26000	10000	16000	原核定經費(含)：26000 * 45 = 1170000 調整後(含)：10000 * 45 = 450000 調整原因：陸產沖刷，導致護岸崩塌4m，陸產沉入湖底，嚴重影響行人與行車安全。	RC直立式護岸(牆身高B=4.0M) (a): 26000 * 45 = 1170000 調整後(含)：10000 * 45 = 450000 調整原因：陸產沖刷，導致護岸崩塌4m，陸產沉入湖底，嚴重影響行人與行車安全。	否	1,008	test
009	A1	009	大樹鄉久堂村湖底1巷16號前(湖底區域排水)護岸修補工程	崩塌	凡那比颱風來襲，致勞勞人兩管沖刷，導致護岸崩塌4m，陸產沉入湖底，嚴重影響行人與行車安全。	26000	10000	16000	原核定經費(含)：26000 * 45 = 1170000 調整後(含)：10000 * 45 = 450000 調整原因：陸產沖刷，導致護岸崩塌4m，陸產沉入湖底，嚴重影響行人與行車安全。	RC直立式護岸(牆身高B=2.0M) (a): 12000 * 50 = 600000 調整後(含)：4000 * 50 = 200000 調整原因：陸產沖刷，導致護岸崩塌4m，陸產沉入湖底，嚴重影響行人與行車安全。	否	844	test2



1.3 經費調整-整批審查

行政院公共工程委員會
災後復建工程經費審議及執行資訊系統

註冊 ■ 變更密碼 ■ 加入我的最愛 ■ 瀏覽人數：33945
工程會，歡迎。登出

最新公告 | 技術文件 | 查詢統計 | 災後復建審議 | 復建執行控管

請選擇颱風：99年9月凡那比颱風

篩選條件
工程類別：A1 - 水利工程 金額：全部 篩選
機關名稱：全部 鄉(鎮市)：全部 狀態：經費調整

執行狀態顏色說明：未送出 申請中 退回 已核可

機關名稱	工程代碼	核定序號	復建工程名稱	災害地點		經費	執行狀態
				鄉(鎮市)	村(里)		
高雄縣政府	A1	003	高雄縣大社鄉水哮巷傑生上游改善橋上墩修復工程	大社鄉	高誠村	1,100	經費調整
高雄縣政府	A1	007	大寮鄉堵潭區域排水修				
高雄縣政府	A1	009	大樹鄉久堂村湖底1巷1工程				
高雄縣政府	A1	013	大樹鄉大坑區域排水				
高雄縣政府	A1	017	大樹鄉大坑				

按[管理【經費調整申請】]
進入審查意見填寫畫面
(工程會審查人員)

管理【經費調整申請】

1.3 經費調整-整批審查

行政院公共工程委員會
災後復建工程經費審議及執行資訊系統

■ 註冊 ■ 變更密碼 ■ 加入我的最愛 ■ 瀏覽人數：33945
工程會，歡迎。登出

最新公告 | 技術文件 | 查詢統計 | 災後復建審議 | 復建執行控管

填寫核定經費及回覆意見

申請原因	核定經費	回覆意見
004 高雄縣大社鄉保舍甲路面修復及石籠護岸改善工程	1553	1006
007 大寮鄉拷潭區域排水修復工程	744 844 test2	844
008 大樹區域排水大仁橋段災損工程	719	
009 大樹鄉久堂村湖底1巷16號前(湖底區域排水)護岸修補工程	698 798 test3	798
011 大樹鄉久堂村湖底區排298號後護岸修復工程	233	
012 大樹鄉久堂村湖底橋(湖底區域排水)護岸修復工程	140	


可選擇[核可]或[退回]

核可 退回

客服信箱：tcrlservice@tcrl.org.tw 客服電話：(02) 8919-5030 傳真：(02) 2917-8427

2 工程變更或註銷

(中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法第14、16條
公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點第十點)

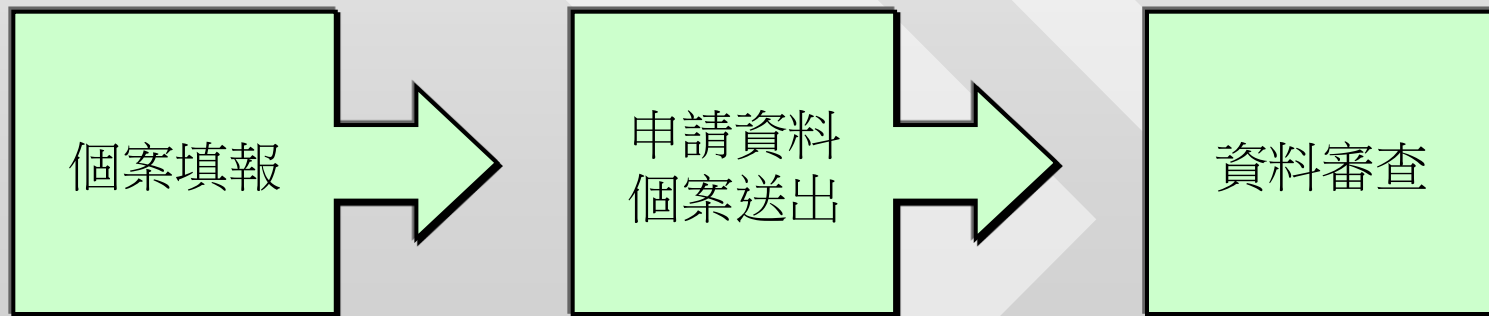

2.1 工程變更或註銷-個案填報

最新公告 | 參考資料 | 查詢統計 | 災後復建審議 | 復建執行控管

請選擇颱風: 100年8月南瑪都颱風

篩選條件

工程類別: 全部

機關名稱: 全部 鄉(鎮市): 全部

工程名稱:

經審議後建議變更類別之案件

執行狀態顏色說明: 未送出 申請中 退回 已核可 不同意

機關名稱	工程代碼	核定序號	復建工程名稱	災害地點		經費	執行狀態	工程狀況
				鄉(鎮市)	村(里)			
嘉義縣政府	A1	001	大林鎮三角里北勢仔排水災修復建工程	大林鎮	三角里	613	完工期限展延	已完工
屏東縣政府	A1	00	內田村龍頸溪護岸災修工程	內埔鄉	內田村	1,070	完工期限展延	已完工
嘉義縣政府	A1	002	大林鎮中坑里大寮寮0126號宮排水改善工程	大林鎮	中坑里	644	完工期限展延	已完工
屏東縣政府	A1	002	東勢村東勢村護岸災修工程	內埔鄉	東勢村	371	完工期限展延	已完工
嘉義縣政府	A1	003	同仁村護岸掏空復建工程	中埔鄉	同仁村	403		已完工
屏東縣政府	A1		東勢村護岸掏空復建工程	內埔鄉	東勢村	1,950	完工期限展延	已完工
屏東縣政府	A1		東勢村護岸掏空復建工程	內埔鄉	東寧村	1,925	完工期限展延	已完工

1. 選取風災專案

2. 點選[復建工程名稱]

2.1 工程變更或註銷-個案填報

排水溝	M	4,100	25	102,500
AC路面	M2	380	210	79,800
臨時擋土措施	M	5,000	65	325,000
洩水管	處	200	130	26,000

九、審查意見：

十、照片



九、相關技師：

十、變更紀錄

狀態	變更類別	申請日期	申請原因	核可日期	中央機關函復日期
申請中	完工期限展延	2013/05/27	(2) 已在規定期限內辦理勞務標或工程招標經濟標者		

按[申請工程變更或註銷]

2.1 工程變更或註銷-個案填報

申請工程變更或註銷

註銷此工程 是 否

程序自主檢核

- 變更後復建經費超過行政院核定經費
- 變更後復建內容影響預定目標、效益及功能
- 變更經費額度超出該工程實際發包金額之30%以上
(如未符合上述任一條件，無須提送本會)

目前核定經費 1,404 (千元)

變更後概估經費 2106 (千元)

目前核定內容
石籠(1M*1M*1M) (個):每進行米佈設13個箱型石籠(分五層擺放分別為4、3、3、2、1)、修復
L=40M 2700 * 520 = 1404000

變更後內容
石籠(1M*1M*1M) (個):每進行米佈設13個箱型石籠(分五層擺放分別為4、3、3、2、1)、修復
L=60M 2700 * 13 * 60 = 2106000

註銷或變更原因說明
災害擴大致復建範圍增加至60M

上傳現況照片

ICRIService@ICRI.org.tw 客服電話：(02) 8919-5030 傳真：(02) 2917-8427

行政院公共工程委員會
PUBLIC CONSTRUCTION COMMISSION, EXECUTIVE YUAN

1. 如為變更案件應
進行自主檢核

2. 請填寫變更後經
費、內容及原因

3. 上傳現況照片

2.1 工程變更或註銷-個案填報

申請工程變更或註銷

註銷此工程 是 否

程序目主概核

- 變更後復建經費超過行政院核定經費
- 變更後復建內容影響預定目標、效益及功能
- 變更經費額度超出該工程實際發包金額之30%以上
(如未符合上述任一條件，無須提送本會)

目前核定經費 1,404 (千元)

變更後概估經費 0 (千元)

目前核定內容
石籠(1M*1M*1M)(個):每進行米佈設13個箱型石籠(分五層擺放分別為4、3、3、2、1)、修復
L=40M 2700 * 520 = 1404000

變更後內容
本工程註銷

註銷或變更原因說明
已自行籌措經費辦理

上傳現況照片
新增照片

列印報表 儲存 送出申請 取消

調整 申請工程變更或註銷 申請完工期限展延

3. 上傳現況照片

1. 如為註銷案件請選[是]

2. 請說明「本案為註銷案件」及其原因

各服務信箱：tcr1service@tcr1.org.tw 客服電話：(02) 8919-5030 傳真：(02) 2917-8427

2.1 工程變更或註銷-個案填報

申請工程變更或註銷

註銷此工程 是 否

程序自主檢核

變更後復建經費超過行政院核定經費

變更後復建內容影響預定目標、效益及功能

變更經費額度超出該工程實際發包金額之30%以上
(如未符合上述任一條件，無須提送本會)


目前核定經費: 1,404 (千元)

變更後概估經費: 0 (千元)

目前核定內容: 石籠(1M*1M*1M) L=40M = 1404000

變更後內容: 本 註銷

註銷或變更原因說明: 已 籌措經費辦理

高雄縣政府99年9月凡那比颱風復建工程註銷或變更內容、經費概要表	
A	B
1	高雄縣政府99年9月凡那比颱風復建工程註銷或變更內容、經費概要表
2	單位:千元
3	復建工程基本資料
4	縣市政府: 高雄縣政府
5	災害名稱: 99年9月凡那比颱風
6	核定序號: 002
7	工程名稱: 高雄縣大社鄉中圳橋樑土牆復建工程
8	原核定經費: 1404
9	案件聯絡人: 姓名: 吳文魁, 電話: (07)3513309
10	程序自主檢核
11	<input type="checkbox"/> 變更後復建經費超過行政院核定經費
12	<input type="checkbox"/> 變更後復建內容影響預定目標、效益及功能
13	<input type="checkbox"/> 變更經費額度超出該工程實際發包金額之30%以上
14	(如未符合上述任一條件，無須提送本會)
15	工程內容或經費變更情形概要
16	目前核定經費: 1404
17	變更後概估經費: 0
18	目前核定內容: 石籠(1M*1M*1M) (個):每進行米佈設13個箱型石籠(分五層擺放分別為4、3、3、2、1)、修復L=40M 2700 * 520 = 1404000
19	變更後內容: 本工程註銷
20	變更原因說明: 已自行籌措經費辦理
21	災害照片
22	核定時災損情形: 現況災損情形
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

按[列印報表]可產出xls檔，作為函報公文之附件

列印報表 儲存 送出申請 取消

申請經費調整 申請工程變更或註銷 申請完工期限展延

客服信箱: icri@icri.org.tw 客服電話: (02) 8919-5030 傳真: (02) 2917-8427

2.1 工程變更或註銷-個案填報

申請工程變更或註銷

註銷此工程 是 否

程序自主檢核

- 變更後復建經費超過行政院核定經費
- 變更後復建內容影響預定目標、效益及功能
- 變更經費額度超出該工程實際發包金額之30%以上
(如未符合上述任一條件，無須提送本會)

目前核定經費 (千元)

變更後概估經費 (千元)

目前核定內容
石籠(1M*1M*1M) (個):每進行米佈設13個箱型石籠(分五層擺放分別為4、3、3、2、1)、修復
L=40M 2700 * 520 = 1404000

變更後內容
石籠(1M*1M*1M) (個):每進行米佈設13個箱型石籠(分五層擺放分別為4、3、3、2、1)、修復
L=60M 2700 * 13 * 60 = 2106000

註銷或變更原因說明
災害擴大致復建範圍增加至60M

上傳現況照片

按[儲存]可暫存不送出

申請經費調整 申請工程變更或註銷 申請完工期限展延

客服信箱: tcrlservice@tcrl.org.tw 客服電話: (02) 8919-5030 傳真: (02) 2917-8427

2.1 工程變更或註銷-個案填報

衛星定位點: X座標217778 Y座標 2626460 (TWD-97)

項目	單位	單價(元)	數量	複價(元)	備註
重力式護岸	M	43,000	40	1,720,000	L=40M,H=7M
固床工	M	12,000	20	240,000	H=2M,L=20M

九、審查意見:

第二工區固床工布設位置需考量，另基座需部分嵌入岩盤中增加穩定性。

十、照片



回到申請頁面，即顯示
剛才所填資訊，如需再
修改或刪除可按[暫存]
進入修改畫面

九、相關技師:

無技師資料

新增技師

十、變更紀錄

狀態	變更類別	申請日期	申請原因	核可日期	中央機關函復日期
暫存	工程變更或註銷		災害擴大，造成.....		
申請中	完工期限展延	2013/05/27	(2) 已在規定期限內辦理勞務標或工程標招標經流標者		

申請經費調整

申請工程變更或註銷

申請完工期限展延

2.1 工程變更或註銷-個案填報

申請工程變更或註銷

註銷此工程 是 否

程序自主檢核

- 變更後復建經費超過行政院核定經費
- 變更後復建內容影響預定目標、效益及功能
- 變更經費額度超出該工程實際發包金額之30%以上
(如未符合上述任一條件，無須提送本會)

目前核定經費 (千元)

變更後概估經費 (千元)

目前核定內容
石籠(1M*1M*1M) (個):每進行米佈設13個箱型石籠(分五層擺放分別為4、3、3、2、1)、修復
L=40M 2700 * 520 = 1404000

變更後內容
石籠(1M*1M*1M) (個):每進行米佈設13個箱型石籠(分五層擺放分別
L=60M 2700 * 13 * 60 = 2106000

註銷或變更原因說明
災害擴大致復建範圍增加至60M

上傳現況照片

按[送出申請]即完成送出
(縣府業管人員)

申請經費調整 | 申請工程變更或註銷 | 申請完工期限展延

客服信箱: icri-service@icri.org.tw 客服電話: (02) 8919-5030 傳真: (02) 2917-8427

項目	單位	數量	單位	金額	備註
RC擋土牆	M2	10,200	360	3,672,000	H=8M, L=45M
地錨(40T)	M	3,600	690	2,484,000	L=30M, 23支
紐澤西式護欄	M	2,300	45	103,500	L=45M
混凝土路面	M	750	225	168,750	W=5M, L=45M

九、審查意見:

經現勘上邊坡擋土牆尚屬完整建議保留,噴草籽配合減做,餘同意所提報施作數量配合現況調整。
不列入計算核列比例

十、照片



九、相關技師:

無技師資料

新增技師

十、變更紀錄

**送出後狀態變更為
[申請中]**

狀態	變更類別	申請日期	申請原因	核可日期	中央機關函復日期
申請中	工程變更或註銷	2013/06/14	已於災後進行搶通搶險工程,現場無施作之急迫需要,為避免浪費公帑,請予以註銷。		

申請經費調整

申請工程變更或註銷

申請完工期限展延

2.2 工程變更或註銷-個案審查

最新公告
參考資料
查詢統計
災後復建提報
復建執行控管

請選擇颱風: 100年8月南瑪都颱風

篩選條件

工程類別: 全部 復建經費: 全部

機關名稱: 全部 鄉(鎮市): 全部 狀態: 全部 篩選

工程名稱: 執行狀態: 全部 工程狀況: 全部

執行狀態顏色說明: 未送出 申請中 退回 已核可 不同意

機關名稱	工程代碼	核定序號	復建工程名稱	災害地點		經費	執行狀態	工程狀況
				鄉(鎮市)	村(里)			
南投縣政府	C1	001	草屯鎮土城里投6線11K+980道路災後復建工程	草屯鎮	土城里	1,230	完工期限展延	已完工
南投縣政府	C1	002	中寮鄉投22線2K+050道路災後修復建工程	中寮鄉	永和村	221		已完工
南投縣政府	C2	001	中寮鄉清水村、內城村聯絡道路災後修復建工程	中寮鄉	清水村	421		已完工
南投縣政府	C2	002	中寮鄉復興村復興巷災後修復建工程	中寮鄉	復興村	1,168	完工期限展延	已完工
南投縣政府	C2	003	中寮鄉內城村第2鄰聯絡道路災後修復建工程	中寮鄉 中寮鄉	內城村 內城村	584		已完工
南投縣政府	C2	004	廣福村福水路災後修復建工程	中寮鄉 中寮鄉	廣福村 廣福村	304		已完工
南投縣政府	C2	005	仁愛鄉新生村眉原橋災害復建工程	仁愛鄉	新生村	2,287	完工期限展延	已完工
南投縣政府	C2	006	同富村草坪頭道路支線災後修復建工程	同富鄉	同富村	1,000		已完工
南投縣政府	C2	007	袖木村11鄰聯絡道路護坡道路災後修復建工程	袖木鄉	袖木村	1,000		已完工
南投縣政府	C2	008	草屯鎮坪頂里鳳廊左支線道路災後修復建工程	草屯鎮	坪頂里	1,000		已完工
南投縣政府	C2	009	草屯鎮雙冬里石灼巷2K+500左支線道路災後復建工程	草屯鎮	雙冬里	1,036		已完工

點選復建工程名稱

2.2 工程變更或註銷-個案審查

項目	單位	數量	單價	總價	備註
RC擋土牆	M2	10,200	360	3,672,000	H=8M, L=45M
地錨(40T)	M	3,600	690	2,484,000	L=30M, 23支
紐澤西式護欄	M	2,300	45	103,500	L=45M
混凝土路面	M	750	225	168,750	W=5M, L=45M

九、審查意見:

經現勘上邊坡擋土牆尚屬完整建議保留,噴草籽配合減做,餘同意所提報施作數量配合現況調整。
不列入計算核列比例

十、照片



**點選[申請中]進入
審查意見輸入畫面
(工程會審查人員)**

九、相關技師:

無技師資料

新增技師

十、變更紀錄

狀態	變更類別	申請日期	申請原因	核可日期	中央機關函復日期
申請中	工程變更或註銷	2013/06/14	已於災後進行搶通搶險工程,現場無施作之急迫需要,為避免浪費公帑,請予以註銷。		

申請經費調整

申請工程變更或註銷

申請完工期限展延

2.2 工程變更或註銷-個案審查

變更詳細資料

工程內容或經費變更情形概要

註銷此工程 是 否

目前核定經費 (千元)

變更後擬估經費 (千元)

目前核

變更後

註銷或變更原因說明

現況照片

審核意見

核可變更經費 (千元)

意見

1. 填寫核可變更經費及審查意見

2. 可視審查情形按 [儲存]、[核定]、[退回]或[不同意] (退回則縣府可再修改；不同意則於系統留下紀錄，縣府需重新申請)


Sea of Japan

縣府八生 技術文件 本局統計 經核復建築業 復建林行機節

客服信箱：icriservice@icri.org.tw 客服電話：(02) 8919-5030 傳真：(02) 2917-8427

3 完工期限展延

(公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點第十一點)



3.1 完工期限展延-個案填報

最新公告 | 參考資料 | 查詢統計 | 災後復建審議 | **復建執行控管**

請選擇颱風: 100年8月南瑪都颱風

篩選條件

工程類別: 全部

機關名稱: 全部 鄉(鎮市): 全部

工程名稱:

經審議後建議變更類別之案件

執行狀態顏色說明: 未送出 申請中 退回 已核可 不同意

1 2 3 4 5 6 7 8

機關名稱	工程代碼	核定序號	復建工程名稱	災害地點		經費	執行狀態	工程狀況
				鄉(鎮市)	村(里)			
嘉義縣政府	A1	001	大林鎮三角里北勢仔排水災修復建工程	大林鎮	三角里	613	完工期限展延	已完工
屏東縣政府	A1	00	內田村龍頸溪護岸災修工程	內埔鄉	內田村	1,070	完工期限展延	已完工
嘉義縣政府	A1	002	大林鎮中坑里大寮寮0126號完排水改善工程	大林鎮	中坑里	644	完工期限展延	已完工
屏東縣政府	A1	002	東勢村東勢村護岸災修工程	內埔鄉	東勢村	371	完工期限展延	已完工
嘉義縣政府	A1	003	同仁村護岸掏空復建工程	中埔鄉	同仁村	403		已完工
屏東縣政府	A1		東勢村護岸掏空復建工程	內埔鄉	東勢村	1,950	完工期限展延	已完工
屏東縣政府	A1		東寧村護岸掏空復建工程	內埔鄉	東寧村	1,925	完工期限展延	已完工

1. 選取風災專案

2. 點選[復建工程名稱]

3.1 完工期限展延-個案填報

七、完工期限：2013.04.27

八、復建工程內容、數量及單價：

衛星定位點：X 座標219448 Y 座標 2627856 (TWD-97)

項目	單位	單價(元)	數量	複價(元)	備註
重力式護岸	M	21,000	70	1,470,000	H=4.5M, L=70M

九、審查意見：
依抽查案件核列比率 97.76% 計算

十、照片



九、相關技師：

無技師資料

新增技師

十、變更紀錄

無變更紀錄

選定復建工程名稱
後，按[申請完工期
限展延]

申請經費調整

申請工程變更或註銷

申請完工期限展延

3.1 完工期限展延-個案填報

最新公告 | 技術文件 | 查詢統計 | 災後復建提報 | 復建執行控管

高雄縣政府99年9月凡那比颱風公共設施災後復建工程

申請完工期限展延

行政院規定之完工期限: 2011-03-10

預定展延之完工期限:

辦理狀況

決標日期:
契約開工日期:
契約完工日期:
實際開工日期:
預定完工日期:
不計工期天數:
原因分析:

展延條件: (1) 民眾陳情或抗爭

儲存 取消

填寫預定展延日期、辦理狀況及展延條件後，按[儲存] (尚未送出)

3.1 完工期限展延-個案填報

- 決標日期：101.3.6
- 實際開工日期：101.3.24
- 契約完工日期：101.7.1
- 預定完工日期：102.10.30
- 不計工期天數：○○
- 原因分析：
 - 本案併H3-004○○○工程、H3-007○○○工程，工期○○日曆天。
 - 100.2.14辦理第一次開標，因投標廠商未達法定家數流標；101.2.23辦理第二次開標，因投標金額高於底價廠商不予減價流標，101.3.6第三次開標決標。
 - 因豪雨造成工區現場土石泥濘，同意自101.5.23至101.5.29不計工期。因A工區災害擴大於101.6.1辦理現勘，101.6.5停工，101.7.20完成變設計送審，101.8.1完成審查，101.8.14復工。
 - 綜上，不計工期日數約○○天，目前進度80%，建請同意展延至101.10.30。

至少每個月都有進度

3.2 完工期限展延-整批提送

南投縣政府	A1	019	南投市苦苓腳排水幹線災修復建工程	南投市	永豐里	773	完工期限展延	逾期已完工
南投縣政府	A1	020	南投市慈世排水下游災修復建工程	南投市	福興里	4,646		已完工
南投縣政府	A1	021	草屯鎮南埔里坪腳排水災害復建工程	草屯鎮	南埔里	2,469	完工期限展延	逾期未 完工
南投縣政府	A1	022	草屯鎮南埔里青宅巷10之5號前青宅排水災修復建工程	草屯鎮	南埔里	1,092		已完工
南投縣政府	A1	023	草屯鎮南埔里青宅巷2之36號青宅排水災害復建工程	草屯鎮	南埔里	406		已完工
南投縣政府	A1	024	草屯鎮南埔里青宅巷35號旁排水災修復建工程	草屯鎮	南埔里	225		已完工
南投縣政府	A1	025	草屯鎮碧洲里溝仔乾下游護岸災害復建工程	草屯鎮	碧洲里	919		已完工
南投縣政府	A1	026	草屯鎮碧洲里過溝橋上下游護岸災害復建工程	草屯鎮	碧洲里	1,880	完工期限展延	逾期未 完工
南投縣政府	A1	027	草屯鎮碧洲里碧興路一段溪洲埤橋護岸災害復建工程	草屯鎮	碧洲里	1,880	完工期限展延	逾期未 完工
南投縣政府	A1	028	草屯鎮南埔里青宅溝區域排水災修復建工程	草屯鎮 草屯鎮	南埔里 南埔里	1,813		已完工
南投縣政府	A1	029	國姓鄉水長流排水幹線-5災修復建工程	國姓鄉	長福村	670		已完工
南投縣政府	A1	030	國姓鄉北坑溪南港二號橋下游護岸災修復建工程	國姓鄉	南港村	3,120		未完工
南投縣政府	A1	031	國姓鄉龜坑排水幹線護岸災修復建工程	國姓鄉	福龜村	879		已完工

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

管理【經費調整申請】

管理【完工期限展延】

案件列表頁面中，按[管理
【完工期限展延】]（縣府業
管管理員）

3.2 完工期限展延-整批提送

行政院公共工程委員會
災後復建工程經費審議及執行資訊系統

■ 註冊 ■ 變更密碼 ■ 加入我的最愛 ■ 瀏覽人數：33945
高雄縣政府A1，歡迎。登出



最新公告 | 技術文件 | 查詢統計 | 災後復建提報 | 復建執行檢核

縣市：高雄縣政府 工程代碼：A1 水利工程

1. 選擇工程類別

核列序號	復建工程名稱	審議經費	核定完工日	申請完工日	展延原因
002	高雄縣大社鄉中圳橋擋土牆復建工程	1404	2011/03/19	2011/08/24	(1) 民眾陳情或抗爭
005	大社鄉鹽埕巷13-3號及和平路二段315號後方擋土牆護岸復建工程	3035	2011/03/19	2011/07/14	(4) 配合其他工程暫無法施作

申請

2. 按[申請]整批送出 (不同類別需分批送出)

3.2 完工期限展延-整批提送

■ 註冊 ■ 變更密碼 ■ 加入我的最愛 ■ 瀏覽人數：33945

行政院公共工程委員會
災後復建工程經費審議及執行資訊系統

最新公告 | 技術文件 | 查詢統計 | 災後復建提報 | 復建執行

縣市：高雄縣政府 工程代碼：A1 水利工程

核列序號	復建工程名稱	審議經費	核定完工日	申請完工日	展延原因
002	高雄縣大社鄉中圳橋擋土牆復建工程	1404	2011/03/19	2011/08/24	(1) 具...
005	大社鄉鹽埕巷13-3號及和平路二段... 土牆護岸復建工程	3035	2011/03/19	2011/07/14	(4) 配合其他工程暫無法施作

如有列印過去提送報表需求，亦可由下拉選單，匯出該批次資料檔案（以送出的時間為索引）

按 [圖標] 後選擇提送梯次，可匯出此次期限展延彙總及明細表之XLS檔，作為函報公文之附件

請選擇申請完工展延日期

2011/1/24 下午 01:56:30
2011/1/24 下午 01:56:30
2011/1/24 下午 01:56:40

下載

3.2 完工期限展延-整批提送

附件3-1

高雄縣99年9月凡那比颱風災害因不可抗力因素致未依限完工且須展延之復建工程案件彙總表

因不可抗力因素致未依限完工之工程	工程類別	件數	核定經費
(1) 民眾陳情或抗爭	A1	1	1,404
	小計	1	1,404
(4) 配合其他工程暫無法施作	A1	1	3035
	小計	1	3035
總計		2	4439

匯出彙總表

附件3-2

高雄縣99年9月凡那比颱風災害因不可抗力因素致未依限完工且須展延之復建工程案件明細表

機關代碼	工程代碼	優先順序	災害地點	復建工程名稱	核定經費	行政院規定之完工日期	預定展延之完工日期	辦理狀況	展延條件
376520000A	A1	002	大社鄉嘉誠村	高雄縣大社鄉中圳橋橋土牆復建工程	1404	2011.03.19	2011.08.24	決標日期： 契約開工日期： 契約完工日期： 實際開工日期： 預定完工日期： 不計工期天數：	
376520000A	A1	005	大社鄉觀音村 大社鄉觀音村	大社鄉鹽埕巷13-3號及和平路二段315號後方橋土牆護岸復建工程	3035	2011.03.19	2011.07.14	決標日期： 契約開工日期： 契約完工日期： 實際開工日期： 預定完工日期： 不計工期天數： 原因分析：	(4) 配合其他工程暫無法施作

註：1. 展延條件以下列6項之一為限：
 (1) 民眾陳情或抗爭。
 (2) 已在規定期限內辦理勞務標或工程標招標經流標者。
 (3) 因災害擴大或實際需求須變更設計，致增加工期。

匯出明細表

3.3 完工期限展延-個案審查

南投縣政府	A1	019	南投市苦苓腳排水幹線災修復建工程	南投市	永豐里	773	完工期限展延	逾期已完工
南投縣政府	A1	020	南投市慈世排水下游災修復建工程	南投市	福興里	4,646		已完工
南投縣政府	A1	021	草屯鎮南埔里坪腳排水災害復建工程	草屯鎮	南埔里	2,469	完工期限展延	逾期未完工
南投縣政府	A1	022	草屯鎮南埔里青宅巷10之5號前青宅排水災修復建工程	草屯鎮	南埔里	1,092		已完工
南投縣政府	A1	023	草屯鎮南埔里青宅巷2之36號青宅排水災害復建工程	草屯鎮	南埔里	406		已完工
南投縣政府	A1	024	草屯鎮南埔里青宅巷35號旁排水災修復建工程	草屯鎮	南埔里	225		已完工
南投縣政府	A1	025	草屯鎮碧洲里溝仔乾下游護岸災害復建工程	草屯鎮	碧洲里	919		已完工
南投縣政府	A1	026	草屯鎮碧洲里過溝橋上下游護岸災害復建工程	草屯鎮	碧洲里	1,880	完工期限展延	逾期未完工
南投縣政府	A1	027	草屯鎮碧洲里碧興路一段溪洲埤橋護岸災害復建工程	草屯鎮	碧洲里	1,880	完工期限展延	逾期未完工
南投縣政府	A1	028	草屯鎮南埔里青宅溝區域排水災修復建工程	草屯鎮 草屯鎮	南埔里 南埔里	1,813		已完工
南投縣政府	A1	029	國姓鄉水長流排水幹線-5災修復建工程	國姓鄉	長福村	670		已完工
南投縣政府	A1	030	國姓鄉北坑溪南港二號橋下游護岸災修復建工程	國姓鄉	南港村	3,120		未完工
南投縣政府	A1	031	國姓鄉龜坑排水幹線護岸災修復建工程	國姓鄉	福龜村	879		已完工
5 6 7 8 9 10 ...								
管理【經費調整申請】		管理【完工期限展延】		<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>按[管理【完工期限展延】] (工程會審人員)</p> </div>				

3.3 完工期限展延-個案審查

行政院公共工程委員會
災後復建工程經費審議及執行資訊系統

註冊 ■ 變更密碼 ■ 加入我的最愛 ■ 瀏覽人數：33945
工程會，歡迎。登出

最新公告 | 技術文件 | 查詢統計 | 災後復建審議 | 復建執行控管

縣市：高雄縣政府 工程代碼：A1 水利工程

核列序號	復建工程名稱	審議經	原因
002	高雄縣大社鄉中圳橋擋土牆復建工程	1404 2011/03/19 2011/08/24	(1) 民眾陳情致抗爭
005	大社鄉鹽埕巷13-3號及和平路二段315號後方擋土牆護岸復建工程	3035 2011/03/19 2011/07/14	(4) 配合其他工程暫無法施作

1. 選擇工程類別

2. 點選案件進入審查意見輸入畫面

3.3 完工期限展延-個案審查

行政院公共工程委員會
工程會，歡迎。登出

1. 可修改展延條件

完工期限展延
行政院規定之完工期限 2011.03.19
預定展延之完工期限 2011.07.14

辦理狀況
決標日期：
契約開工日期：
契約完工日期：
實際開工日期：
預定完工日期：
不計工期天數：
原因分析：

展延條件
(1) 民眾陳情或抗爭

審核意見
核定完工期限 2011/07/14

意見

核定 退回 儲存

2. 填寫核定之期限及意見

3. 可視審查結果按 [核定]、[退回]或 [儲存](退回縣府可再修改重新提送)

3.3 完工期限展延-個案審查

■ 註冊 ■ 變更密碼 ■ 加入我的最愛 ■ 瀏覽人數：33945

行政院公共工程委員會
災後復建工程經費審議及執行資訊系統

工程會，歡迎。登出

最新公告 | 技術文件 | 查詢統計 | 災後復建審議 | 復建執行控管

縣市：高雄縣政府 工程代碼：A1 水利工程

核列序號	復建工程名稱	審議經費	核定完工日期	申	展延原因
002	高雄縣大社鄉中圳橋擋土牆復建工程	1404	2011/03		
005	大社鄉鹽埕巷13-3號及和平路二段315號土牆護岸復建工程	3035	2011/03		

點選圖示，選擇縣府送出檔案的時間，可下載報表（以縣府提送的時間點為不同批次）

請選擇申請完工展延日期

2011/1/20 下午 05:34:46

下載

4 復建執行控管狀態查詢

4 復建執行控管狀態查詢

註冊 變更密碼 加入我的最愛 瀏覽人數: 253605

工程會-南投, 歡迎。登出



最新公告 | 參考資料 | 查詢統計 | 災後復建提報 | 復建執行控管

請選擇颱風: 101年8月蘇拉及天秤颱風

篩選條件

工程類別: 全部 復建經費: 全部
機關名稱: 全部 鄉(鎮市): 全部 狀態: 全部 篩選
工程名稱: 執行狀態: 全部
工程狀況: 全部

執行狀態顏色說明: 未送出 申請中 退回 已核可 已回函

機關名稱	工程代碼	核定序號	復建工程名稱	災害地		金額	狀態
				鄉(鎮市)	地點		
南投縣政府	A1	001	竹山鎮下坪里街仔尾溪枋坪橋上下游災修復建工程	竹山鎮	下坪里		
				竹山鎮	下坪里		
				竹山鎮	下坪里		
南投縣政府	A1	002	竹山鎮下坪里街仔尾溪育英橋下游護岸災修復建工程	竹山鎮	下坪里	5.720	已完工

可自行設定條件篩選案件。

最新公告

參考資料

查詢統計

災後復建提報

復建執行控管

請選擇颱風: 101年6月泰利颱風

篩選條件

工程類別: 全部 復建經費: 全部

機關名稱: 全部 鄉(鎮市): 全部 狀態: 全部 篩選

工程名稱: 執行狀態: 全部 工程狀況: 全部

執行狀態顏色說明: 未送出 申請中 退回 已核可 不同意

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

機關名稱	工程代碼	核定序號	復建工程名稱	災害地點		經費	執行狀態	工程狀況
				鄉(鎮市)	村(里)			
南投縣政府	A1	001	埔里鎮史港坑排水護岸復建工程		廣成里	1,231		已完工
南投縣政府	A1	002	埔里鎮枇杷城排水育英橋下游護岸復建工程		新里	6,520	完工期限展延	已完工
南投縣政府	A1	003	埔里鎮桃米里桃米坑排水護岸復建工程					已完工
南投縣政府	A1	004	埔里鎮蜈蚣里大滴橋上游護岸復建工程					已完工
南投縣政府	A1	005	魚池鄉共和村中鹽土坑橋上下游護岸復建工程					已完工
南投縣政府	A1	006	魚池鄉共和村新和橋上下游基礎補強復建工程					已完工
南投縣政府	A1	007	魚池鄉共和村滴水橋上下游基礎補強復建工程					已完工
南投縣政府	A1	008	魚池鄉共和村鹽土坑溪下游基礎補強復建工程					已完工
南投縣政府	A1	009	名間鄉仁和村東仁段護岸復建工程	名間鄉	仁和村	203	完工期限展延	已完工
南投縣政府	A1	010	名間鄉東湖村番仔寮溪排水護岸復建工程	名間鄉	東湖村	1,260	完工期限展延	已完工
南投縣政府	A1	011	名間鄉新街村排水護岸復建工程	名間鄉	新街村	379	完工期限展延	已完工

可自行設定條件篩選案件 (標案管理系統上填報完工日期後方屬完工)

4 復建執行控管狀態查詢

最新公告 | 參考資料 | 查詢統計 | 災後復建提報 | **復建執行控管**

請選擇颱風: 101年6月泰利颱風

篩選條件

工程類別: 全部 復建經費: 全部

機關名稱: 全部 鄉(鎮市): 全部 狀態: 全部 篩選

工程名稱: 執行狀態: 全部 工程狀況: 全部

執行狀態顏色說明: 未送出 申請中 退回 已核可 不同意

機關名稱	工程代碼	核定序號	工程名稱	災害地點		經費	執行狀態	工程狀況
				(鎮市)	村(里)			
南投縣政府	A1	001	埔里鎮廣成里	埔里鎮	廣成里	1,231		已完工
南投縣政府	A1	002	埔里鎮清新里	埔里鎮	清新里	6,520	完工期限展延	已完工
南投縣政府	A1	003	埔里鎮桃米里	埔里鎮	桃米里	1,935	完工期限展延	已完工
南投縣政府	A1	004	埔里鎮蜈蚣里	埔里鎮	蜈蚣里	4,025	完工期限展延	已完工
南投縣政府	A1	005	魚池鄉共和村中鹽土坑橋上下游護岸復建工程	魚池鄉	共和村	4,052	完工期限展延	已完工
南投縣政府	A1	006	魚池鄉共和村新和橋上下游基礎補強復建工程	魚池鄉	共和村	1,411	完工期限展延	已完工
南投縣政府	A1	007	魚池鄉共和村滴水橋上下游基礎補強復建工程	魚池鄉	共和村	1,395		已完工
南投縣政府	A1	008	魚池鄉共和村鹽土坑溪下游基礎補強復建工程	魚池鄉	共和村	1,224		已完工
南投縣政府	A1	009	名間鄉仁和村東仁段護岸復建工程	名間鄉	仁和村	203	完工期限展延	已完工
南投縣政府	A1	010	名間鄉東湖村番仔寮溪排水護岸復建工程	名間鄉	東湖村	1,260	完工期限展延	已完工

執行狀態欄位可顯示各項申請的進度 (依字體顏色區分)

附錄 標案管理系統配合作業

附錄 標案管理系統配合作業

- 「災後復建工程經費審議及執行資訊系統」執行進度係由「公共工程標案管理系統」匯入，因此行政院核定之復建工程，除一般需登錄資料外，另請工程執行單位配合填寫下列項目，以利系統正確判定其資料屬性：
 - **A1表「專案項目」** 指定標案所屬之復建專案。
 - **B8表「預算核定項目」** 指定標案經費來源之行政院核定項目。

附錄 標案管理系統配合作業

公共工程標案管理系統 www.pcc.gov.tw

(本系統由執行單位填報)
請輸入使用者帳號及密碼

使用者代號

密碼

[加入我的最愛](#)

本系統提供各機關對所執行之在建工程
帳號密碼申請由各主管部會或縣市政府

民衆查詢工程告示

承攬廠商意見反應

[品管訓練合格人員履歷查詢](#)
[公共工程相關人員履歷查詢](#)
[承攬廠商公共工程履歷查詢](#)

登入系統 (可登錄標案執行進度之帳號)

附錄 標案管理系統配合作業

回入口 回前頁 公共工程標案管理資訊系統

- 標案資料登錄
- 標案執行機關變更
- 新增所屬內部單位
- 施工查核季報
- 承攬廠商編號查詢
- 使用者帳號管理
- 標案查詢
- 重複標案併案
- 專案追蹤列管
- 重大工安事件
- 標案資料鎖定解鎖
- 各機關聯絡人員
- 統計分析
- 變更設計併案管理
- 對所屬公告訊息
- 全民督工查詢
- 使用說明

您是本... 01月01日起，第 **3521245** 位訪客

點選 [標案資料登錄]，並進入標案清單。

附錄 標案管理系統配合作業

公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄

92年7月起100萬以上工程類標案資料將自動由招標公告之決標資料轉入，不需新增標案資料。案計畫列管需於預算核定後即開始列管發包狀況，或非屬100萬以上工程類標案主動納入管理時，請按 **新增標案** 建立標案基本資料。如標案由上級機關發包並已登錄相關資料，決標後交由貴單位執行，請按 **新增標案** 建立標案基本資料。先請上級機關以 **變更執行機關** 移轉標案資料至貴機關，再繼續登錄後續執行情形資料。

如要查詢已完工標案或非工程類標案資料可按 **以前年度完工標案** 查詢。

(下表僅顯示貴機關直接執行之本年度在建工程標案，如要登錄下屬單位執行之標案，請按 **新增標案** 建立標案基本資料，並輸入下屬單位之密碼)

下一頁

重新整理

執行單位：高雄市水利局施工

標案編號	標案名稱	決標日期	預算金額	決標日期	決標日期	預算執行率	預算執行率	預算執行率
1	00990308-8			09				
2	00990406-8	099/04/22	2,130	099/05/10	099/12	100.00%	100.00%	0.00%
3	00990428-4	099/05/14	860	099/12/06	099/12	60.00%	90.00%	30.00%
4	00990805-2	八控橋上游(120)護岸應急工程	3,996	099/09/16	099/12	5.58%	19.47%	13.89%
5	00990825-1	埤南重劃區內曹公渠護岸工程	3,636	099/09/23	099/12	100.00%	100.00%	0.00%
6	00991018-3	杉林鄉月眉農場大愛區 <F區> 滯洪池興建工程	5,500	099/11/03	099/12	16.51%	32.35%	15.84%
7	00991018-5	大樹鄉竹寮排水(竹寮酒廠段)等三件護岸修護工程(五月豪雨)	610	099/12/01	099/12	50.00%	60.00%	10.00%
8	00991018-6	大樹鄉湖底排水(瓦厝街道)護岸基礎保護工程	720	099/11/16	099/12	100.00%	100.00%	0.00%
9	00991018-7	旗山鎮新光大排近抽水站護岸災修工程(五月豪雨)	933	099/11/16	099/12	100.00%	100.00%	0.00%

點選 [標案名稱]，進行該項標案資料登錄。

發包預算未達一百萬元之標案決標後，請於三日內由此新增標案。

附錄 標案管理系統配合作業

[回首頁](#)
[回前頁](#)
 公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄

標案名稱	大樹鄉湖底排水(瓦厝街道)護岸基礎保護工興建工程		
標案編號	0000101000	工程類別	重建工程
執行單位	高雄市水利局施工科		
主辦機關	高雄市水利局施工科	主管機關	高雄市政府

聯絡人		聯絡電話	047361441000
-----	--	------	--------------

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	查核督導紀錄(D1)
基本資料2(A2)	各月分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核邀處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	承造廠商工地相關人員(C3)	工安事件(D3)
基本資料4(A4)	營建資料(B4)		異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)		服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	五項指標(D6)
停工狀況(A7)	發包落後(B7)	解約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)		施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)		路平專案(C9)	匯至他系統(D9)

點選 [基本資料1](A1)

本標案報表列印(供內部陳核用)			
基本資料表	各月分配表	品管人員登錄表	查核紀錄表
預算編列表	各月執行表	監造現場人員登錄表	查核追蹤邀處
落後原因表	差異比較表	專任工程人員表	品質自主評量表 空白表
營建資材表	最新月份進度表	工地相關人員表	委員查核空白表

標案管理系統配合作業

公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄->標案基本資料登錄1

執行機關	高雄市
標案編號	(如要修改標案編號，請至主選單標案執行機關變更選項)
登錄權限	<input checked="" type="radio"/> 本機關所有帳號密碼 <input type="radio"/> 限本帳號密碼 <small>(登錄權限如選限本帳號密碼時，機關其他帳號將只能查閱而無法登錄資料。)</small>
標案名稱	大樹鄉湖底排水(瓦厝街道)護岸基礎保護工興建工程
專案項目	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> 非屬專案 非屬專案 4年5000億公共建設投資計畫 石門水庫及其集水區整體治理計畫 易淹水地區水患治理計畫 97年度加強地方建設擴大內需方案 92年擴大公共建設計畫 中央對地方縣市政府計畫型補助款 中央對地方縣市政府一般性補助款基本設施計畫 98年莫拉克颱風災後復建工程 99年9月凡納比復建工程 99年7月豪雨復建工程 99年5月豪雨復建工程 99年0304地震復建工程 98年1011豪雨復建工程 97年辛樂克及蕃蜜災後復建工程 97年卡致基及鳳凰風災復建工程 96年柯羅莎風災復建工程 96年韋帕風災復建工程 96年梧提及聖帕風災復建工程 96年6月豪雨復建工程 </div>
列管狀態	<input checked="" type="radio"/> 非屬統包案件
是否統包	
工程類別	
縣市鄉鎮	選縣市，如跨縣市則選北中南區或台港地區
施工地點	
二度分帶座標	狀、面狀工程請填入工程重要點之位置值
歸屬計畫	計畫主辦機關 (點選上方查詢機關代碼。)
	計畫編號 () <small>(如為列管公共建設計畫，請查明編號後填寫本欄) [重大公共建設編號查詢] [4年5000億計畫編號查詢]</small>
	分項編號 () <small>(如計畫無分項時，本欄免填)</small>

於[專案項目]下拉式選單選取該次災害專案。
 (如屬自行新增之標案，建議先行完成標案新增後，再進入A1表修改專案項目)

099年12月

標案管理系統配合作業

公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄

標案名稱	大樹鄉大坑區域排水(坑內段) 護岸修復工程(五月豪雨)		
標案編號	工程類別	重建工程
執行單位	高雄市水利局施工科		
主辦機關	高雄市水利局施工科		
聯絡人		

資料登錄			
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	完工或結案(C6)	五項指標(D6)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	解約(C7)	人力需求(D7)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	路平專案(C9)	匯至他系統(D9)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)		
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)		
停工狀況(A7)	發包落後		
付款狀況(A8)	復建院核定項目(B8)		
分包廠商(A9)	復建請撥款情形(B9)		

本標案報表列印(供內部陳核用)			
基本資料表	各月分配表	品管人員登錄表	查核紀錄表
院核定項目表	各月執行表	監造現場人員登錄表	查核追蹤懲處
落後原因表	差異比較表	專任工程人員表	品質自主評量表 空白表
營建資材表	最新月份進度表	工地相關人員表	委員查核空白表

[專案項目]正確選擇災害專案後，資料登錄會增加[復建院核定項目](B8)及[復建請撥款情形](B9)，請點選B8表。

附錄 標案管理系統配合作業

公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄->標案預算核定

標案名稱	埤南重劃區內曹公圳護岸整修工程		
標案編號		工程類別	排水工程
執行單位	高雄市水利局施工科		
主辦機關	高雄市政府	主管機關	高雄市政府
發包預算		決標金額	
實際開工日期		預付款	(未填)千元

行政院核定災害工程項目及內容(要修改請先點選核定編號)

核定編號	工程項目及內容名稱	使用預算來源(千元)		
		地方災害準備金	中央補助款	合計
	新增預算核定項目			

點選[新增預算核定項目]。

附錄 標案管理系統配合作業

公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄->標案預算->新增災害復建核定預算

標案名稱	埤南重劃區內曹公圳護岸整修工程		
標案編號	00990825-1	工程類別	排水工程
執行單位	高雄市水利局施工科		
主辦機關	高雄市政府	主管機關	高雄市政府
發包預算	4,475.880千元	決標金額	3,636.000千元
實際開工日期	099年09月23日	預付款	(未填)千元

核定預算項目	(請選擇本標案使用經行政院所核定補助之預算項目)
使用地方災害準備金數	<p>請選擇本標案使用經行政院所核定補助之預算項目</p> <ul style="list-style-type: none"> c52A1-001 大樹鄉大坑區域排水坑內段護岸修復工程 核定金額:4340千元 c52A1-002 大樹鄉湖底區排(瓦厝街旁)護岸修復工程 核定金額:180千元 c52A1-003 永安鄉台17線旁排溝擋土牆修復工程 核定金額:615千元 c52A1-004 田寮鄉三和村九龍寺後災修工程 核定金額:401千元 c52A1-005 田寮鄉崇德村嚶嚶溝中段災修工程 核定金額:2952千元 c52A1-006 杉林鄉新庄村小份尾橋下游護岸整修工程 核定金額:9072千元 c52A1-007 岡山鎮田厝排水上游右護岸災修工程 核定金額:4270千元 c52A1-008 岡山鎮潭底排水華崗路下游護岸災修工程 核定金額:3793千元 c52A1-009 阿蓮鄉五庫村五庫支線排水護岸整修工程 核定金額:1932千元 c52A1-010 阿蓮鄉五庫村老公堀圳護岸整修工程(1) 核定金額:1950千元 c52A1-011 阿蓮鄉五庫村老公堀圳護岸整修工程(2) 核定金額:3488千元 c52A1-012 阿蓮鄉港後村中甲排水護岸整修工程 核定金額:3480千元 c52A1-013 美濃鎮中正湖護岸修復工程 核定金額:1873千元 c52A1-014 高雄縣路竹鄉土庫排水7月豪雨復建工程 核定金額:5438千元 c52C2-001 六龜鄉獅山大橋橋墩防撞鋼板修復工程 核定金額:4438千元 c52C2-002 永安鄉維新村復興路旁道路擋土牆搶修工程 核定金額:2163千元 c52C2-003 田寮鄉七星村魁仔寮無名橋道路災修工程 核定金額:194千元 c52C2-004 田寮鄉大同村菜堂路道路災修工程 核定金額:1302千元 c52C2-005 田寮鄉古亭村南勢道路災修工程 核定金額:2231千元
使用中央補助款數	
本標案使用預算數	

由[核定預算項目]下拉式選單，選擇本標案所屬之行政院核定復建工程

附錄 標案管理系統配合作業

公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄->標案預算->新增災害復建核定預算

標案名稱	埤南重劃區內曹公圳護岸整修工程		
標案編號		工程類別	排水工程
執行單位			
主辦機關	高雄市政府	主管機關	高雄市政府
發包預算		決標金額	
實際開工日期		預付款	(未填)千元

核定預算項目	c52A1-003 永安鄉台17線旁排溝擋土牆修復工程 核定金額:615千元 <small>如不知核定補助之預算項目或查無該項目，請洽縣府災害復建承辦人員</small>		
使用 地方災害準備金數	<input type="text"/>	千元	(填列本標案分配之額度屬地方災害準備金部分，金額大小可洽貴機關會計單位或財主單位)。
使用 中央補助款數	<input type="text"/>	千元	(填列本標案分配之額度屬中央補助款部分，金額大小可洽貴機關會計單位或財主單位)。
本標案使用 預算數	<input type="text"/>	千元	(本欄免填，由上二欄加總)

確定 重填 放棄

1. 填寫[使用地方災害準備金數]及[使用中央補助款數]。

2. 按[確定]儲存，如併案發包之標案可持續新增核定預算項目。

Q & A
