

# 災後復建工程- 登錄標案管理系統操作說明



研究發展考核委員會

108年5月3日

# 法規依據

中央對各級地方  
政府重大天然災  
害救災經費處理  
辦法

臺南市政府辦  
理天然災害緊  
急搶修及復建  
工程作業要點

公共設施災後  
復建工程經費  
審議及執行作  
業要點

# 辦理期限-規劃設計

1,000萬以下

- **開口契約**方式辦理為原則，每年**4月30日前**完成當年度規劃設計開口契約之簽訂
- 未以**開口契約**辦理者，委託規劃設計**勞務採購公告日期**最遲不得逾災害發生後**3個月**

1,000萬  
~5,000萬

- 完成基本設計並審定後，將致災原因檢討、設計書圖及預定完工日期等提報**中央主管機關**審查。

5,000萬以上

- 完成基本設計並審定後，將致災原因檢討、設計書圖及預定完工日期等提報**中央主管機關**審查。

# 完工期限

1,000萬以下

- 災害發生後**8個月**內

1,000萬  
~5,000萬

- 災害發生後**10個月**內完工
- 特殊原因經中央主管機關於審查結果中另行訂定完工期限者

5,000萬以上

- 提報中央主管機關審查，依**核定之完工期限**辦理。

未能依限完工：

依程序申請完工期限展延，並經**工程會**同意外，均予以**註銷**。  
展延申請提報期限以**規定期限屆滿次日起算15個工作天**為限。

# 管理資訊系統登錄

## 公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點-第9點

- 工程主辦機關、直轄市、各縣（市）政府應確實登錄「公共工程標案管理系統」
- 決標後：

達公告金額以上	未達公告金額
三日內 刊登於政府採購公報 資料自動轉入標管系統	三日內 至標管系統 <b>新增</b> 標案



# 自動轉入案件 ( 1/10 )

[回入口](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理資訊系統

<a href="#">標案資料登錄</a>	<a href="#">標案查詢</a>	<a href="#">統計分析</a>
<a href="#">標案執行機關變更</a>	<a href="#">重複標案併案</a>	<a href="#">變更設計併案管理</a>
<a href="#">新增所屬內部單位</a>	<a href="#">專案追蹤列管</a>	<a href="#">對所屬公告訊息</a>
<a href="#">施工查核季報</a>	<a href="#">重大工安事件</a>	<a href="#">全民督工查詢</a>
<a href="#">承攬廠商編號查詢</a>	<a href="#">標案資料鎖定解鎖</a>	<a href="#">使用說明</a>
<a href="#">使用者帳號管理</a>	<a href="#">各機關聯絡人員</a>	<a href="#">廠商帳號審查</a>

您是本系統自90年01月01日起，第 **4822228** 位訪客

# 自動轉入案件 ( 2/10 )

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄

◎可輸入標案**部分**編號查詢

◎或輸入標案名稱**關鍵字**直接查詢

◎如不知道標案編號或名稱，請按下面按鈕進入選單式查詢登錄

◎如要新增標案，請用選單式登錄進入後，確定標案資料未曾建立，點選上方新增標案按鈕即可。



# 自動轉入案件 ( 3/10 )

[回首頁](#)

[回前頁](#)

公共工程標案管理系統->標案資料登錄

92年07月起100萬以上工程類標案資料將自動由招標公告之決標資料轉入，不需新增，如果標案配合專案計畫列管需於預算核定後即開始列管發包狀況，或非屬100萬以上工程類標案主動納入管理時，請按 [新增標案](#) 建立標案基本資料表列之標案如係貴單位發包，決標後將交由下屬單位執行，請將決標相關資料填妥後，以變更執行機關移轉至下屬機關，再由該機關人員繼續登錄後續執行情形資料。  
如要查詢已完工標案或非工程類標案資料可按 [以前年度結案](#) 或 [業務財物標案](#) 查詢  
(下表僅顯示貴機關直接執行之本年度在建工程標案，如要登錄下屬單位執行之標案，請改用下屬單位之密碼)

[重新整理](#)

執行單位：

	標案編號	標案名稱	實際 決標日期	決標金額	實際 開工日期	進度年月	預定進度	實際進度	差異	實 完工
1	1061219-1		107/01/11	3,200	107/01/31	108/03	100.00%	100.00%	0.00%	
2	1061222		107/01/19	3,570	107/02/06	108/03	100.00%	100.00%	0.00%	
3	1070222		107/03/09	5,140	107/03/28	108/03	100.00%	100.00%	0.00%	
4	1070314		107/04/20	1,147	107/04/28	108/03	100.00%	100.00%	0.00%	
5	1070730		107/08/29	1,368	107/09/19	108/03	100.00%	100.00%	0.00%	
6	1070806		107/08/29	15,680	107/10/24	108/03	6.00%	6.00%	0.00%	
7	1070919		107/10/16	10,150	107/10/29	108/03	100.00%	100.00%	0.00%	
8	1071116		107/12/14	2,982	108/01/02	108/03	100.00%	100.00%	0.00%	
9	1071128		107/12/18	1,000	108/01/04	108/03	100.00%	100.00%	0.00%	
10	1071129		107/12/14	1,700	108/02/11	108/04	5.00%	5.00%	0.00%	
11	1071129-1		107/12/25	1,580	108/01/11	108/03	100.00%	100.00%	0.00%	
2	1071210-2	107年8月豪雨 農路災害復建工程	107/12/18	863	107/12/28	108/03	100.00%	100.00%	0.00%	



# 自動轉入案件 ( 4/10 )

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品質人員(C1)	查核督導紀錄(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	承造廠商工地相關人員(C3)	工安事件(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM專技人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	五項指標(D6)
停工狀況(A7)		終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)		施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			匯至他系統(D9)
	工程地理座標圖資編輯(B10)		

1. 告訴系統是哪一個災害

# 自動轉入案件 ( 5/10 )

登錄權限	<input checked="" type="radio"/> 本機關所有帳號密碼 <input type="radio"/> 限本帳號密碼 (登錄權限如選限本帳號密碼時，機關其他帳號將只能查閱而無法登錄資料。)	
標案名稱	107年8月豪雨	農路災害復建工程
專案項目	107年8月豪雨復建工程 非屬專案	
列管狀態	107年9月山竹颱風復建工程 107年8月豪雨復建工程	
工程類別	107年0206地震復建工程 107年0206地震復建工程	
是否統包	<input checked="" type="radio"/> 非屬統包案件	
縣市鄉鎮	106年10月豪雨復建工程 106年7月尼莎及海棠颱風復建工程 106年6月豪雨復建工程 105年11月豪雨復建工程	
施工地點	105年10月豪雨復建工程 105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風復建工程 105年6月豪雨復建工程 105年0206地震復建工程	
歸屬計畫	計畫主辦機關	105年尼伯特颱風復建工程 104年9月杜鵑颱風復建工程 104年8月蘇迪勒颱風復建工程 103年9月鳳凰颱風復建工程
	計畫編號	103年7月麥德姆颱風復建工程 102年天兔及菲特颱風復建工程 102年潭美及康芮颱風復建工程 102年7月蘇力颱風復建工程
	分項編號	
權重(%)	<input type="text"/> (不需輸入%)	
主管機關	(未登錄) ▼ (如選單無該機關名稱時，請至基本資料2，查詢該機關代碼，並填報。)	

# 自動轉入案件 ( 6/10 )

資料登錄		
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C
停工狀況(A7)		終止或解除台
付款狀況(A8)	復建院核定項目(B8)	施工相片(C8)
分包廠商(A9)	復建請撥款情形(B9)	
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)	

2. 告訴系統是哪一件復建工程



# 自動轉入案件 ( 7/10 )

標案名稱	第2件護岸災害復建工程		
標案編號	工程類別	排水工程	
執行單位			
主辦機關	主管機關		
發包預算	決標金額		
實際決標日期			
實際開工日期	預付款	(未填)千元	

行政院核定災害工程項目及內容(要修改請先點選核定編號)

核定編號	工程項目及內容名稱	使用預算來源(千元)		
		地方災害準備金	中央補助款	合計

[新增預算核定項目](#)

# 自動轉入案件 ( 8/10 )

公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄->標案預算->新增災害復建核定預算

標案名稱	等2件護岸災害復建工程		
標案編號	工程類別	排水工程	
執行單位			
主辦機關	主管機關		
發包預算	決標金額		
實際決標日期			
實際開工日期	預付款	(未填)千元	

核定預算項目	1	(請選擇本標案使用經行政院所核定補助之預算項目) 如不知核定補助之預算項目或查無該項目，請洽縣府災害復建承辦人員	下拉選單選取該復建工程
使用地方災害準備金數	<input type="text"/>	千元(填列本標案分配之額度屬地方災害準備金部分，金額大小可洽貴機關會計單位或財主單位)。	並填列經費金額
使用中央補助款數	<input type="text"/>	千元(填列本標案分配之額度屬中央補助款部分，金額大小可洽貴機關會計單位或財主單位)。	
本標案使用預算數	<input type="text"/>	千元(本欄免填，由上二欄加總)	

2

確定

重填

放棄

# 自動轉入案件 ( 9/10 )

公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄->標案預算->新增災害復建核定預算

標案名稱	i61 災害復建工程 核定金額:229千元		
標案編號	工程類別	排水工程	
執行單位			
主辦機關	主管機關		
發包預算	決標金額		
實際決標日期			
實際開工日期	預付款	(未填)千元	

核定預算項目	i61 災害復建工程 核定金額:229千元 <small>如不知核定補助之預算項目或查無該項目，請洽縣府災害復建承辦人員</small>		
使用地方災害準備金數	229	千元	<small>(填列本標案分配之額度屬地方災害準備金部分，金額大小可洽貴機關會計單位或財主單位)。</small>
使用中央補助款數	0	千元	<small>(填列本標案分配之額度屬中央補助款部分，金額大小可洽貴機關會計單位或財主單位)。</small>
本標案使用預算數	229	千元	<small>(本欄免填，由上二欄加總)</small>

確定 重填 放棄



# 自動轉入案件 ( 10/10 )

使用單位：臺南市政府水利局

使用人員：水利局

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄->標案預算核定

標案名稱	2件護岸災害復建工程		
標案編號	工程類別	排水工程	
執行單位			
主辦機關	主管機關		
發包預算	決標金額		
實際決標日期			
實際開工日期	預付款	(未填)千元	

行政院核定災害工程項目及內容(要修改請先點選核定編號)				
核定編號	工程項目及內容名稱	使用預算來源(千元)		
		地方災害準備金	中央補助款	合計
<a href="#">i61A1-001</a>	災害復建工程	229.00	0.00	229.00
<a href="#">i61A1-002</a>	災害復建工程	6,750.00	0.00	6,750.00

新增預算核定項目

復建工程如有**併案發包**者，則於上頁按下確定後，於本頁再按**”新增預算核定項目”**，步驟一樣如前再操作一次

# 自行新增案件 ( 1/4 )

[回入口](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理資訊系統

<a href="#">標案資料登錄</a>	<a href="#">標案查詢</a>	<a href="#">統計分析</a>
<a href="#">標案執行機關變更</a>	<a href="#">重複標案併案</a>	<a href="#">變更設計併案管理</a>
<a href="#">新增所屬內部單位</a>	<a href="#">專案追蹤列管</a>	<a href="#">對所屬公告訊息</a>
<a href="#">施工查核季報</a>	<a href="#">重大工安事件</a>	<a href="#">全民督工查詢</a>
<a href="#">承攬廠商編號查詢</a>	<a href="#">標案資料鎖定解鎖</a>	<a href="#">使用說明</a>
<a href="#">使用者帳號管理</a>	<a href="#">各機關聯絡人員</a>	<a href="#">廠商帳號審查</a>

您是本系統自90年01月01日起，第 **4822228** 位訪客



# 自行新增案件 ( 2/4 )

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄

◎可輸入標案**部分**編號查詢

◎或輸入標案名稱**關鍵字**直接查詢

◎如不知道標案編號或名稱，請按下面按鈕進入選單式查詢登錄

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

◎如要新增標案，請用選單式登錄進入後，確定標案資料未曾建立，點選上方新增標案按鈕即可。



# 自行新增案件 ( 3/4 )

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄

92年7月起100萬以上工程類標案資料將自動由招標公告之決標資料轉入，不需新增，如果標案配合專案計畫列管需於預算核定後即開始列管發包狀況，或非屬100萬以上工程類標案主動納入管理時，請按 **新增標案** 建立標案基本資料表列之標案如係貴單位發包，決標後將交由下屬單位執行，請將決標相關資料填妥後，以變更執行機關移轉至下屬機關，再由該機關人員繼續登錄後續執行情形資料。  
 如要查詢已完工標案或非工程類標案資料可按 [以前年度完工標案](#) 查詢  
 (下表僅顯示貴機關直接執行之本年度在建工程標案，如要登錄下屬單位執行之標案，請改用下屬單位之密碼)

下一頁

[重新整理](#)

單位：千元

執行單位：臺南市政府水利局

標案編號	標案名稱	實際決標日期	決標金額	實際開工日期	進度年月	預定進度	實際進度	差異	實際完工日期	驗收完成日期
1 09911D0002827		099/12/21	32,320	100/01/02	101/11	85.00%	85.00%	0.00%		
2 1000121355		100/06/08	91,134	100/07/03	101/12	97.41%	99.67%	2.26%		
3 1000199904		100/05/11	30,258	100/06/14	101/11	97.10%	96.04%	-1.06%		
4 1000348133		100/08/09	111,040	100/09/12	101/12	77.83%	78.31%	0.48%		
5 1000553030		100/11/15	93,826	100/12/22	101/12	23.89%	24.06%	0.17%		
6 1000553218		100/10/13	98,800	100/11/14	101/12	16.00%	17.45%	1.45%		

# 自行新增案件 ( 4/4 )

[回首頁](#)[回前頁](#)

公共工程標案管理資訊系統-&gt;標案資料登錄-&gt;新增標案基本資料

- ◎如要新增標案，請先以標案查詢輸入名稱關鍵字，查明是否先前有該標案資料，或已由上級單位建立完成，以免重複填報。
- ◎如標案已由上級單位建立完成，可請上級機關將填報之資料用執行機關變更方式移轉標案資料即可。
- ◎系統不提供刪除標案之功能，新增時請注意不要重複。
- ◎一百萬以上標案如決標前即以本功能新增，決標後刊登政府採購公報之標案編號與本案編號應力求一致，以免轉入時標案重複。

執行機關：臺南市政府水利局

標案編號 \*

(若編號內含中文或夾雜空白字元，將造成後續網頁無法連結)

標案名稱 \*

工程類別 \*

發包預算

 千元 (半形數字，不用輸入逗號)

預定公告日期

102 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日

預定決標日期

(請選擇) 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日

實際決標日期

(請選擇) 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日

實際完工日期

(請選擇) 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日

施作地點 \*

(施作地點為單一鄉鎮時，選鄉鎮，如跨鄉鎮則選縣市，如跨縣市則選北中南區或台灣全區)

主管機關

主辦機關

完成後再依前述自動轉入案件步驟  
填寫相關資料

# 多目標智慧管理系統操作說明





# 填報時間：

## (A) 規劃設計階段(決標前)：


1. 每月5日前-至多目標智慧管理系統填報。


## (B) 決標後且鍵入標案案號：

1. 每月5日前-至標案管理系統**詳細填報**。  
(4、6、10日由標管系統匯入多目標智慧管理系統)
2. 10日後需更新資料或**檢討會議前3日**-  
至多目標智慧管理系統更新內容。

**注意**

- 基本資料有填標案案號，就帶入標管系統資料(不用重覆填)
- **中央列管案強制填列標案案號，以作勾稽!**

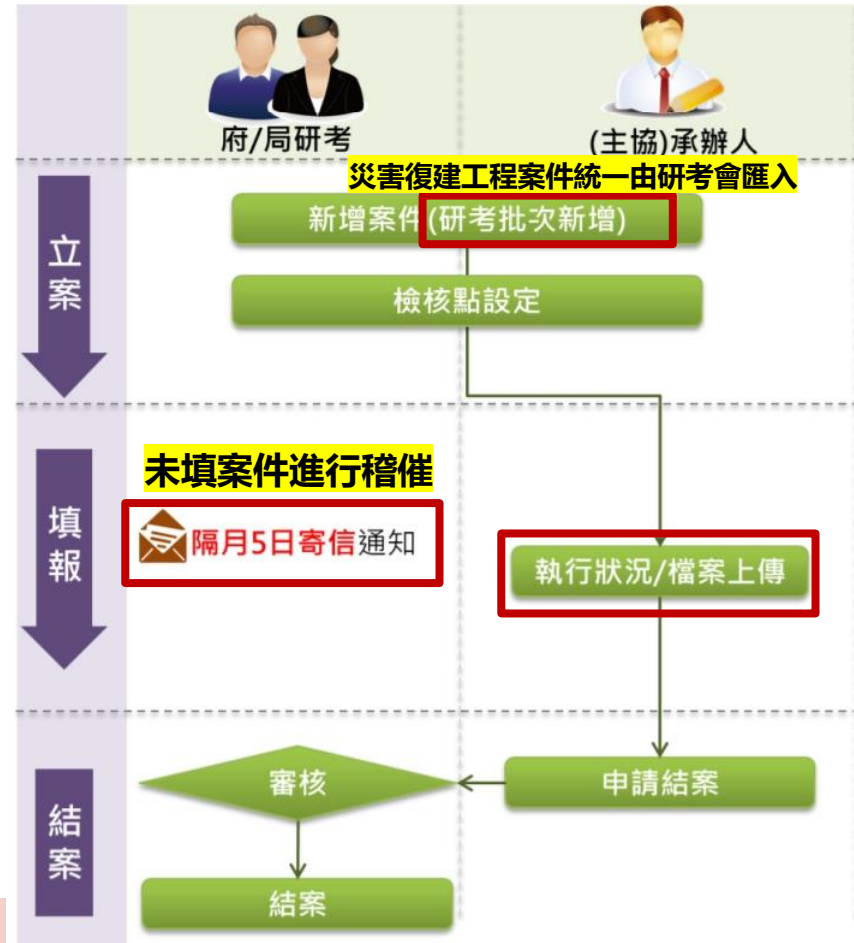



# 操作步驟說明

# 登入方式

由公務入口網登入帳密後，下拉點選“多目標智慧管理系統”

或直接由網址<http://se.tainan.gov.tw/TNNCMS/Account/Logout>登入

The image shows a grid of service links on the left and a login form on the right. A red arrow points from the 'Multi-Target Smart Management System' link in the grid to the login form.

<b>線上即時服務系統</b> 追蹤管理市民陳情、申訴等案件辦理並提供回復作業。	<b>公務電子郵件</b> 臺南市政府統一公務電子郵件。提供200MB容量。 pop3伺服器為pop3.tainan.gov.tw。 smtp伺服器為smtp.tainan.gov.tw。
<b>公文管理系統 (過渡版)</b> * 本系統僅適用於府本部公務同仁。 * 本系統尚未與單一簽入整合，請同仁至該系統首頁時，使用原來的公文系統帳號 (密碼預設為0000) 進行登入。	<b>機關網站共通平台</b> 臺南市政府全球資訊網管理平台。 * 本系統尚未與單一簽入整合完畢，請各同仁至該平台行登入。
<b>線上申辦系統</b> 線上申辦系統後台作業。	<b>人力中心培訓管理系統</b> 人力中心培訓管理系統\學員服務\課程報名。
<b>多目標智慧管理系統</b> 多目標智慧管理系統	

**台南市 多目標智慧管理系統**

府內人員 ▾

請輸入帳號

請輸入密碼

登入

**進入系統畫面**

© 2018 Tainan City All rights reserved.  
中心 70801臺南市安平區永華路二段6號



## 1 點選工程管理→填報管理

專案管理

工程管理

填報管理

工程結案審核

執行情形報表

工程綜合查詢

復建工程管控表

地圖管理

決策管理

工程區域 全部

主辦機關 全部

工程狀態 全部

主管機關 全部

發包預算 全部 發包預算 災後復建工程

工程名稱 工程名稱

查詢 新增

工程狀態：開工前：● 停工中：● 施工中：● 完工：●

序號	區域	主辦機關	工程名稱	工程狀態	填報資訊	列管狀態	檢視	功能
1	學甲區	學甲區公所	學甲區中洲里中洲中排5號水門旁護岸災修工程	●	未填報	解除列管	未檢視	編輯
2	將軍區	將軍區公所	103年度將軍區鯤鯓里滬汪排水南側提案復建工程	●	未填報	解除列管	未檢視	編輯

# 查詢頁面-2

專案管理

工程管理

填報管理

工程結案審核

執行情形報表

工程綜合查詢

復建工程管控表

地圖管理

決策管理

工程區域 全部

主辦機關 全部

工程狀態 全部

主管機關 全部

發包預算 全部 發包預算 災後復建工程

107年8月豪雨災後復建工程

工程名稱 工程名稱

查詢 新增

工程狀態：開工前：● 停工中：● 施工中：● 完工：●

**所有隸屬案件陳列如下**

序號	區域	主辦機關	工程名稱	工程狀態	填報資訊	列管狀態	檢視	功能
1	下營區	下營區公所	107年8月豪雨下營區大埤中排災後復建工程	●	未填報	列管中	未檢視	編輯
2	下營區	下營區公所	107年8月豪雨下營區北頂中排災後復建工程	●	未填報	列管中	未檢視	編輯
3	山上區	山上區公所	107年度8月豪雨山上區山上排水南140上游護岸崩塌災害復建工程	●	未填報	列管中	未檢視	編輯
4	山上區	山上區公所	107年度8月豪雨山上區山上排水嘉荖橋災害復建工程	●	未填報	列管中	未檢視	編輯
10	六甲區	六甲區公所	107年8月豪雨六甲區麻寮中排二災害復建工程	●	未填報	列管中	未檢視	編輯

總件數確認是否相符 10筆共 70筆

權限說明：

局研考機關：顯示轄下案件。

主辦機關：顯示被設定為主辦機關案件。

# 基本資料-1

第一次請先檢視基本資料是否正確!並填列相關內容

- 基本資料
- 檢核點設定
- 執行狀況
- 檔案上傳

列管層級	<input checked="" type="radio"/> 府列管 <input type="radio"/> 局列管		
標案案號	<input type="text"/>	※工程類別	[A1]水利工程
※年度	107		
※工程名稱	107年8月豪雨下營區大埤中排災後復建工程		
工程屬性	<input checked="" type="checkbox"/> 災後復建工程 107年8月豪雨災後復建工程	核定序號:	001 註銷: <input type="checkbox"/> 是
完工期限:	108/04/25		
工期類別	--請選擇--	工期	75 天
※計畫期程	107/12/01 ~ 108/04/25		
※工程區域	下營區		
座標 (WGS84)	經度: <input type="text"/> 緯度: <input type="text"/>		
※主管機關	水利局	--請選擇--	--請選擇--
※主辦機關	下營區公所	--請選擇--	--請選擇--
申請文號	<input type="text"/>	核定文號	<input type="text"/>

決標後,  
1.中央列管案: 必填!  
2.府災準金列管案: 有填案號→從標管系統匯入每月執行狀況(無須重覆填)  
沒有案號→來本系統填執行狀況

1.局研考或公所研考, 可看見所有案件。  
2."主辦機關"需設定到承辦人名字, 才看的到案件及填報。(局研考或公所研考需協助設定至承辦人。)



# 基本資料-2

中央機關 單位：  **依工程類別代碼對應填列!**

預算來源 年度預算：  預算來源：  預算別：  經費(千元)：

**新增** **填列審議經費(已預設自動匯入)**

項次	年度預算	預算來源	預算別	金額(單位：千元)
1	107	本府預算	公務預算	2,195
				合計：2,195

◀ 1 ▶

中央主管機關	所屬工程機關	代碼
經濟部	水利署	A1
交通部	觀光局	B1
交通部	公路總局	C1
內政部	營建署	C2
		D1
		E1
行政院農業委員會	水土保持局	G1
	農田水利處	H1
	漁業署	H2
	水土保持局	H3
	漁業署	K1
教育部		L1
行政院環境保護署		M1

計畫總經費

發包預算  (千元) **決標後，請填入工程發包預算及決標金額**

決標金額  (千元)

決算金額  (千元)

摘要說明 (或效益)

# 檢核點設定

檢視各檢核點日期，如已送出後仍需修正期程者，請洽研考會。

基本資料

檢核點設定

執行狀況

檔案上傳

標案年度	107	案號	
工程名稱	107年8月豪雨下營區大埤中排災後復建工程		

預定辦理情形	檢核日期
委託規劃設計	<input type="text" value="檢核日期"/> 
完成規劃設計	<input type="text" value="107/12/28"/> 
決標	<input type="text" value="108/03/21"/> 
開工	<input type="text" value="檢核日期"/> 
完工	<input type="text" value="107/04/25"/> 
驗收	<input type="text" value="檢核日期"/> 
決算結案	<input type="text" value="檢核日期"/> 

送出後，即將檢核點日期帶至執行狀況頁。

儲存僅為暫存，需按送出才確實可存檔。

儲存

取消

送出

# 執行狀況-1

基本資料

檢核點設定

執行狀況

檔案上傳

年度	107	案號
工程名稱	107年8月豪雨下營區大埤中排災後復建工程	

有填標案案號者，一樣會由標案管理系統匯入資料(免重覆填報)

進度分類	規劃設計	說明：當填寫「實際完成日期」，工程狀態會「自動」選擇對應的狀態，但是如果遇到「停工」時，請手動調整工程狀態至「停工中」，如果「復工」時也必須手動調整為「施工中」選項。
------	------	---

預定辦理情形	檢核日期	實際完成日期
委託規劃設計		實際完成日期
完成規劃設計	107/12/28	107/12/07
決標	108/03/21	實際完成日期
開工		實際完成日期
完工	107/04/25	實際完成日期
驗收		實際完成日期
決算結案		實際完成日期

填列各階段實際完成日期



# 執行狀況-2

結案申請 送出

**如已填列實際完工日期了，才可按結案申請送出，申請解除列管。**

期間	108年3月		
工程進度	累計工程預定進度：	<input type="text"/> %	累計工程實際進度：
		<input type="text"/> %	進度差異：%
本年度可支用預算數	<input type="text"/> 元	<b>若已填寫「實際開工日期」，則必填工程進度(%)</b>	
本年度累計預算分配數	<input type="text"/> 元		
本年度累計執行情形	<input type="text"/> 元		
※辦理情形	<p>與A1-002併案，107.12.07完成設計，1/3上網公告，1/15第1次流標，1/29第2次開標廢標，撤下重新檢討中，2/27重新上網公告，3/12流標，3/21開標。</p> <p style="text-align: right;"><b>請詳細填報辦理歷程資料</b></p>		
	複製上期辦理情形		
落後類別	---請選擇---		
落後原因	<p><b>A.累計工程實際進度(%)小於累計工程預定進度(%)</b></p> <p><b>B.倘逾各管控點預定期程仍未完成該階段作業等情形</b></p> <p><b>→強制填列落後原因及改進措施!</b></p>		
	※字數限制300字。		
改善措施	<p> </p> <p> </p>		
	※字數限制300字。		
備註	<p> </p> <p> </p>		

工程案件已勾稽工程會標案管理系統，務必於標案管理系統確實詳填。

每月 26 日起開放填報下月辦理情形，並紀錄該工程「每月填報歷程」。

儲存

取消

## 每月填報歷程

年度月份	辦理情形	預定進度 (開工後累計)	實際進度 (開工後累計)	落後原因	改善措施	填寫人員及時間
107/12	與A1-002併案，預算書圖審查中	null	null			null null 2019/01/01 00:00
108/2	與A1-002併案，107.12.07完成設計，1/3上網公告，1/15第1次流標，1/29第2次開標廢標，撤下重新檢討中，2/27重新上網公告，3/12開標。	null	null			助理員 洪婉瑜 2019/03/25 14:52



# 再次強調~

**規劃設計階段(決標前)** → 至多目標智慧管理系統填報。

府列管(本府災準金) → 100萬以上：於本系統填標案案號，每月自動帶入標案管理系統執行情形  
→ 100萬以下：於本系統每月填“執行狀況”

**決標後** →

中央列管 → 無論金額大小均登錄標案管理系統，於本系統填標案案號，每月自動帶入。

**檢討會議前3日** - 所有案件請至多目標智慧管理系統更新內容，以利彙整開會資料。





# 宣達事項


# 107年8月豪雨執行情形(1/2)

資料統計截至4月17日止

核定	審查經費 (千元)	註銷	規劃設計進度		工程進度					
			設計中	已完成	未發包	發包	發包率	未完工	完工	完工率
<b>272</b>	765,307	3	3	266	<b>43</b>	226	84.01 %	211	58	21.56 %

主管機關	核定案	經費(千元)	權管自辦		委託區公所辦理	
			件數	經費(%)	件數	經費(%)
<b>農業局</b>	122	257,525	18	13.84	<b>104</b>	86.16
<b>水利局</b>	68	301,570	8	30.59	<b>60</b>	69.41
<b>工務局</b>	64	157,003	7	41.01	<b>57</b>	58.99
教育局	10	35,641	10	100	0	0
地政局	4	2,106	0	0	4	100
環保局	2	6,500	2	100	0	0
觀光旅遊局	2	4,962	2	100	0	0

資料統計截至4月17日止

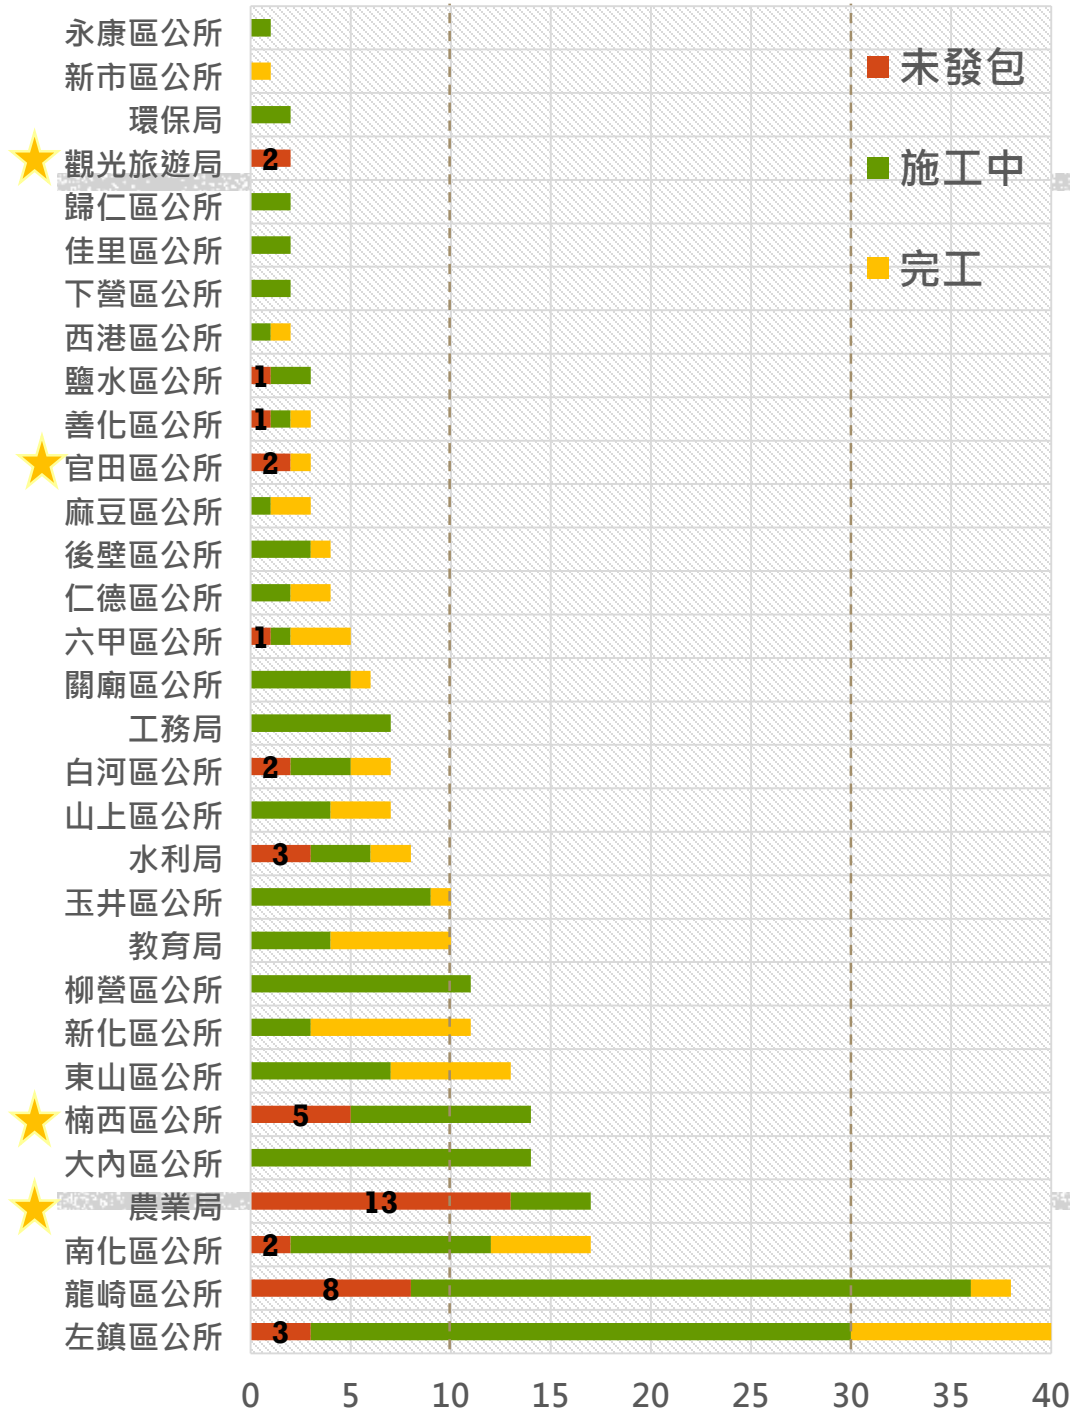

# 107年8月 豪雨執行 情形(2/2)



# 務實檢討流標因素

行政院公共工程委員會於108年4月26日召開精進災後復建工程專案平台第9次會議，提醒：

1. 工區偏遠：就災損處提報經費時，應考量工區實際情況，並就**當地單價**作為預算匡列之標準參考。
2. 各項材料**市價**及**供應量**應掌握確實。
3. 執行機關應務實審查設計內容、規格及工法等是否可行，核定預算內是否可完成。
4. 針對設計單位之工程標案流廢標情形，建議可納入評選項目之一，以挑選優良廠商，加強開口契約勞務廠商品質。
5. 工程尚有涉及跨機關協調事項，建議採工程督導會報或協調會等方式進行整合確認，避免行政失調。

*You've been generous.*

**THANK YOU.**



®
