

# 目錄

一.課程表 .....	1
二.QR Code 簡報下載 .....	2
三.重大天然災害緊急搶修及復建工程機制介紹 .....	3
四.復建工程規劃設計與案例探討 .....	29
五.活動照片 .....	57



# 臺南市政府109年度

## 公共設施災後復建工程執行暨技術講習會

109 / 08.28(五)

地點:臺南消防訓練中心(臺南市永華路2段206號)

時間	課程內容	主持人或講師
08:00~08:30		報到
08:30~08:40	長官致詞	臺南市政府 災害防救辦公室 執行秘書 侯俊彥 參事
08:40~09:30	重大天然災害緊急搶修及 復建工程機制	臺南市政府 災害防救辦公室 薛玉珩
09:30~09:40		休息
09:40~12:10	復建工程規設與案例探討	台灣世曦工程 顧問股份有限公司 吳文隆 副總工程師
12:10~12:30	交換意見	臺南市政府 災害防救辦公室 執行秘書 侯俊彥 參事
12:30		賦歸



台南防災大特寫



# 臺南市政府109年度

# 公共設施災後復建工程執行暨技術講習會

108年8月28日簡報 QR Code 下載



# 重大天然災害緊急搶修及 復建工程機制 介紹

臺南市政府災害防救辦公室109年8月28日

## 內容

- 一、中央法規依據
- 二、災後復建工程
- 三、搶險搶修及其他應變措施
- 四、注意事項

## 災害防救法 第43-1條

直轄市、縣（市）政府無法支應重大天然災害之災後復原重建工程，前項所定補助之時機、要件、基準、請求程序及其他相關事項。

復原重建2大部分：

- 搶險搶修及其他應變措施
- 復建工程

## 中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法

第 1 條 本辦法依災害防救法第四十三條之一第二項規定訂定之。

## 中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則

第 1 條 本審查原則依中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法(以下簡稱處理辦法)第十條第三項規定訂定之。

## 公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點

第 1 條 為執行中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法（以下簡稱經費處理辦法）第九條第二項之規定，特訂定本要點。

## 二、災後復建工程

### 第五條：


各級地方政府經依前條規定，以動支災害準備金，或本移緩濟急原則調整年度預算，辦理各項災害救助、緊急搶救及復建等所需經費後，**尚不足**支應重大天然災害所需經費時，得就不足經費部分，報請中央政府主管機關或**行政院**協助。

### 第六條

直轄市或縣（市）政府依前條規定報請行政院協助時，應依下列程序辦理：...  
二、直轄市或縣（市）政府應指定單位為**單一聯絡窗口**，將**當次災害復建經費總需求**與依第四條規定動支災害準備金及調整年度預算移緩濟急之情形，依規定表格格式查填並彙總完成相關資料，於**規定期限內函報行政院**.....前項第二款所定之表格格式及函報期限，由**行政院公共工程委員會**另定之

工程類別	代碼	中央機關	工程類別	代碼	中央機關
水利工程	A 1	水利署	水土保持工程	G 1	水保局
觀光工程	B 1	觀光局	農地重劃區農水路工程	H 1	農田水利處
公路系統工程	C 1	公路總局	養殖漁業專區農水路工程	H2	漁業署
市區村里連絡道路橋梁工程	C 2	營建署	其他農路工程	H3	水保局
建築工程	D 1	營建署	漁港工程	K1	漁業署
下水道工程	E 1		學校工程	L1	教育部
共同管道工程	F 1		環保工程	M1	環保署
			文化資產工程	P1	文化部


人員屬性	機關	應辦事項
地方提報人員	公所、學校、其他縣轄機關	<b>新增</b> 復建工程案件， <b>提送</b> 至縣市政府業管人員。
縣市政府業管人員	縣市政府	<b>複查並修正</b> 地方提報人員所送之復建工程案件資料，亦可 <b>新增</b> 案件。
縣市政府業管管理員	縣市政府	確認該工程類別提報資料內容無誤， <b>排定優先順序</b> 後，整批 <b>提送</b> 至縣市政府管理人員。
縣市政府管理人員	縣市政府	確認收到各工程類別業管管理員提送之復建工程案件資料後，整批 <b>提送</b> 至中央機關業管人員。（無案件編輯權）

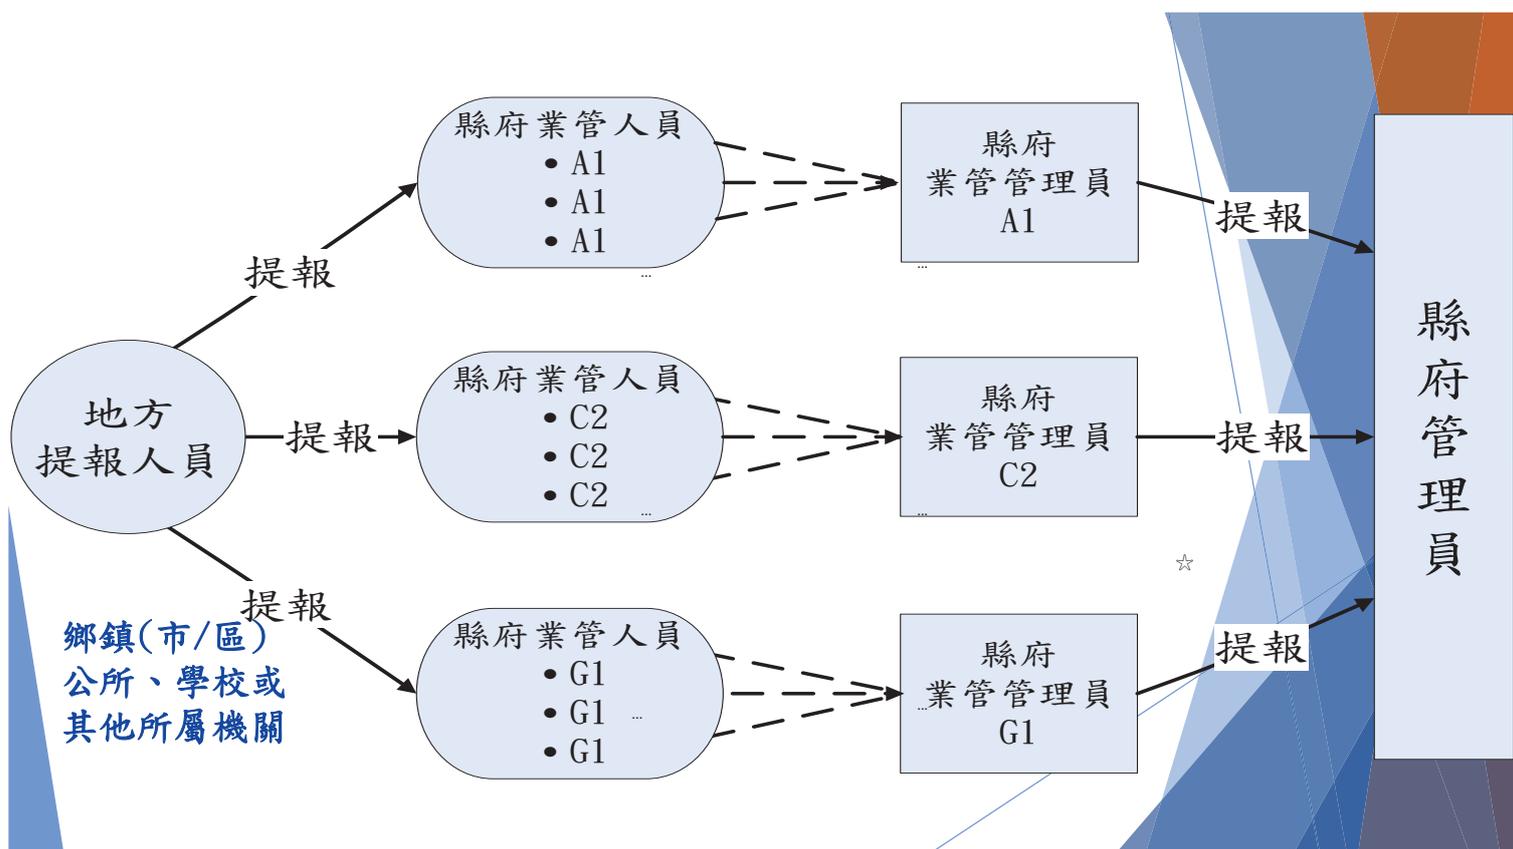

## 二、何謂天然災害？

災害防救法第2條第1款第1目：

風災、水災、震災（含土壤液化）、旱災、寒害、土石流災害、火山災害等。

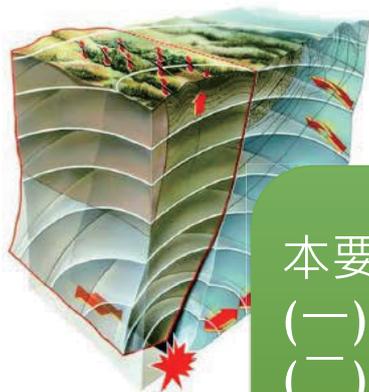

本要點所稱災害發生後之起算日如下：

- (一) 本市各種災害應變中心通報解除開設當日
- (二) 中央氣象局解除豪雨特報或土石流警戒區當日
- (三) 其他災害依照相關業務主管機關通報解除當日

# 地方政府向**行政院**請求協助復建工程經費 公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點

啟動

• 工程會發函啟動地方公共設施復建專案

提報

• 縣市政府1個月內**得分批**提報復建經費需求

審議

• 工程會及中央審議作業主管機關辦理**現勘**審查

核列

• 召開專案會議確認復建內容及所需經費

執行

• 確認後據以辦理規劃設計、發包施工

6

## 公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點

第三點：

下列工程或項目**不屬**本要點適用之範圍，應由各級地方政府依災害防救法、經費處理辦法及其他相關規定，或循年度預算程序辦理：

- (一) 災害消防、防汛、搶險、搶修等**緊急搶救**措施。
- (二) 土方清除、疏濬、**機具設備**、用地、拆遷補償等非工程項目，與僅具宣傳、景觀功能之設施及植栽。
- (三) 無具體保護對象或**非屬公眾**使用之設施。
- (四) 因**年久失修**等**非天然災害**造成之損失案件。
- (五) 道路工程中路樹、路燈、**反射鏡**及交通號誌等涉及交通安全，**須於災後立即施作**之措施。但須與復建工程一併施作者，得適用本要點而併入復建工程施作。
- (六) 經費處理辦法第二十條所定各級地方政府所屬**公共造產**或所經營具有經濟價值之事業。

前項第二款所稱機具設備，指得與主體結構分離而不須一併施工，於建築工程中非屬電氣、給排水、消防、瓦斯、空調、電梯等之設備。

# 一、善用資訊系統，提升行政效率

行政院公共工程委員會  
 災後復建工程經費審議及執行資訊系統

註冊 | 變更密碼 | 加入我的最愛 | 瀏覽人數：222905  
 待審核，歡迎。登出

最新公告 | 參考資料 | 查詢統計 | 災後復建

請選擇颱風：101年6月泰利颱風


篩選條件：  
 工程類別：全部 | 復建經費：全部  
 機關名稱：南投縣政府 | 鄉(鎮市)：全部 | 狀態：全部  
 工程名稱：  
 經審議後建議變更類別之案件

<https://recovery.pcc.gov.tw/>

執行狀態顏色說明：未送出 | 申請中 | 退回 | 已核可

機關名稱	工程代碼	核定序號	復建工程名稱	災害地點		經費	執行狀態	工程狀況
				鄉(鎮市)	村(里)			
南投縣政府	A1	001	埔里鎮史港坑排水護岸復建工程	埔里鎮	廣成里	1,231		已完工
南投縣政府	A1	002	埔里鎮枇杷城排水窰堰下游護岸復建工程	埔里鎮	清新里	6,520	完工期限展延	未完工
南投縣政府	A1	003	埔里鎮綠米里綠米坑排水護岸復建工程	埔里鎮	綠米里	1,935	完工期限展延	逾期未

# 二、落實各階段作業，加速復原重建

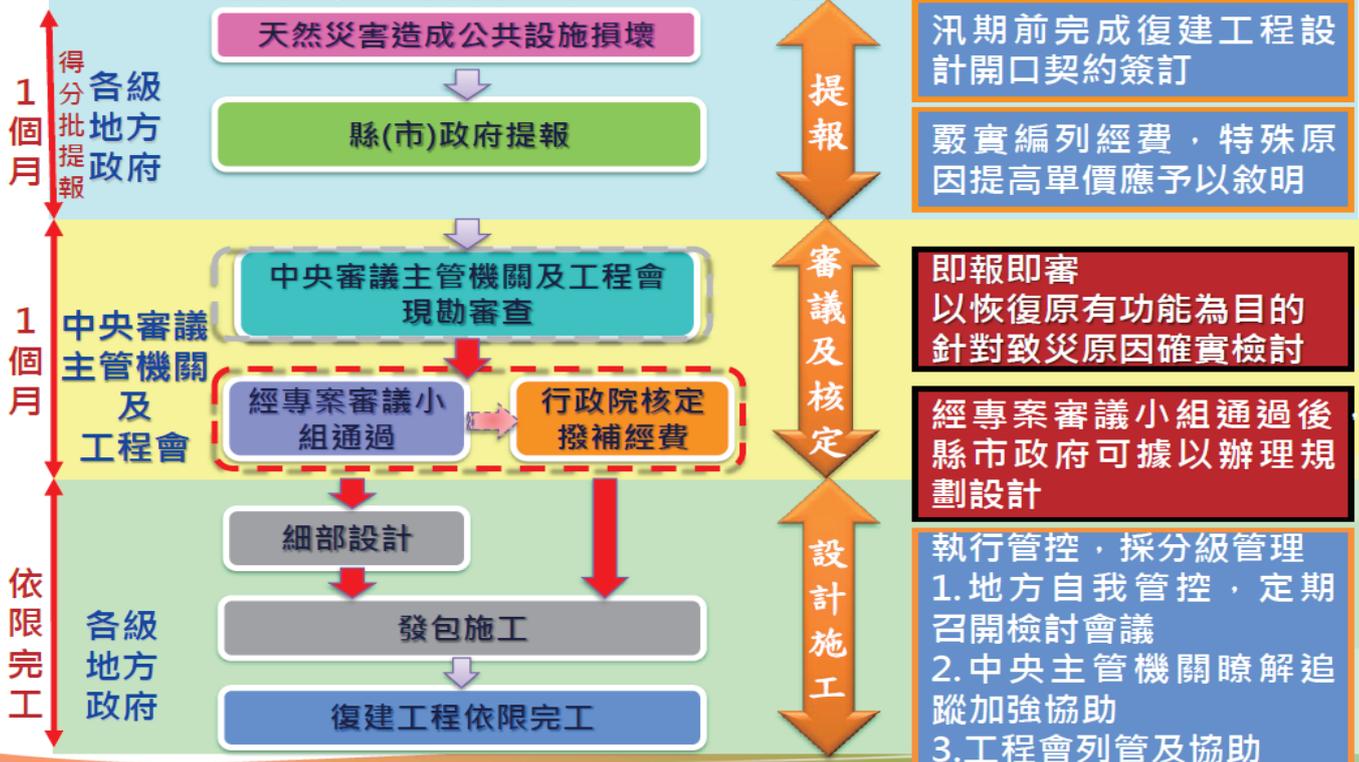

## 臺南市政府辦理天然災害緊急搶救及復建工程作業要點

### 三、搶險、搶修及復建工程查報複勘作業：

- (一) 本市各類公共設施因災害致遭受毀損，需辦理搶險、搶修及復建工程者，各業務主管機關(以下簡稱主管機關)及區公所應於災害發生後，立即進行全面性之調查及初勘工作並應立即拍照存證做成紀錄。
- (二) 復建工程得聘請專業技師參與，同時提供符合現地需求之工法及經費概算，並於災害發生後七天內完成該項工作，提報主管機關彙整。
- (三) 主管機關彙整區公所提報各類災害發生地點之初勘表後，應於二天內排定複勘行程，十二天內完成複勘，後續各類工程須中央機關複勘者，由主管機關負責聯繫辦理。
- (五) 主管機關辦理搶險、搶修及復建工程業務，應指定業務主辦人員為聯繫窗口，並將名單函報災防辦公室登錄列冊。人員異動時亦同

## 臺南市政府辦理天然災害緊急搶救及復建工程作業要點

### 五、復建工程審查作業：

- (一) 主管機關辦理複勘後將評定損害層級資料，於期限內送交災防辦公室。
- (二) 災防辦公室接獲損害層級資料後，得視災害規模辦理審查或於三天內陳請秘書長召開災害預算分配會議，評定復建工程損害層級及金額，主管機關應指派副首長層級以上人員出席。
- (三) 復建工程損害金額，經審查或評定後，本府災害準備金足夠支應時，由災防辦公室簽奉動支災害準備金；不足支應時，於規定期限內報請中央主管機關或行政院協助。
- (四) 災害復建工程屬局部性、區域性致災個案，由主管機關辦理複勘審查後，於災後一個月內簽奉動支災害準備金。

## 一、大規模崩塌災區先核定規劃費，再續核定復建經費。



104年8月蘇迪勒颱風某縣市提報道路復建工程約1.73億元

(一)因崩塌面積甚廣，先核列180萬元辦理地質調查及鑽探等可行性研究及規劃工作，以評估出最佳復建方案。另核列784萬元辦理崩坍坡面簡易水保先採便道恢復通行。

(二)縣府105年9月提出復建工程方案，同意再另增加8,057萬餘元。



## 二、災情未能於短期內全盤掌握者，先核定調查費，再續核定復建經費。

107年0206地震某縣政府提報污水下水道管線災後復建工程7億元

(一)因災區範圍大、管線長度長、設備不足等因素先核列：

1. 災損明確之450m立即修復，經費900萬元。
2. 辦理長度70公里地下管線TV檢測，經費3,150萬元，瞭解實際損壞情形。

(二)縣府107年12月完成TV檢測報告，因無受損，無須再增列復建經費。






一、復建工程目的：盡速恢復原有功能，避免重複致災

二、復建工程提報

- ✓ 掌握提報時效
- ✓ 瞭解周遭環境
- ✓ 找出致災原因
- ✓ 提出合宜工法
- ✓ 覈實編列經費

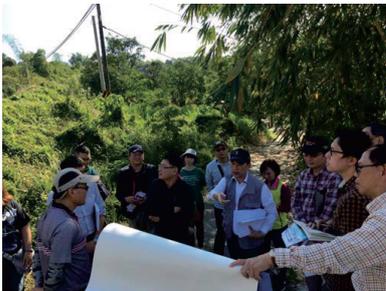

## 左鎮區澄山里南171-1線 2K+300崩塌災害復建工程

- 核定95萬元辦理工程地質調查、分析及初步規劃與可行性評估
- 107年搶險搶修250萬元，108年搶險搶修費用420萬元，目前上邊坡裸露，108年核定90萬元施作上邊坡簡易排水工程
- 108年12月6日經費申請，108年12月18日行政院公共工程委員會現勘，109年1月13日工務局召開修正審查會議，2月20日修正函報工程會，4月8日核列3800萬元

本案災後復建工程與搶險搶修同時並行


本案公所能量有限，宜慎選規劃設計廠商，確實依致災原因給予適當工法




## 107年度8月豪雨 左鎮區澄山里三 崁農路(光山道路 端)災害復建工程 重複致災

- 109年3月份完成驗收。
- 109年8月6日本辦公室會同農業局及左鎮區公所現地勘查，因109年8月哈格比颱風造成新設道路下方排水溝嚴重掏空，故需施作懸臂式擋土牆及CLSM回填。

## 100~108年 復建工程經費

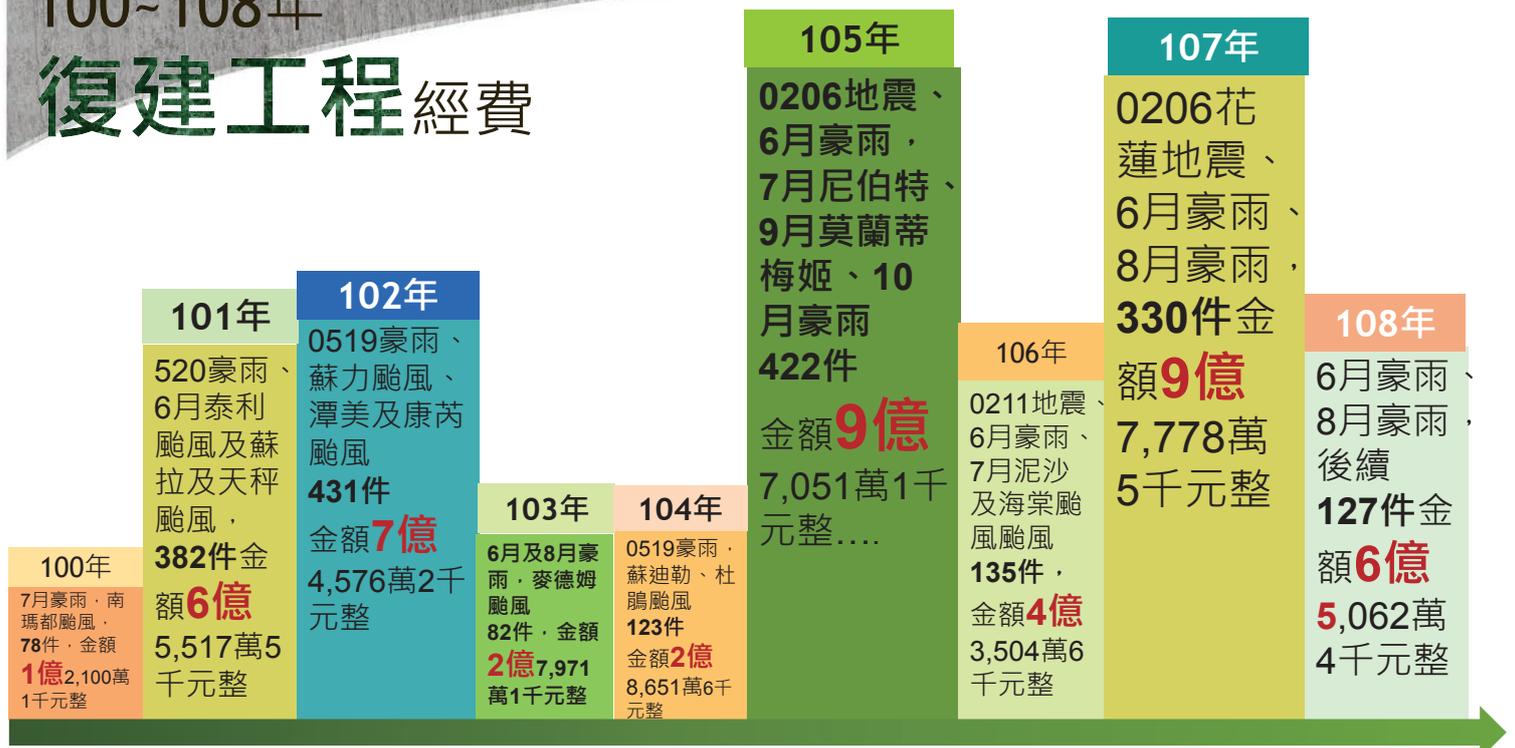

# 100~108年 搶險搶修經費

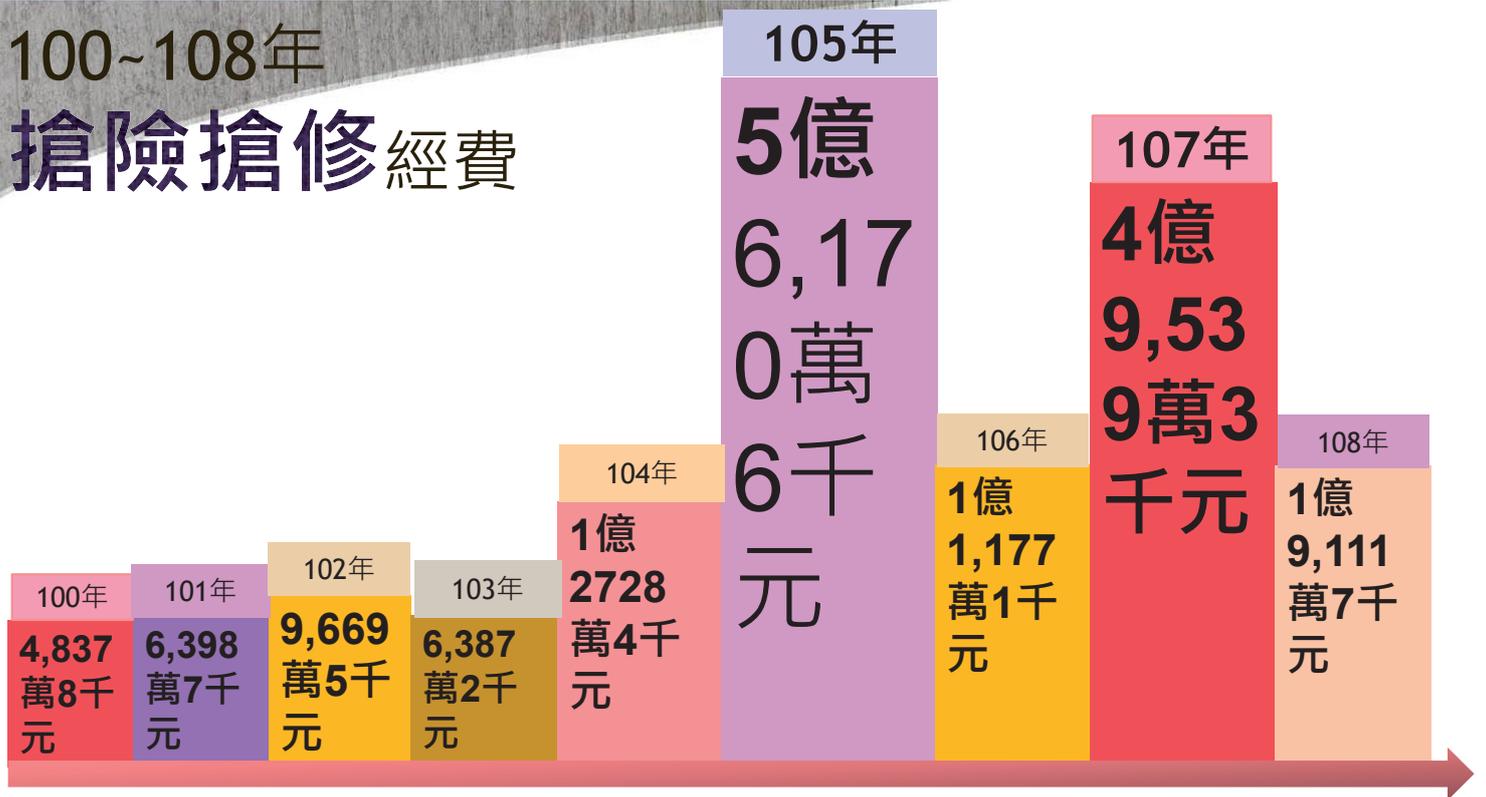

## 三、搶險搶修及其他應變措施

三、**搶險**：指各級地方政府於災害發生期間或發生後，所辦理之下列各項措施：

- (一)災害發生期間，公共設施已發生險象或局部損害，如出現滲漏、滑坡、坍塌、裂縫或淘刷等，對公共設施所作緊急封堵、強固或救險，以避免損害發生或擴大之臨時權宜措施。
- (二)災害現場危險建築物、工作物之拆除及對公共設施有危害之障礙物或漂流物之移除。
- (三)土石不運離河川並置於不影響水流處之疏導水路，以避免洪水阻塞不通或沖擊村落等情形之措施。

四、**搶修**：指各級地方政府於災害發生期間或發生後，所辦理之下列各項措施：

- (一)對局部遭受損害之公共設施，**於非全面之復原重建下**，進行緊急修復，避免損害再次發生或持續擴大。
- (二)對外聯絡道路遭阻斷之搶通或修築便道、便橋之措施。
- (三)對災後臨時維生管線之緊急修築。
- (四)將嚴重影響居民及河防安全之河道加以疏通，並將土石運離河川使洪水暢洩不造成災害之措施。

### 第三條：

各級地方政府應依下列規定，於年度預算中編列一定數額或比率之災害準備金或相同性質之經費：

一、直轄市政府及準用直轄市規定之縣之縣政府：編列之災害準備金（含相同性質之經費）不得低於當年度總預算歲出預算總額**百分之**一。

### 第四條：

各級地方政府為辦理各項災害救助、緊急搶救及復建工程，應就所需經費**建立書面及派員現勘等審查機制**，並依審查結果動支災害準備金，或依災害防救法第四十三條第二項與災害防救法施行細則第十九條規定，本移緩濟急原則，調整年度預算支應。

## 災後復建工程

## 與 搶險修險

## 區別

1. 復建：指災害發生後，為復原重建公共設施，以恢復其原有功能，所作之處理措施
2. 災後**7天**提報業務機關**12天**業務機關送災防辦公室彙整
3. 災後**一個月**內提報行政院
4. 工程**複雜**、金額較多，**未具緊急**者提報災後復建工程

1. 緊急封堵、強固或救險，以避免損害發生或擴大之臨時權宜措施、危險建物、工作物拆除及對公共設施有危害之障礙物或漂流物之移除
2. 具有時效**急迫性**，**工程簡易、易致災、復建經費較少(10多萬元以內)**等，建議以開口契約搶險搶修急迫性者以緊急採購辦理，例：維冠大樓拆除，南瀛天文台

# 復建工程及搶修險案例

## 災後復建工程

105年9月莫蘭蒂颱風南區臺南市體育園區復建工程核定858萬9千元

## 搶險搶修

105年0206地震大內區南瀛天文台 1,100萬元



- 中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則第三點：  
中央對各級地方政府動支災害準備金之認列，除經行政院專發生之天然災害所需相關救災經費為限，其支用範圍如下：
- (一) 依災害防救法第四十八條所定各項災害救助種類及標核發之各項天然**災害救助金**。
  - (二) 災區各項**緊急搶救**所需相關費用
  - (三) 搭建安置災民臨時收容所或其他**安置**場所相關費用。
  - (四) 購置災民緊急**救濟**必需物資等費用。
  - (五) 購置或租賃緊急**救災**工作必需物品、器材或設備等費
  - (六) 災區或消毒等相關費用。
  - (七) 災區復建經費**環境清理**。

救災客車 搶險搶修

臺南市政府 000 年 00 災害準備金需求表<sup>(1)</sup>

需求機關：.....局(處、區公所).....

項目	說明(請勾選項目) <sup>(2)</sup>	需求金額 單位(千元) <sup>(3)</sup>	備註： <sup>(4)</sup> 請說明重要項目及預算計算 方式，如表末無法說明，請 補充圖表或圖說說明 <sup>(5)</sup>
災 害 門 項	<input type="checkbox"/> 依災害防救法第四十八條所定各項災害救助種類及標準規定，應由政府按一定標準核發之各項天然災害救助金 <sup>(6)</sup>		
	<input type="checkbox"/> 災區各項緊急搶救所需相關費用 <sup>(7)</sup>		
	<input type="checkbox"/> 搭建安置災民臨時收容所或其他安置場所相關費用 <sup>(8)</sup>		
	<input type="checkbox"/> 購置災民緊急救濟必需物資等費用 <sup>(9)</sup>		
	<input type="checkbox"/> 購置或租賃緊急救災工作必需物品、器材或設備等費用 <sup>(10)</sup>		
	<input type="checkbox"/> 災區環境清理或消毒等相關費用 <sup>(11)</sup>		
小計 <sup>(12)</sup>			
救 災 門 項	<input type="checkbox"/> 依災害防救法第四十八條所定各項災害救助種類及標準規定，應由政府按一定標準核發之各項天然災害救助金 <sup>(6)</sup>		
	<input type="checkbox"/> 災區各項緊急搶救所需相關費用 <sup>(7)</sup>		
	<input type="checkbox"/> 搭建安置災民臨時收容所或其他安置場所相關費用 <sup>(8)</sup>		
	<input type="checkbox"/> 購置災民緊急救濟必需物資等費用 <sup>(9)</sup>		
	<input type="checkbox"/> 購置或租賃緊急救災工作必需物品、器材或設備等費用 <sup>(10)</sup>		
	<input type="checkbox"/> 災區環境清理或消毒等相關費用 <sup>(11)</sup>		
小計 <sup>(12)</sup>			
總計 <sup>(13)</sup>			

承辦人：..... 主管：..... 會計：..... 總務課長：.....

臺南市政府辦理天然災害緊急搶救及復建工程作業要點第四點搶險搶修執行作業(四) 主管機關、區公所搶險、搶修開口契約或緊急搶救經費倘不足支應時，得依災害防救法第四十三條應視需要情形調整當年度收支**移緩濟急**支應，不受預算法第六十二條及第六十三條規定之限制；並依政府採購法第一百零五條第一項第二款及特別採購招標決標處理辦法等相關規定辦理採購，並於災害發生後儘速函報災害準備金需求表(附表三)及檢附相關資料至災防辦公室申請追加經費，且簽奉核可動支災害準備金**轉正支應**。

## 105年災準金支用項目

**0206美濃地震**：維冠大樓搶救拆除大內天文館、辦公廳舍、市場及校舍緊急修復、受災家屬轎車接送、消毒水、汙水下水道清理、發電機、災民臨時收容所安置費用、交通號誌

**9月莫蘭蒂梅姬颱風**：廳舍、校舍、活動中心、圖書館緊急修復、古蹟緊急

不認列項目：

105年：列表機, 檯燈, 電扇設備, 懷恩堂及納骨塔作業基金, 逾期違約金, 消防演練, 雜草修剪

107年：中央勘災便當, 清潔車油料, 電視機及電腦設備, 牆面漏水

## 107年災準金支用項目

**8月豪雨**：校舍緊急修繕防疫消毒清運、滲水緊急處理、災民救濟餐費、避難收容處所及用品、抽水機用油、沙包

### 四、注意事項

1. 災後復建工程提報需掌握時效及相關規定，提報**中央**時須注意**核列比**，**規畫設計能力再提升**，**致災原因本專業考量**解決
2. 災後復建工程積極與**管線單位**協調溝通，以免延誤完工期限
3. 搶險搶修經費勿作平常維護修繕使用，勿全面性修復
4. 搶險搶修需**當年度竣工決算**
5. 依當次毀損程度及工程性質及時效，搶險搶修或提報列入災後復建工程案件，**2擇1納入**，**不得重複提報**

# 年度核銷作業 工程類結算應檢附資料 範例

## 臺南市政府防災資訊服務網-便民 服務-下載專區

### 工程類結算應檢附資料目錄

- 一、災害準備金自主檢查表及檢覈表
- 二、臺南市政府000年災害準備金支出明細表
- 三、核銷(付款)憑證影本《動支(請購)單發票(或收據)》
- 四、搶險搶修契約
  - (一)招(決)標公告及開(決)標紀錄。
  - (二)可顯示工程名稱、簽約金額及簽約日期之契約書(含開口契約)影本。
- 五、分段竣工結算書內依序需附資料
  - (一)封面
  - (二)工程結算驗收證明書
  - (三)驗收紀錄
  - (四)結算總表
  - (五)結算明細表
  - (六)施工日誌表
  - (七)下列表單擇一：搶險搶修會勘紀錄表(含照片)、派工單或災害應變中心通報單
  - (八)施工前中後照片
  - \*(九)視區域情況檢附當地雨量資料(搶險搶修、砂包視情況)

## 一、災害準備金自主檢查表及檢覈表

1.請依照表格上的內容填寫詳實的金額及資料。

2. 第一項格式確認內之第3點本支出明細(總)表結算(實支)總金額(第3頁,圖1),請填覆當年度搶險搶修實支總金額。

108年度: 動支災準備金辦理108年度 搶修搶險工程開口契約結算資料自主檢查表

填表人: \_\_\_\_\_ 聯絡電話: \_\_\_\_\_ 電子郵件: @mail.tainan.gov.tw

項目	細項	備註										
一、格式確認	<input type="checkbox"/> 1. 附件是否加貼標籤(逐條)分類標示清楚。	金額務必與會計室確認										
	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 結算格式是否依照範例依序檢附,是否加蓋印章。											
	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 本支出明細(總)表結算(實支)總金額: <u>516萬5,213元</u>											
	<input checked="" type="checkbox"/> 4. 原核定金額1,700萬元;追加(1次)金額850萬元											
	總核定金額2,550萬元											
	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 註銷 規劃設計 _____ 萬 _____ 元(於月日註銷)											
二、採購(付款)憑證影本	<input type="checkbox"/> 1. 憑證影本具份。											
	<input type="checkbox"/> 2. 發票日期及買受人填寫是否正確。											
	<input type="checkbox"/> 3. 金額及用途說明是否正確,是否有蓋章。											
三、契約影本	<input type="checkbox"/> 1. 工程類: 一份;非工程類: 一份,共 _____ 份。											
	<input type="checkbox"/> 2. 由「備」類公報及圖(冊)確認。											
	<input type="checkbox"/> 3. 可願者約名冊、契約金額及日期之契約內(含開口契約)影本。											
四、驗收/分段竣工結算書	<input type="checkbox"/> 1. 工程類10萬元以上(含)無開設應變中心時需檢附: <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> (1)封面</td> <td><input type="checkbox"/> (2)工程結算驗收證明書</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (3)驗收紀錄</td> <td><input type="checkbox"/> (4)結算總表</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (5)結算明細表</td> <td><input type="checkbox"/> (6)施工日誌表</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (7)搶險搶修會勘紀錄表(含照片)</td> <td><input type="checkbox"/> 派工單或災害應變中心通報單</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (8)施工前中後照片</td> <td><input type="checkbox"/> (9)視區域情況檢附當地雨量資料(搶險搶修、沙包視情況檢附)</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> (1)封面	<input type="checkbox"/> (2)工程結算驗收證明書	<input type="checkbox"/> (3)驗收紀錄	<input type="checkbox"/> (4)結算總表	<input type="checkbox"/> (5)結算明細表	<input type="checkbox"/> (6)施工日誌表	<input type="checkbox"/> (7)搶險搶修會勘紀錄表(含照片)	<input type="checkbox"/> 派工單或災害應變中心通報單	<input type="checkbox"/> (8)施工前中後照片	<input type="checkbox"/> (9)視區域情況檢附當地雨量資料(搶險搶修、沙包視情況檢附)	
	<input type="checkbox"/> (1)封面	<input type="checkbox"/> (2)工程結算驗收證明書										
	<input type="checkbox"/> (3)驗收紀錄	<input type="checkbox"/> (4)結算總表										
	<input type="checkbox"/> (5)結算明細表	<input type="checkbox"/> (6)施工日誌表										
	<input type="checkbox"/> (7)搶險搶修會勘紀錄表(含照片)	<input type="checkbox"/> 派工單或災害應變中心通報單										
	<input type="checkbox"/> (8)施工前中後照片	<input type="checkbox"/> (9)視區域情況檢附當地雨量資料(搶險搶修、沙包視情況檢附)										
	<input type="checkbox"/> 2. 非工程類: <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> (1)簽辦公文</td> <td><input type="checkbox"/> (2)結算驗收證明書</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (3)驗收紀錄</td> <td><input type="checkbox"/> (4)結算總表</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (5)結算明細表</td> <td><input type="checkbox"/> (6)前中後照片(無會說明可免附)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (7)其他可供證明支用依據之相關資料</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> (1)簽辦公文	<input type="checkbox"/> (2)結算驗收證明書	<input type="checkbox"/> (3)驗收紀錄	<input type="checkbox"/> (4)結算總表	<input type="checkbox"/> (5)結算明細表	<input type="checkbox"/> (6)前中後照片(無會說明可免附)	<input type="checkbox"/> (7)其他可供證明支用依據之相關資料				
	<input type="checkbox"/> (1)簽辦公文	<input type="checkbox"/> (2)結算驗收證明書										
	<input type="checkbox"/> (3)驗收紀錄	<input type="checkbox"/> (4)結算總表										
	<input type="checkbox"/> (5)結算明細表	<input type="checkbox"/> (6)前中後照片(無會說明可免附)										
<input type="checkbox"/> (7)其他可供證明支用依據之相關資料												
<input type="checkbox"/> 3. 10萬元以下(包含工程、非工程): ((2)至(6)無會說明可免附) <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> (1)簽辦公文</td> <td><input type="checkbox"/> (2)結算驗收證明書</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (3)驗收紀錄</td> <td><input type="checkbox"/> (4)結算總表</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (5)結算明細表</td> <td><input type="checkbox"/> (6)前中後照片(無會說明可免)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (7)其他可供證明支用依據之相關資料</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> (1)簽辦公文	<input type="checkbox"/> (2)結算驗收證明書	<input type="checkbox"/> (3)驗收紀錄	<input type="checkbox"/> (4)結算總表	<input type="checkbox"/> (5)結算明細表	<input type="checkbox"/> (6)前中後照片(無會說明可免)	<input type="checkbox"/> (7)其他可供證明支用依據之相關資料					
<input type="checkbox"/> (1)簽辦公文	<input type="checkbox"/> (2)結算驗收證明書											
<input type="checkbox"/> (3)驗收紀錄	<input type="checkbox"/> (4)結算總表											
<input type="checkbox"/> (5)結算明細表	<input type="checkbox"/> (6)前中後照片(無會說明可免)											
<input type="checkbox"/> (7)其他可供證明支用依據之相關資料												
<input type="checkbox"/> 說明												
承辦單位: _____ 會計室: _____ 機關首長: _____												

圖

## 二、支出明細(總)表

支出總表的呈現如圖1,依災害事件區分支出總經費

支出明細表的呈現如圖2,依災害事件內做了幾個工項詳細列出

1.請依照月份或災害事件製作支出明細表,了解當月或災害搶修中支出哪些項目。

臺南市 區公所辦理108年度搶險搶修支出總表

項次	標號	工程名稱	案件數	金額(元)	備註
1	108-A	108年0520梅雨搶險搶修支出	12	333,205	
2	108-B	108年0611梅雨搶險搶修支出	33	537,432	
3	108-C	108年0703梅雨搶險搶修支出	17	544,636	
4	108-D	108年8月陣雨搶險搶修支出	44	1,787,770	
5	108-E	108年9月陣雨搶險搶修支出	54	1,962,170	
總計			160	5,165,213	

製表: \_\_\_\_\_ 單位主管: \_\_\_\_\_ 主辦會計人員: \_\_\_\_\_ 機關首長或其授權人員: \_\_\_\_\_

支出明細表(圖1)

2.如檢附支出總表(圖1),總計金額要與前頁自主檢查表第3點實支總金額一致;若是檢附支出明細表(圖2)亦同。

P.S.若案件量少,可以直接用支出明細表(圖1)列出所支出的工程名稱及支出金額。

臺南市 區公所辦理108年0520梅雨搶險搶修支出明細表

項次	編號	類別	工程名稱	金額(元)	開工	預定竣工	產標	備註	
1	108-A01	攔淤	攔淤石清除	2,978	5月20日	5月22日			
2	108-A02	石塊	石塊及石子攔淤清除	14,452	5月20日	5月22日			
3	108-A03	內工	內工(石塊)攔淤清除	1,700	5月20日	5月22日		編號108-A01至108-A12之金額係為工程結算明細表工程項目1至27項僅以單價及數量計算後之金額,應包含工程結算明細表28項至31項金額。	
4	108-A04	石塊	石塊及石子攔淤	1,700	5月21日	5月23日			
5	108-A05	攔淤	攔淤泥柱竹圍治線土石清除	11,904	5月21日	5月23日			
6	108-A06	曲流	曲流及大乾管農路治線土石清除	11,904	5月21日	5月23日			
7	108-A07	二渠	二渠東大乾管農路治線土石清除	80,774	5月21日	5月27日			
8	108-A08	二渠	二渠東具仔瓦魯社新社治線清除	60,710	5月31日	6月10日			
9	108-A09	二渠	二渠東具仔瓦魯社新社治線清除	11,904	5月29日	6月11日			
10	108-A10	攔淤	攔淤泥柱竹圍農路治線清除	61,034	5月28日	5月30日			
11	108-A11	內工	內工東具仔瓦魯社治線清除	11,904	5月28日	5月28日			
12	108-A12	二渠	二渠活動中心旁農路清淤	13,094	5月28日	5月30日			
勞工安全衛生設備費(工程結算明細表)				1,429					
品質管制費(工程結算明細表)				1,429					
包商材料費及綜合管理費(工程結算明細表)				30,441					
營業費(工程結算明細表)				15,000					
總計(工程結算明細表)				333,205					

製表人: \_\_\_\_\_ 單位主管: \_\_\_\_\_ 主辦會計人員: \_\_\_\_\_ 主任秘書: \_\_\_\_\_ 區長: \_\_\_\_\_

支出總表(圖2)



二、臺南市政府108年0611梅雨災害準備金支出明細  
及  
三、核銷(付款)憑證影本《動支(請購)單發票(或收據)》

臺南市 區公所辦理108年0611梅雨搶險搶修支出明細表									
項次	編號	里別	工程名稱	金額(元)	工程期限	原標	X	Y	備註
1	108-B01	環湖里	環湖里南182號社宅馬路治綠土石崩塌	33,074	6月11日	6月28日			
2	108-B02	二溪里	二溪里其仔瓦溝路邊崩塌	41,312	6月16日	6月19日			
3	108-B03	內江里	內江里其仔瓦溝路邊崩塌	3,485	6月15日	6月19日			
4	108-B04	內江里	內江里其仔瓦溝路邊崩塌	4,676	6月15日	6月19日			
5	108-B05	內江里	內江里其仔瓦溝路邊崩塌	5,952	6月23日	6月26日			
6	108-B06	內江里	內江里其仔瓦溝路邊崩塌	51,809	6月20日	6月26日			
7	108-B07	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	48,482	6月11日	6月26日			
8	108-B08	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	19,942	6月22日	6月26日			
9	108-B09	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	1,700	6月24日	6月26日			
10	108-B10	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	17,004	6月17日	6月26日			
11	108-B11	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	4,676	6月24日	6月26日			
12	108-B12	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	14,978	6月15日	6月21日			
13	108-B13	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	5,952	6月13日	6月17日			
14	108-B14	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	15,740	6月18日	6月21日			
15	108-B15	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	5,339	6月11日	6月15日			
16	108-B16	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	22,441	6月22日	6月26日			
17	108-B17	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	6,376	6月19日	6月25日			
18	108-B18	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	5,952	6月21日	6月24日			
19	108-B19	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	3,826	6月24日	6月27日			
20	108-B20	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	3,826	6月18日	6月24日			
21	108-B21	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	4,676	6月18日	6月21日			
22	108-B22	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	3,826	6月17日	6月21日			
23	108-B23	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	5,952	6月21日	6月26日			
24	108-B24	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	5,952	6月28日	6月28日			
25	108-B25	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	39,782	6月29日	6月29日			
26	108-B26	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	5,952	6月13日	6月18日			
27	108-B27	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	32,558	6月19日	6月30日			
28	108-B28	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	31,486	6月20日	6月30日			
29	108-B29	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	5,952	6月23日	6月26日			
30	108-B30	石碇里	石碇里其仔瓦溝路邊崩塌	5,952	6月24日	6月26日			

編號108-B01至108-B30之金額係為工程結算明細表工程項目1至27項僅以單價及數量計算後之金額，尚包含工程結算明細表28項至31項金額。

臺南市 區公所 日期: 年 月 日

採購(費用動支)申請單暨黏貼憑證用紙

憑證編號: 預算科目: 金額: 用途說明:

業務計畫: 災害準備金 108年 緊急維修搶修工程  
 工作計畫: 災害準備金 544,636 108年 區署急修搶修工程  
 用途: 災後復原、其他管理工程 108年 第二期款

預算科目代碼: 總(承)辦單位: 保管: 主(會)計單位: 機關長官:

檢收(證明)

RS 11548731 統一發票(二聯式)

108年 8月 31日

品名: 108年 區署急修搶修工程 第二期款

數量: 1 單位: 次

金額: 544,636

請購單位: 採購單位: 審核人員: 機關長官:

加會有關單位

二、臺南市政府108年0703梅雨災害準備金支出明細  
及  
三、核銷(付款)憑證影本《動支(請購)單發票(或收據)》

臺南市 區公所辦理108年0703梅雨搶險搶修支出明細表									
項次	編號	里別	工程名稱	金額(元)	工程期限	原標	X	Y	備註
1	108-C01	石湖里	石湖里新厝後山農路治綠土石崩塌	38,599	7月4日	7月8日			
2	108-C02	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	62,732	7月9日	7月13日			
3	108-C03	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	27,121	7月9日	7月15日			
4	108-C04	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	9,095	7月11日	7月15日			
5	108-C05	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	36,898	7月6日	7月10日			
6	108-C06	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	83,472	7月8日	7月15日			
7	108-C07	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	5,952	7月9日	7月12日			
8	108-C08	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	13,349	7月5日	7月12日			
9	108-C09	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	11,904	7月13日	7月19日			
10	108-C10	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	7,852	7月9日	7月17日			
11	108-C11	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	27,202	7月10日	7月17日			
12	108-C12	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	46,070	7月12日	7月17日			
13	108-C13	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	68,132	7月10日	7月24日			
14	108-C14	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	17,004	7月13日	7月20日			
15	108-C15	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	3,826	7月11日	7月17日			
16	108-C16	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	7,397	7月13日	7月20日			
17	108-C17	湖龍里	湖龍里九湖龍仔內農路治綠土石崩塌	11,904	7月11日	7月17日			

編號108-C01至108-C17之金額係為工程結算明細表工程項目1至27項僅以單價及數量計算後之金額，尚包含工程結算明細表28項至31項金額。

勞工安全衛生設備費(工程結算明細表) 2,382  
 品質管制費(工程結算明細表) 2,382  
 勞工安全衛生設備費、品質管制費、品質管制費、品質管制費及綜合管理維護費 37,828  
 營業稅(工程結算明細表) 544,636  
 總計(工程結算明細表) 544,636

臺南市 區公所 日期: 年 月 日

採購(費用動支)申請單暨黏貼憑證用紙

憑證編號: 預算科目: 金額: 用途說明:

業務計畫: 災害準備金 544,636 108年 區署急修搶修工程  
 工作計畫: 災害準備金 544,636 108年 區署急修搶修工程  
 用途: 災後復原、其他管理工程 108年 第二期款

預算科目代碼: 總(承)辦單位: 保管: 主(會)計單位: 機關長官:

檢收(證明)

RS 11548703 統一發票(二聯式)

108年 8月 31日

品名: 108年 區署急修搶修工程 第二期款

數量: 1 單位: 次

金額: 544,636

請購單位: 採購單位: 審核人員: 機關長官:

加會有關單位

二、臺南市政府108年8月陣雨災害準備金支出明細  
及  
三、核銷(付款)憑證影本《動支(請購)單發票(或收據)》

臺南市 區公所辦理108年8月陣雨搶險搶修支出明細表

項次	編號	類別	工程名稱	金額(元)	開工	預定竣工	X	Y	備註
1	108-001	雜項	瑞興里大山脚路搶修工程	11,052	8月4日	8月9日			
2	108-002	二流	二流里內溝渠清理工程	17,954	8月9日	8月13日			
3	108-003	二流	二流里大內溝渠清理工程	54,065	8月7日	8月13日			
4	108-004	二流	二流里大內溝渠清理工程	21,005	8月7日	8月13日			
5	108-005	二流	二流里社社大溝渠清理工程	68,132	8月17日	8月21日			
6	108-006	二流	二流里社社大溝渠清理工程	83,872	8月19日	8月25日			
7	108-007	二流	二流里社社大溝渠清理工程	8,809	8月9日	8月9日			
8	108-008	二流	二流里社社大溝渠清理工程	52,364	8月11日	8月16日			
9	108-009	內江	內江里大內溝渠清理工程	48,309	8月10日	8月16日			
10	108-010	內江	內江里大內溝渠清理工程	14,452	8月18日	8月23日			
11	108-011	內江	內江里大內溝渠清理工程	28,056	8月23日	8月23日			
12	108-012	內江	內江里大內溝渠清理工程	8,874	8月23日	8月23日			
13	108-013	內江	內江里大內溝渠清理工程	22,972	8月4日	8月21日			
14	108-014	內江	內江里大內溝渠清理工程	68,700	8月23日	8月23日			
15	108-015	內江	內江里大內溝渠清理工程	17,004	8月23日	8月23日			
16	108-016	內江	內江里大內溝渠清理工程	7,652	8月23日	8月23日			
17	108-017	內江	內江里大內溝渠清理工程	41,239	8月23日	8月23日			
18	108-018	內江	內江里大內溝渠清理工程	43,154	8月27日	8月30日			
19	108-019	內江	內江里大內溝渠清理工程	17,904	8月23日	8月23日			
20	108-020	內江	內江里大內溝渠清理工程	28,232	8月24日	8月30日			
21	108-021	內江	內江里大內溝渠清理工程	3,852	8月11日	8月13日			
22	108-022	內江	內江里大內溝渠清理工程	19,601	8月16日	8月22日			
23	108-023	內江	內江里大內溝渠清理工程	23,888	8月23日	8月23日			
24	108-024	內江	內江里大內溝渠清理工程	85,377	8月15日	8月22日			
25	108-025	內江	內江里大內溝渠清理工程	3,400	8月7日	8月11日			
26	108-026	內江	內江里大內溝渠清理工程	11,504	8月11日	8月20日			
27	108-027	內江	內江里大內溝渠清理工程	12,329	8月23日	8月23日			
28	108-028	內江	內江里大內溝渠清理工程	11,504	8月12日	8月24日			
29	108-029	內江	內江里大內溝渠清理工程	3,624	8月23日	8月30日			
30	108-030	內江	內江里大內溝渠清理工程	7,239	8月13日	8月18日			
31	108-031	內江	內江里大內溝渠清理工程	16,480	8月13日	8月23日			
32	108-032	內江	內江里大內溝渠清理工程	8,928	8月4日	8月9日			
勞工安全衛生設備(工程結算明細表)				7,817					
品質管理費(工程結算明細表)				7,817					
意外事件及綜合保險費(工程結算明細表)				13,584					
營業稅(工程結算明細表)				6,480					
總計(工程結算明細表)				1,787,770					

編註:108-001至108-044之金額為工程結算明細表之金額。

臺南市 區公所 日期: 年 月 日

採購(費用動支)申請單暨黏貼憑證用紙

憑證編號: 預算科目: 金額: 用途說明:

預算科目代碼: 預算科目: 金額: 用途說明:

經(承)辦單位: 保管: 主(會)計單位: 機關長官:

收(發)明: 108.11.16

VL 11600650 統一發票 第一聯 存查 中華民國108年11月5日

買受人: 臺南市 區公所 地址: 臺南市 區公所 電話: 06-222-1111

品名: 雜項 數量: 1 單位: 項 金額: 11,052

品名: 二流 數量: 1 單位: 項 金額: 17,954

品名: 二流 數量: 1 單位: 項 金額: 54,065

品名: 二流 數量: 1 單位: 項 金額: 21,005

品名: 二流 數量: 1 單位: 項 金額: 68,132

品名: 二流 數量: 1 單位: 項 金額: 83,872

品名: 二流 數量: 1 單位: 項 金額: 8,809

品名: 二流 數量: 1 單位: 項 金額: 52,364

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 48,309

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 14,452

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 28,056

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 8,874

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 22,972

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 68,700

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 17,004

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 7,652

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 41,239

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 43,154

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 17,904

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 28,232

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 3,852

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 19,601

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 23,888

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 85,377

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 3,400

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 11,504

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 12,329

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 11,504

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 3,624

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 7,239

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 16,480

品名: 內江 數量: 1 單位: 項 金額: 8,928

勞工安全衛生設備(工程結算明細表) 7,817

品質管理費(工程結算明細表) 7,817

意外事件及綜合保險費(工程結算明細表) 13,584

營業稅(工程結算明細表) 6,480

總計(工程結算明細表) 1,787,770

申請人: 區公所 主辦會計人員: 審核: 備查:

二、臺南市政府108年9月陣雨災害準備金支出明細  
及  
三、核銷(付款)憑證影本《動支(請購)單發票(或收據)》

臺南市 區公所辦理108年9月陣雨搶險搶修支出明細表

項次	編號	類別	工程名稱	金額(元)	開工	預定竣工	X	Y	備註
1	108-031	二流	二流里大內溝渠清理工程	29,404	9月7日	9月12日			
2	108-032	二流	二流里大內溝渠清理工程	29,968	9月22日	9月30日			
3	108-033	二流	二流里大內溝渠清理工程	18,535	9月22日	9月30日			
4	108-034	二流	二流里大內溝渠清理工程	17,856	9月25日	9月30日			
5	108-035	二流	二流里大內溝渠清理工程	11,904	9月14日	9月29日			
6	108-036	二流	二流里大內溝渠清理工程	44,032	9月13日	9月20日			
7	108-037	二流	二流里大內溝渠清理工程	14,452	9月7日	9月12日			
8	108-038	二流	二流里大內溝渠清理工程	51,401	9月5日	9月12日			
9	108-039	二流	二流里大內溝渠清理工程	11,904	9月7日	9月12日			
10	108-040	二流	二流里大內溝渠清理工程	38,602	9月9日	9月20日			
11	108-041	二流	二流里大內溝渠清理工程	23,389	9月12日	9月29日			
12	108-042	二流	二流里大內溝渠清理工程	19,558	9月8日	9月9日			
13	108-043	二流	二流里大內溝渠清理工程	8,076	9月15日	9月23日			
14	108-044	內江	內江里大內溝渠清理工程	5,952	9月17日	9月29日			
15	108-045	內江	內江里大內溝渠清理工程	5,952	9月22日	9月30日			
16	108-046	內江	內江里大內溝渠清理工程	9,076	9月22日	9月29日			
17	108-047	內江	內江里大內溝渠清理工程	31,029	9月3日	9月20日			
18	108-048	內江	內江里大內溝渠清理工程	5,952	9月21日	9月27日			
19	108-049	內江	內江里大內溝渠清理工程	28,232	9月12日	9月23日			
20	108-050	內江	內江里大內溝渠清理工程	28,232	9月12日	9月23日			
21	108-051	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
22	108-052	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
23	108-053	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
24	108-054	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
25	108-055	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
26	108-056	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
27	108-057	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
28	108-058	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
29	108-059	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
30	108-060	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
31	108-061	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
32	108-062	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
33	108-063	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
34	108-064	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
35	108-065	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
36	108-066	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
37	108-067	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
38	108-068	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
39	108-069	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
40	108-070	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
41	108-071	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
42	108-072	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
43	108-073	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
44	108-074	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
45	108-075	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
46	108-076	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
47	108-077	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
48	108-078	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
49	108-079	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
50	108-080	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
51	108-081	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
52	108-082	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
53	108-083	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
54	108-084	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
55	108-085	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
56	108-086	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
57	108-087	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
58	108-088	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
59	108-089	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
60	108-090	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
61	108-091	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
62	108-092	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
63	108-093	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
64	108-094	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
65	108-095	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
66	108-096	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
67	108-097	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
68	108-098	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
69	108-099	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
70	108-100	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
71	108-101	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
72	108-102	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
73	108-103	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
74	108-104	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
75	108-105	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
76	108-106	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
77	108-107	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
78	108-108	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
79	108-109	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
80	108-110	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
81	108-111	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
82	108-112	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
83	108-113	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
84	108-114	內江	內江里大內溝渠清理工程	10,119	9月12日	9月23日			
85	108-11								

## 四、搶險搶修契約

請提供招(決)標公告及開(決)標紀錄及可顯示工程名稱、簽約金額及簽約日期之契約書(含開口契約)影本。

此為招(決)標公告及開(決)標紀錄表格，包含招標日期、開標日期、得標廠商名稱、得標金額等資訊。表格上方有「各標項開標紀錄」標題，下方有詳細的開標紀錄表，列出了各項標單的開標日期、得標廠商、得標金額等。

招(決)標公告及開(決)標紀錄

此為契約書封面，上方有「契約的人」欄位，列出了甲、乙兩方的負責人、地址、電話等資訊。下方有「契約日期」欄位，顯示了簽約日期。封面中央有「工程採購契約(本)」的標題。

簽約日期

此為契約書封面，上方有「工程名稱」欄位，顯示了工程名稱。下方有「工程編號」和「工程序號」欄位。封面中央有「工程採購契約(本)」的標題。

工程名稱

此為契約書內容，包含「第3條 契約價金之給付」和「第4條 契約價金之調整」等條款。第3條詳細說明了價金的給付方式和調整機制。第4條則說明了契約價金的調整方式，包括因材料價格波動而進行的調整。

簽約金額及後續擴充

## 五、分段竣工結算書(本範例共計5本0520梅雨、0611梅雨、0703梅雨、8月陣雨及9月陣雨)

(一)封面

此為分段竣工結算書封面範例 1，內容如下：  
 臺南市政府 區公所  
 108 年度 區緊急搶修搶通工程開口契約  
 分段竣工結算書  
 編號：108-A01 至 108-A12  
 工程名稱：區 108 年 0520 梅雨搶修  
 工程地點：區各里  
 工程金額：333,205 元  
 施工期限：108.05.20-108.06.10  
 施工廠商：

此為分段竣工結算書封面範例 2，內容如下：  
 臺南市政府 區公所  
 108 年度 區緊急搶修搶通工程開口契約  
 分段竣工結算書  
 編號：108-B01 至 108-B33  
 工程名稱：區 108 年 0611 梅雨搶修  
 工程地點：區各里  
 工程金額：537,432 元  
 施工期限：108.06.11-108.06.30  
 施工廠商：

## 五、分段竣工結算書 (二)搶修搶險支出明細表

臺南市 區公所辦理108年0520梅雨搶險搶修支出明細表

項次	編號	里別	工程名稱	金額(元)	工程期限		座標		備註
					開工	預定竣工	X	Y	
1	108-A01	環湖里	環湖里 巷線落石清除	2,976	5月20日	5月22日			編號108-A01至108-A12之金額係為工程結算明細表工程項目1至27項僅以單價及數量計算後之金額，無包含工程結算明細表28項至31項金額。
2	108-A02	石城里	石城里石子瀾箱涵雜木清除	14,454	5月20日	5月22日			
3	108-A03	內江里	內江里南181線往頭社沿線路樹倒塌	1,700	5月20日	5月22日			
4	108-A04	石湖里	石湖里石子瀾往 橋路樹倒塌清除	1,700	5月21日	5月23日			
5	108-A05	環湖里	環湖里往竹園沿線土石清除	11,904	5月21日	5月23日			
6	108-A06	曲溪里	曲溪里蘆荖坑農路沿線積土清除	11,904	5月24日	5月26日			
7	108-A07	二溪里	二溪里大飽農路沿線土石清除	80,774	5月21日	5月27日			
8	108-A08	二溪里	二溪里其仔瓦舊社往新社沿線清除	60,710	5月31日	6月10日			
9	108-A09	二溪里	二溪里往福德宮沿線積土清除	11,904	5月29日	6月1日			
10	108-A10	環湖里	環湖里埤仔頭農路掏空搶修	61,034	5月28日	5月30日			
11	108-A11	內郭里	內郭里洗仔尾農路清除	11,904	5月26日	5月28日			
12	108-A12	二溪里	二溪活動中心旁農路清除	13,094	5月28日	5月30日			
勞工安全衛生設備費(工程結算明細表)				1,420					勞工安全衛生設備費、品質管制費、包商利什及綜合營造保險費、營業稅，總計之金額為工程結算明細表之金額。
品質管制費(工程結算明細表)				1,420					
包商利什及綜合營造保險費(工程結算明細表)				30,441					
營業稅(工程結算明細表)				15,866					
總計(工程結算明細表)				333,205					

製表人： 單位主管： 主辦會計人員： 主任秘書： 區長：

## 五、分段竣工結算書 (二)工程結算驗收證明書及(三)驗收紀錄

〈臺南市 區公所〉工程結算驗收證明書

填發日期：108年6月13日 108-A01至108-A12

案號及契約號 107 區工合字第041號 廠商名稱

標的名稱及數量 108年度 緊急搶修搶險工程開口契約  
108年0520梅雨搶險

採購金額 未達公告金額 公告金額以上未達查核金額 查核金額以上未達巨額 巨額

搶修地點 臺南市 區各里

完成搶修日期(分段) 108年6月10日 開始驗收日期(分段) 108年6月13日 驗收合格日期(分段) 108年6月13日

逾期違約金 0 其他違約金 0

契約金額 新臺幣 1,470,000元

增減類別	第1次		第2次		合計
	金額	查准日期或核准文號	金額	查准日期或核准文號	
增加金額	0		0		0
減少金額	0		0		0

驗收扣款 (不包括逾期違約金及其他違約金)  
結算總價 新臺幣 333,205元

驗收意見  
1.廠商經機關通知災害搶修搶險地點，並於指定的時間及地點，進行搶修搶險工作，詳如施工照片。  
2.施工人員確實依現場人員指揮調度，工作執行紀錄如出勤操作運轉紀錄表。  
3.經書面資料(施工照片)審查後，准予驗收。

承辦單位主管 本機關驗收人員 上級機關驗收人員 主辦人員  
及人員簽章 簽章 簽章 簽章

說明：  
1.本證明書已含有結算內容，得免別開「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行機件檢修，應附加檢修明細表。  
2.本證明書分發各機關自行收受簽章，例如由主辦機關自存，送到會計單位製作憑證之用；經主辦機關簽章，免須領取。  
3.「驗收合格日期」：指政府採購法第73條所定「驗收完畢」之日期，即由承辦人員檢附驗收紀錄表及「驗收合格日期」之日期，請其填妥後，由承辦單位簽章。  
4.「逾期違約金」：指其他之金，以預算外或營業外收入處理，不必扣除結算總價；「其他違約金」：指例如政府採購法施行細則第68條第2項所定之履約保證金。  
5.「結算總價」：計算方式為「契約金額」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」，並主辦機關供材料費及管理費或作業費等契約以外之金額及扣除不合價額。  
6.本證明書所定圖說如不敷使用，請即增具圖說或檢附圖樣。  
7.本證明書不得複製，並應備公文處理程序後加蓋機關印章；供機關自存者，得免加蓋機關印信。

〈臺南市 區公所〉工程驗收紀錄

日期：108年6月13日 地點：區

案號及契約號 107 區工合字第041號 廠商名稱

標的名稱及數量 108年度 緊急搶修搶險工程開口契約  
區108年0520梅雨搶險搶修 驗收批次 1

採購金額 未達公告金額 公告金額以上未達查核金額 查核金額以上未達巨額 巨額

履約期限 自法標日至108年11月30日或經費用罄為止兩者擇先屆滿者定之

完成履約日期 108年6月10日(分段完成日期) 履約有無逾期 逾期 未逾期

契約金額 新臺幣1,470,000元整 契約變更追加總額 0

[驗收經過]：  
1.廠商經機關通知災害搶修搶險地點，並於指定的時間及地點，進行搶修搶險工作，詳如施工照片。  
2.施工人員確實依現場人員指揮調度，工作執行紀錄如出勤操作運轉紀錄表。  
3.經書面資料(施工照片)審查後，准予驗收。

[驗收結果]：  
與契約、圖說、貨樣規定相符。  
與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：  
[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：  
[備註]：

紀錄	會驗人員 (無者免)	上級機關驗收人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)
廠商代表	協驗人員 (無者免)	(簽章)
廠商	主辦人員 (未達公告金額者免)	主辦人員 (簽章)

## 五、分段竣工結算書 (五)結算總表

臺南市 區公所				第1頁,共1頁								
工程結算(總表)				廠商名稱								
填表日期: 中華民國108年01月04日				契約金額								
第一次變更設計: 49,692,972元				結算結果								
增加金額				減少金額								
項次	項目名稱	單位	單價	原契約 數量	原契約 金額	第一次變更設計 數量	第一次變更設計 金額	結算結果 數量	結算結果 金額	增加金額	減少金額	備註
甲	包工包料											
甲.壹	建築工程			1.0	32,623,447	1.0	34,460,031	1.0	34,427,836	0	(32,195)	
甲.貳	機電消防工程			1.0	10,153,439	1.0	9,853,303	1.0	9,820,350	0	(32,953)	
	小計[甲.壹-甲.貳]			1.0	42,776,886	1.0	44,313,334	1.0	44,248,186	0	(65,148)	
甲.參	勞工安全衛生管理費(壹+貳)×0.4%			1.0	171,108	1.0	177,253	1.0	176,992	0	(261)	
甲.肆	營造工程品質管理作業費(壹+貳)×0.6%			1.0	256,661	1.0	265,880	1.0	265,489	0	(391)	
甲.伍	材料試驗費(壹+貳)×0.5%			1.0	213,884	1.0	221,566	1.0	221,240	0	(326)	
甲.陸	承商管理費、利潤(含營造綜合保險0.3%)			1.0	2,267,175	1.0	2,348,607	1.0	2,345,154	0	(3,453)	
	小計[甲.參-甲.陸]			1.0	45,685,714	1.0	47,326,640	1.0	47,257,061	0	(69,579)	
甲.柒	加值營業稅(5%)			1.0	2,284,285	1.0	2,366,332	1.0	2,362,853	0	(3,479)	
	小計[甲.包工包料費]			1.0	47,970,000	1.0	49,692,972	1.0	49,619,914	0	(73,058)	
丙	竣工廠商借購款(拆除既有建築物殘餘價值(定值由廠商繳回30000元整,固定金額,不得因決標比例調整而變動且不入標單暨契約總價))											
	總計(不含丙)			1.0	47,970,000	1.0	49,692,972	1.0	49,619,914	0	(73,058)	

承辦商 \_\_\_\_\_ 監造單位 \_\_\_\_\_ 承辦人員 \_\_\_\_\_ 課長 \_\_\_\_\_ 主任秘書 \_\_\_\_\_ 區長 \_\_\_\_\_

## 五、分段竣工結算書 (五)結算明細表

(臺南市 區公所) 108年度 緊急搶修搶通工程開口契約 工程結算明細表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
108-A			107大			104號			廠商名稱			108年01月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
契約名稱及數量摘要			源得搶通工程開口契約			契約金額			1,470,000元整			第1頁,共1頁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
項次	項目名稱	單位	單價	數量	金額	原契約	數量	金額	第一次變更設計	數量	金額	結算結果	數量	金額	備註																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td> <td>45-80型挖機(含操作員)</td> <td>台</td> <td>3,826</td> <td>24</td> <td>91,824</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.0</td> <td>15,304</td> <td></td> <td>4.0</td> <td>15,304</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>130型挖土機(含操作員)</td> <td>台</td> <td>4,176</td> <td>24</td> <td>112,224</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.0</td> <td>8,352</td> <td></td> <td>2.0</td> <td>8,352</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>200型挖土機(含操作員)</td> <td>台</td> <td>5,181</td> <td>24</td> <td>124,344</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>120型碎機(含操作員)</td> <td>台</td> <td>4,981</td> <td>24</td> <td>97,544</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>傾卸車(20T)</td> <td>台</td> <td>3,371</td> <td>24</td> <td>85,004</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.0</td> <td>57,136</td> <td></td> <td>16.0</td> <td>57,136</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>掘土機(含機油、工資及維修費)</td> <td>台</td> <td>2,978</td> <td>24</td> <td>71,424</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>49.0</td> <td>145,824</td> <td></td> <td>49.0</td> <td>145,824</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>小型掘土機(含機油)</td> <td>台</td> <td>4,338</td> <td>24</td> <td>96,912</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>勞工</td> <td>人</td> <td>850</td> <td>100</td> <td>85,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.0</td> <td>8,500</td> <td></td> <td>10.0</td> <td>8,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>拆土車(20T)</td> <td>台</td> <td>3,826</td> <td>24</td> <td>91,824</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>拆土車(搬運車)(20T)</td> <td>台</td> <td>2,351</td> <td>24</td> <td>61,224</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.0</td> <td>5,102</td> <td></td> <td>2.0</td> <td>5,102</td> <td>註:為向商</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>掘土車</td> <td>台</td> <td>1,700</td> <td>15</td> <td>25,500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>註:一次在單一機</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>掘土機機油及維修費</td> <td>台</td> <td>250</td> <td>60</td> <td>15,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>單價分列表</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>鋼筋及管架鋼筋</td> <td>kg</td> <td>25</td> <td>200</td> <td>5,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>單價分列表</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>175kg/cm<sup>2</sup>碎機油</td> <td>kg</td> <td>1,785</td> <td>30</td> <td>53,550</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24.0</td> <td>42,840</td> <td></td> <td>24.0</td> <td>42,840</td> <td>單價分列表</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>150kg/cm<sup>2</sup>碎機油</td> <td>kg</td> <td>1,530</td> <td>30</td> <td>45,900</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>單價分列表</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>掘土車300cc水油(含機油)</td> <td>台</td> <td>1,700</td> <td>5</td> <td>8,500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>單價分列表</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>掘土車150cc水油(含機油)</td> <td>台</td> <td>2,721</td> <td>5</td> <td>13,605</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>單價分列表</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>掘土車300cc水油(含機油)</td> <td>台</td> <td>4,981</td> <td>5</td> <td>24,905</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>單價分列表</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>鋼筋路土改機(永久性)</td> <td>台</td> <td>3,307</td> <td>5</td> <td>16,535</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>單價分列表</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>石籠網(含砂塊石)</td> <td>kg</td> <td>1,470</td> <td>10</td> <td>14,700</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>單價分列表</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>掘土機機油</td> <td>kg</td> <td>125</td> <td>10</td> <td>12,500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>單價分列表</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>挖土機</td> <td>台</td> <td>250</td> <td>50</td> <td>12,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>砂包</td> <td>個</td> <td>55</td> <td>50</td> <td>2,750</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>掘土機油</td> <td>kg</td> <td>272</td> <td>30</td> <td>8,160</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>挖土機水油(含機油)</td> <td>台</td> <td>840</td> <td>30</td> <td>25,200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>掘土機水油(含機油)</td> <td>台</td> <td>1,100</td> <td>30</td> <td>33,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>掘土機油料</td> <td>式</td> <td>53,940</td> <td>1</td> <td>53,940</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>查驗單據核對</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>勞工安全衛生費</td> <td>式</td> <td>8,397</td> <td>1</td> <td>8,397</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> <td>1,420</td> <td></td> <td>1.0</td> <td>1,420</td> <td>按決標率約1.27%核5%</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>品質管制費</td> <td>式</td> <td>8,397</td> <td>1</td> <td>8,397</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> <td>1,420</td> <td></td> <td>1.0</td> <td>1,420</td> <td>按決標率約1.27%核5%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>廠商材料費及綜合管理費</td> <td>式</td> <td>107,807</td> <td>1</td> <td>107,807</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> <td>30,441</td> <td></td> <td>1.0</td> <td>30,441</td> <td>按決標率約1.27%核5% 抽費率均約0.05%,保險費 據核對</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>營業稅</td> <td>式</td> <td>70,000</td> <td>1</td> <td>70,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> <td>13,860</td> <td></td> <td>1.0</td> <td>13,860</td> <td>少20%核5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>總計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,470,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>333,285</td> <td></td> <td></td> <td>333,285</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																1	45-80型挖機(含操作員)	台	3,826	24	91,824					4.0	15,304		4.0	15,304		2	130型挖土機(含操作員)	台	4,176	24	112,224					2.0	8,352		2.0	8,352		3	200型挖土機(含操作員)	台	5,181	24	124,344											4	120型碎機(含操作員)	台	4,981	24	97,544											5	傾卸車(20T)	台	3,371	24	85,004					16.0	57,136		16.0	57,136		6	掘土機(含機油、工資及維修費)	台	2,978	24	71,424					49.0	145,824		49.0	145,824		7	小型掘土機(含機油)	台	4,338	24	96,912											8	勞工	人	850	100	85,000					10.0	8,500		10.0	8,500		9	拆土車(20T)	台	3,826	24	91,824											10	拆土車(搬運車)(20T)	台	2,351	24	61,224					2.0	5,102		2.0	5,102	註:為向商	11	掘土車	台	1,700	15	25,500										註:一次在單一機	12	掘土機機油及維修費	台	250	60	15,000										單價分列表	13	鋼筋及管架鋼筋	kg	25	200	5,000										單價分列表	14	175kg/cm <sup>2</sup> 碎機油	kg	1,785	30	53,550					24.0	42,840		24.0	42,840	單價分列表	15	150kg/cm <sup>2</sup> 碎機油	kg	1,530	30	45,900										單價分列表	16	掘土車300cc水油(含機油)	台	1,700	5	8,500										單價分列表	17	掘土車150cc水油(含機油)	台	2,721	5	13,605										單價分列表	18	掘土車300cc水油(含機油)	台	4,981	5	24,905										單價分列表	19	鋼筋路土改機(永久性)	台	3,307	5	16,535										單價分列表	20	石籠網(含砂塊石)	kg	1,470	10	14,700										單價分列表	21	掘土機機油	kg	125	10	12,500										單價分列表	22	挖土機	台	250	50	12,500											23	砂包	個	55	50	2,750											24	掘土機油	kg	272	30	8,160											25	挖土機水油(含機油)	台	840	30	25,200											26	掘土機水油(含機油)	台	1,100	30	33,000											27	掘土機油料	式	53,940	1	53,940										查驗單據核對	28	勞工安全衛生費	式	8,397	1	8,397				1.0	1,420		1.0	1,420	按決標率約1.27%核5%	29	品質管制費	式	8,397	1	8,397				1.0	1,420		1.0	1,420	按決標率約1.27%核5%	30	廠商材料費及綜合管理費	式	107,807	1	107,807				1.0	30,441		1.0	30,441	按決標率約1.27%核5% 抽費率均約0.05%,保險費 據核對	31	營業稅	式	70,000	1	70,000				1.0	13,860		1.0	13,860	少20%核5%		總計				1,470,000					333,285			333,285		
1	45-80型挖機(含操作員)	台	3,826	24	91,824					4.0	15,304		4.0	15,304																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2	130型挖土機(含操作員)	台	4,176	24	112,224					2.0	8,352		2.0	8,352																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3	200型挖土機(含操作員)	台	5,181	24	124,344																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	120型碎機(含操作員)	台	4,981	24	97,544																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5	傾卸車(20T)	台	3,371	24	85,004					16.0	57,136		16.0	57,136																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6	掘土機(含機油、工資及維修費)	台	2,978	24	71,424					49.0	145,824		49.0	145,824																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7	小型掘土機(含機油)	台	4,338	24	96,912																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8	勞工	人	850	100	85,000					10.0	8,500		10.0	8,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9	拆土車(20T)	台	3,826	24	91,824																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10	拆土車(搬運車)(20T)	台	2,351	24	61,224					2.0	5,102		2.0	5,102	註:為向商																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11	掘土車	台	1,700	15	25,500										註:一次在單一機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12	掘土機機油及維修費	台	250	60	15,000										單價分列表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
13	鋼筋及管架鋼筋	kg	25	200	5,000										單價分列表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
14	175kg/cm <sup>2</sup> 碎機油	kg	1,785	30	53,550					24.0	42,840		24.0	42,840	單價分列表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
15	150kg/cm <sup>2</sup> 碎機油	kg	1,530	30	45,900										單價分列表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
16	掘土車300cc水油(含機油)	台	1,700	5	8,500										單價分列表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17	掘土車150cc水油(含機油)	台	2,721	5	13,605										單價分列表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
18	掘土車300cc水油(含機油)	台	4,981	5	24,905										單價分列表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
19	鋼筋路土改機(永久性)	台	3,307	5	16,535										單價分列表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
20	石籠網(含砂塊石)	kg	1,470	10	14,700										單價分列表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
21	掘土機機油	kg	125	10	12,500										單價分列表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
22	挖土機	台	250	50	12,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
23	砂包	個	55	50	2,750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
24	掘土機油	kg	272	30	8,160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
25	挖土機水油(含機油)	台	840	30	25,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
26	掘土機水油(含機油)	台	1,100	30	33,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
27	掘土機油料	式	53,940	1	53,940										查驗單據核對																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
28	勞工安全衛生費	式	8,397	1	8,397				1.0	1,420		1.0	1,420	按決標率約1.27%核5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29	品質管制費	式	8,397	1	8,397				1.0	1,420		1.0	1,420	按決標率約1.27%核5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30	廠商材料費及綜合管理費	式	107,807	1	107,807				1.0	30,441		1.0	30,441	按決標率約1.27%核5% 抽費率均約0.05%,保險費 據核對																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31	營業稅	式	70,000	1	70,000				1.0	13,860		1.0	13,860	少20%核5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	總計				1,470,000					333,285			333,285																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

## 五、分段竣工結算書

### (六)施工日誌表

施工日誌表					
契約名稱：108年度 緊急搶修搶通工程開口契約					
施工廠商：					
日期	出勤時間		地點、災情概述	機具、人力出勤情形	備註
	起算	終止			
5月1日					
5月2日					
5月3日					
5月4日					
5月5日					
5月6日					
5月7日					
5月8日					
5月9日					
5月10日					
5月11日					
5月12日					
5月13日					
5月14日					
5月15日					
5月16日					
5月17日					
5月18日					
5月19日					
5月20日	15:30	18:00	環湖 機落石清除	拌土機(含租金、工資及運輸費用)1半日	108-A01
5月21日					
5月22日					
5月23日					
5月24日					
5月25日					
5月26日					
5月27日					
5月28日					
5月29日					
5月30日					
5月31日					

承攬廠商簽章：  


## 五、分段竣工結算書

(七)下列表單擇一：搶險搶修會勘紀錄表(含照片)、派工單或災害應變中心通報單

臺南市 區公所搶險搶修會勘紀錄表				
會勘事項	環湖里 石清除			
時間	108年5月20日 15時30分			
地點	里	座標：X	Y	4
會勘人員	預0520梅雨，導致環湖里落石，需派工清除。			
會勘情形	請廠商運送拌土機(含租金、工資及運輸費用)進行搶修。			
會勘意見				
會勘結論	以本所搶險搶修開口契約辦理			
承辦人：				





搶修搶險會勘紀錄表

搶險搶修派工單				
會勘編號	108-A01	廠商派工時間	108/5/20	
工程經費或GPS座標號碼	X: 108/5/20	機台派工時間	108/5/22	
機台編號	Y: 108/5/20	派工時間	108年5月20日 15時30分	
災害種類、現況描述				
備註	工作項目及數量(如可從原計畫單列為優先) 項目 1 拌土機(含租金、工資及運輸費用) 1 機台 1 機台編號(含備註)			
承攬廠商簽章	承攬廠商(含章名號)			
區公所簽章	區公所(含章名號)			

派工單



簡報結束  
敬請指教

# 復建工程規劃設計與案例探討

吳文隆 副總工程師

台灣世曦工程顧問股份有限公司

中華民國109年8月

## 目 錄

- 
- 一、概述
  - 二、常見工程缺失與問題
  - 三、工程設計考量重點
  - 四、案例探討
  - 五、結語
-

## 一、概述

1. 台灣山區地形陡峭，地質破碎，颱風豪雨，挾帶大量降雨量，造成河川沖刷與嚴重淤積。
2. 山區之道路地處偏遠，除受地形縱坡及氣候之條件，限制設計與施工之困難甚於平地。
3. 山區道路之設計、施工及維護均較一般平地道路困難，問題也比較多，牽涉範圍也比較廣，所需之技術經驗也比較高。
4. 如何從過去災害原因，經過詳細分析與檢討改進，獲得寶貴的經驗，必能將發生問題災害降至最低。

▶ 2

## 二、常見工程缺失與問題

1. 國內山區道路工程計有路工段(路堤、削坡、半挖半填、路塹)、橋梁段、隧道段、臨水路段等不同結構型式
2. 常見的工程缺失與問題
  - 規劃設計
  - 調查作業
  - 地質因素
  - 排水工程
  - 擋土設施
  - 邊坡、地錨
  - 道路工程
  - 橋梁工程
  - 河川護岸工程等方面。

▶ 3

## 2.1 規劃設計方面

1. 設計標準、規範引用不正確或舊版本。
2. 分析參數採用不合理。
3. 作用力(地震力、載重、風力等)考量不周詳或低估。
4. 分析模式不對或與學理相悖；公式套用不正確。
5. 分析計算過於粗略，過程不完整。

▶ 4

6. 設計未針對實際需求與條件進行，以致設計成果，無法符合現地情況。
7. 復建工程未進行致災原因調查分析，未掌握真正致災問題，以致設計成果無法消除破壞因素，造成日後可能重複致災之現象。
8. 設計人員未親赴現場調查，無法掌握現況與瞭解，隨意套用標準圖，以致規劃設計與現場差異大，無法施工情形。
9. 設計人員使用特殊材料、工法，僅有一家廠商生產材料、專利工法，造成綁標。
10. 材料費用未進行訪價，預算編制不合理。

▶ 5

## 2.2 調查作業

### 測量工作

1. 地形測量資料與現地地形不符合。
2. 地形圖檔座標系統採用TWD67舊系統。
3. 道路或河道斷面測量，並未實際進行現地實測，而以地形圖資料，直接剖面而得斷面資料，與現地不符合。
4. 控制點引用錯誤。
5. 實施測量範圍太小，無涵蓋計畫全區(集水區範圍)。

▶ 6

6. 地形測量資料係採用災害發生前之舊資料，所以地形資料不符合。
7. 地形圖只有地形而無座標(二度分帶座標N、E)。
8. 地形圖比例尺太小，無法精確設計或施工放樣之地形圖。
9. 測點過於集中、未均勻分布或於未於地形變化處增加測點，無法真實反應現地地形。

▶ 7

---

## 地質鑽探工作

1. 計畫區未進行地質鑽探工作，設計沒有依據。
2. 地質鑽探孔數不足，孔深未深入穩定之岩盤或不滑動之深度。
3. 滑動剖面上未配置地質鑽探孔，且未配置二孔以上之鑽孔，以茲比對及研判滑動面。
4. 土壤、岩石試驗項目與數量，未能滿足設計需求及規範之規定。
5. 鑽孔位置配置不當，過於集中某處，無法涵蓋全區，取得完整之地質狀況。

---

▶ 8

6. 地質調查方法不恰當，作業過程草率，試驗取樣品質不佳。
7. 地質鑽探柱狀圖，岩心之描述不確實。
8. 地下水水位調查，測量時間甚短，無法確實獲得長期及短期之可靠地下水位。
9. 地下水質、地下水流量、地下水流向、地下水流速，未依需求進行調查。

---

▶ 9

## 監測工作

1. 地層滑動剖面上，未配置地中傾斜管，傾斜管未深入滑動面以下之穩定地層。
2. 地下水位未長期連續觀測，並分析其與降雨量之關係。
3. 電子式水壓計設置深度錯誤，宜安裝於透水性高之地層或岩層。
4. 地下水位觀測井深度太淺，以致量測不到地下水位。
5. 孔內傾斜管與鑽孔間之回填材料未填實，以致ABS管與地層未完全密接，影響其準確性。

▶ 10

6. 傾斜管安裝方向未與滑動方向一致，以致量測資料不正確。
7. 地下水位觀測井井口高度低於地表，以致地表逕流流入，積蓄孔內，影響地下水位之正確性。
8. 地下水位觀測井，未做好濾層，以致土砂滲入或阻塞，而影響地下水位之變化。
9. 地下水位觀測井位置與傾斜管位置未能整體考量，以致無法分析之穩定性。

▶ 11

## 2.3 地質因素

道路通過下述地質較差區域及地質敏感區，若未妥適處理，則災害較易發生。

1. 崩塌地(包含舊崩塌地)
2. 順向坡
3. 地滑地
4. 砂頁岩互層
5. 泥岩受雨水沖刷，形成沖蝕溝及土石流
6. 紅土礫石層
7. 破碎帶、剪裂帶、斷層活動帶
8. 軟弱黏土層
9. 落石區或崖錐堆積區
10. 土石流/泥流及其扇狀地

▶ 12

11. 岩屑崩滑區
12. 地層下陷區
13. 向源侵蝕區及其上游
14. 洪泛影響區
15. 高回填區、廢棄物回填區、廢棄礦渣堆
16. 河川攻擊岸掏刷
17. 楔型破壞

▶ 13

## 2.4 排水工程

1. 排水溝斷面不足
2. 排水溝縱坡太陡
3. 排水結構體強度不足
4. 排水溝龜裂、破壞
5. 排水溝材料選用不當
6. 排水水溝頂高於地表面，地表逕流無法順利流入，造成地表逕流亂竄
7. 排水溝結構物回填不實
8. 排水溝流末工未消能處理(無尾溝)，而沖刷基礎
9. 橫向排水箱涵數量不足，造成水流溢出
10. 排水箱涵斷面太小，遭漂流木、土石阻塞，影響排水功能

▶ 14

11. 排水溝消能設施未設置，而沖刷坡面
12. 區域外緣邊界未設置截水溝，邊坡沖刷
13. 排水系統未設置沉砂池、集水井
14. 彎道處排水溝，因水流直進性漫溢路面
15. 排水系統未導至區域排水系統內
16. 排水系統未維護阻塞，影響排水功能
17. 排水溝位置設置於高處，水流不易流入，設置不當
18. 排水管濾料設置不當，造成橫向排水管阻塞，無法順利排水

▶ 15

## 2.5 擋土設施

1. 山區道路復建工程常見擋土設施之缺失情況如下：
2. 擋土設施結構強度不足，配筋不足，溫度鋼筋量不足
3. 重力式擋土牆昇層間(水平)，混凝土未設置剪力筋，受側向土壓力上下層間錯移
4. 擋土牆基腳承載力不足，而產生基礎承載破壞
5. 擋土牆因基礎軟弱而產生下陷、位移
6. 擋土牆水平抵抗力不足，產生水平滑動
7. 擋土牆傾倒破壞

▶ 16

8. 擋土牆位於滑動區而產生整體滑動破壞
9. 擋土牆牆背回填土夯實不足，而產生路面下陷
10. 擋土牆回填透水材料厚度不足，排水功能不佳
11. 擋土牆未設排水孔，或排水管數量不足，積蓄水壓力
12. 擋土牆基礎受雨水沖刷而掏空



道路位於滑動區而破壞

13.多階式擋土牆之側向土壓力計算低估及錯誤

14.擋土牆未設置伸縮縫，造成擠壓龜裂

15.擋土牆型式選擇不當

16.排水溝或河岸保護護岸、護坡，以擋土牆型式設計，分析模式不對，設計錯誤



河岸設施因被動不足而位移

▶ 18

17.加勁式擋土牆回填材料以黏性土壤回填

18.斜邊上採用加勁式擋土牆選用不當，滑動體重量增加，造成邊坡滑動

19.加勁式擋土牆預鑄版水平抵抗力不足，而鼓出變形

20.邊坡擋土牆基礎未保護，受河川沖刷而掏空或河川土石淤積，河床面雍高，造成裸露邊坡受沖刷，而擋土牆基礎掏刷而破壞



擋土牆因邊坡坡趾掏刷而破壞

▶ 19

- 21.擋土牆轉角處受到三方面應力，接縫處未剪力筋，產生龜裂而位移
- 22.擋土牆高度太高，側向力分量低估，因強度不足，而發生位移破壞。
- 23.道路拓寬開挖新舊地層介面，未妥善處理排水及做成階梯式之坡面，增加抵抗滑動之設置



擋土牆高度太高水平抵抗而位移

- 24.擋土牆牆面排水管之水流，未有效加以導排至區域排水系統
- 25.擋土牆勁度不足，側向位移過大
- 26.擋土牆長度不足，高度不足而產生邊坡崩塌
- 27.擋土牆端部之側面未保護，以致土石崩落

## 2.6 自然邊坡及人工邊坡

1. 邊坡修坡超挖，坡度過陡，而產生滑動
2. 邊坡未植生保護，而產生坡面沖刷
3. 邊坡未分階段、設截流溝，沖刷破壞
4. 邊坡地下水過高，邊坡滑動
5. 邊坡受野溪沖刷及侵蝕
6. 邊坡未設截排水設施，造成邊坡滑動
7. 邊坡回填作業，未充分夯實

▶ 22

8. 邊坡裂隙未回填補實，地表逕流易入滲
9. 順向坡坡腳挖斷，形成不穩定
10. 邊坡坡腳之排水溝過深，失去側向抵抗，形成不穩定
11. 邊坡開挖不當
12. 於行水區填築邊坡
13. 邊坡坡面排水未考量
14. 邊坡受豪雨作用，排水不及而產生滑動

▶ 23

## 2.7 地錨

1. 地錨鋼腱長期銹蝕的問題
2. 深入滑動面之錨碇段長度不足
3. 自由段灌漿不確實，灌漿未灌滿，形成空隙及裸露
4. 地錨預力損失
5. 地錨錨頭承壓板角度與鑽孔角度不合，形成折角
6. 地錨施做傾角過大，產生向下之拉力，不利邊坡穩定
7. 預鑄格梁錨座，因地層沖刷掏空而下滑，造成預力失效
8. 地錨檢查及維護未落實
9. 整體地錨護坡穩定性或抗拉力不足

## 2.8 道路工程

1. 道路縱坡過陡，轉彎半徑太小
2. 道路路基未確實分層夯實
3. 道路路基、鋪面厚度不足
4. 道路邊溝排水不良，漫溢路面
5. 道路位於地滑區而滑動位移
6. 道路橫向排水不足或過度集中排水
7. 道路大挖大填，對地形改變太大
8. 未有效截水及排水，道路路面形成天然排水溝
9. 陡峻山區拓寬削坡不當
10. 道路拓寬半邊橋結構不穩定

- 11.道路經溪溝受土石流沖毀
- 12.道路路基過低，受洪水漫溢損壞
- 13.道路下陷、龜裂
- 14.道路路基流失，交通中斷
- 15.道路邊坡保護不足，落石、土石崩落掩蓋路面
- 16.道路面排水，未向內側排放，以致直接沖刷道路下邊坡
- 17.路面鋪築不良或欄未考慮排水開孔，造成局部積水



邊坡滑動道路路基流失

▶ 26

## 2.9 橋梁

- 1.橋梁跨度不足，淨高不足，通洪斷面太小
- 2.橋梁之橋墩立於土石流溪溝中，受土石沖擊而損壞
- 3.橋臺、橋墩未做好保護，產生基礎沖刷而嚴重裸露
- 4.橋梁型式研選不佳
- 5.橋址位於攻擊岸或河道束縮處，易於沖刷而損毀
- 6.橋址位於地質不穩定區域，易於產生破壞



橋梁跨度與淨高不足



橋梁遭洪水、土石流沖毀

42

▶ 27

7. 橋梁縱坡過陡
8. 橋梁橋面排水及集水未妥為處理，以致漫溢
9. 河道淤積，造成洪水沖毀橋梁
10. 橋梁因土石流、溪水暴漲，遭洪水沖斷。
11. 河道刷深，造成橋梁基礎裸露
12. 洪水沖刷基礎橋台背牆位移破壞



橋梁遭洪水、土石流沖毀



土石流造成河床淤積

▶ 28

13. 翼牆與橋台旁防洪牆共構基礎遭洪水沖刷破壞
14. 洪水挾帶石塊、漂流木撞擊大梁，大梁損毀
15. 橋梁之伸縮縫型式設計欠佳，無法滿足需求

▶ 29

## 2.10 河川護岸

1. 水路流速過大，使護岸基腳掏空或沖毀
2. 水路流速過大，護岸面被異物撞擊損毀，堤防破壞
3. 河道未導流及消能
4. 潛壩、梳子壩基礎未座落於堅實地盤上，或兩側翼牆未嵌入岩盤，易於掏刷破壞
5. 護岸基腳未做妥適之保護工(如鼎形塊、菱形塊，固床工、丁壩...)



護岸基礎掏刷而破壞

▶ 30

6. 河道護岸斷面太小，造成洪水溢流
7. 河道護岸線形太彎，因水流直進性，無法渲洩，造成溢流沖刷
8. 河床固床工未與兩側護岸連結(如剪力筋)
9. 河道坡度陡，未考慮水流消能設施
10. 護岸不連續，部分未保護，形成缺口，造成護岸損壞



土石流直進性沖毀學校房舍

▶ 31

11.河道淤積或受支流土石流沖積扇堆積，阻礙河道，形成河道束縮或堰塞湖

12.整地後護岸位於河道內，因洪水而沖毀護岸

▶ 32

## 2.11 明隧道、山岳隧道工程

- 1.明隧道長度不足，造成洞口被土石掩埋
- 2.明隧道頂版斜度不足，土石積壓造成混凝土頂版破壞
- 3.明隧道頂版未設緩衝材，落石之直接撞擊而破壞
- 4.明隧道之下邊坡坡腳受溪水掏空而破壞
- 5.明隧道受上邊坡側向力推擠，而造成樑柱結構之龜裂及損壞



明隧道長度不足洞口遭土石掩埋

▶ 33

- 
6. 山岳隧道路線經過地滑區範圍，隧道受地層滑動而破壞
  7. 隧道洞口位於凹澗谷地，形成水流、土石之沖刷
  8. 隧道洞口位於溪流附近，高程不足，河床淤積，而形成河水倒灌

### 三、工程設計考量重點

---

#### 災害復建工程

- 在進行設計之前，必須對現場進行調查與瞭解災損情形
- 說明災損之範圍及危險性之評估，並掌握破壞模式與致災原因分析
- 研擬有效解決方案後，消除致災原因，避免日後重複致災問題
- 參考過去成功經驗，避免前述之缺失與問題，經相關單位核准，再進行復建工程設計及後續發包施工。

## 3.2 新建工程

- 有關山區道路新建工程，須依業主需求、環評承諾項目及設計標準、規範收集相關之資料與考量現場地質、地形條件、氣象、水文、生態、交通、人文等進行分析設計
- 避免過去常見之缺失之發生
- 將環境影響之干擾降低最低，避免大挖大填，儘量使土石方平衡，及就地取材

## 四、案例探討

- 88水災
- 敏督利風災
- 桃芝風災
- 納莉風災
- 象神風災
- 其他

# 88水災 — 台17線雙園大橋災害



災前



災後

38

38

# 88水災 — 台20線桃源勤和至復興路段中期道路(橋)修復工程

復建前



復建前



39

48

# 88水災—小林村大崩坍(台29線)

A photo taken from helicopter by Mr. Chi



40

Photos provided by C.T. Cheng

**Before**



**After**



# 88水災—台18線37K~40K路段崩坍

**整治前**



**整治後**



2011/11/14

41

# 88水災—台18線59.1K災後重建

整治前




便道上、下邊坡邊坡、地層裸露

整治後



下邊坡採排樁及擋土牆、  
上邊坡採自由型框及石籠護坡

# 88水災—台18線71K災後重建

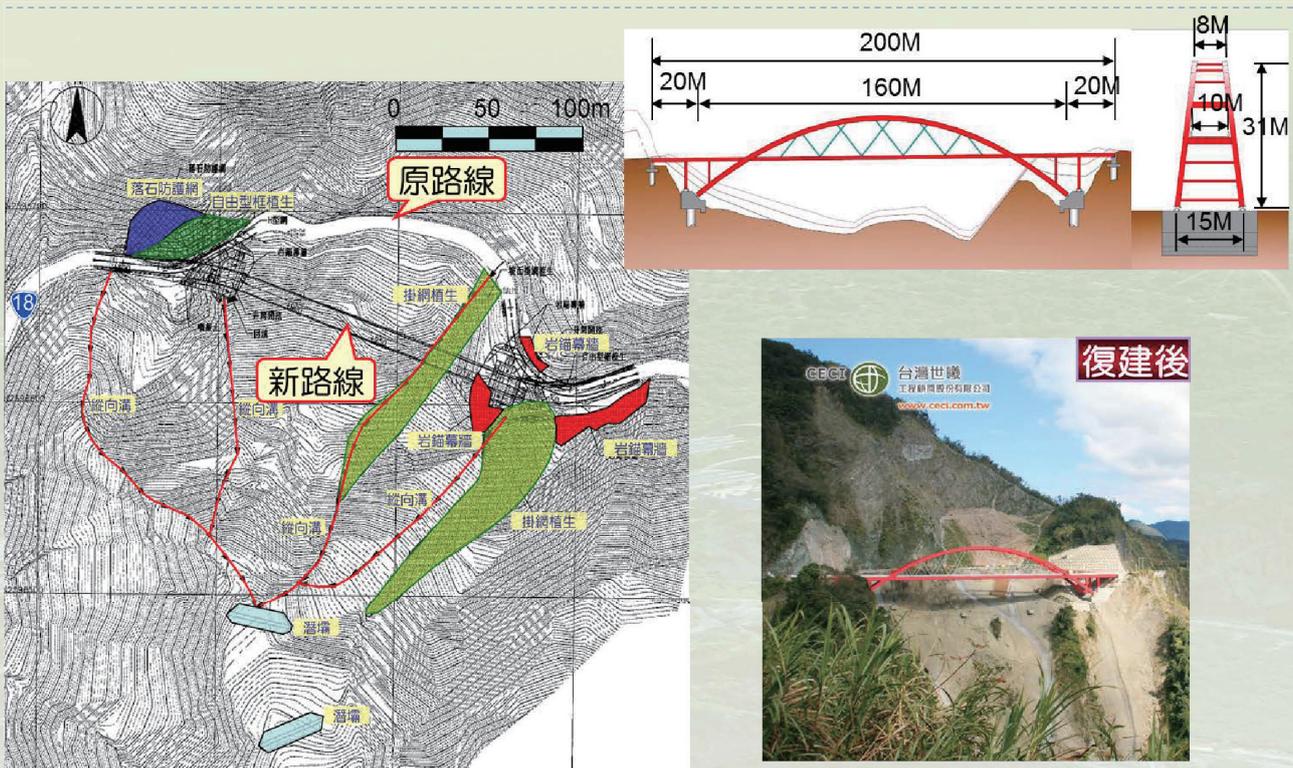

半穿式鋼拱橋

# 88水災—162甲災後重建

復建前



道路邊坡坍塌形成峭壁

復建後



隧道繞道避開崩坍區

44

# 敏督利風災—排水箱涵配合潛壩及沈砂池 跨過土石流溪溝(箱涵橋)

- 案例：力行產業道路

重建前



重建後




45

# 桃芝風災 — 以沉砂池配合潛壩及梳子壩， 攔阻流下土石(沉砂池)

- 案例：溪頭教育園區土石流整治

**重建前**

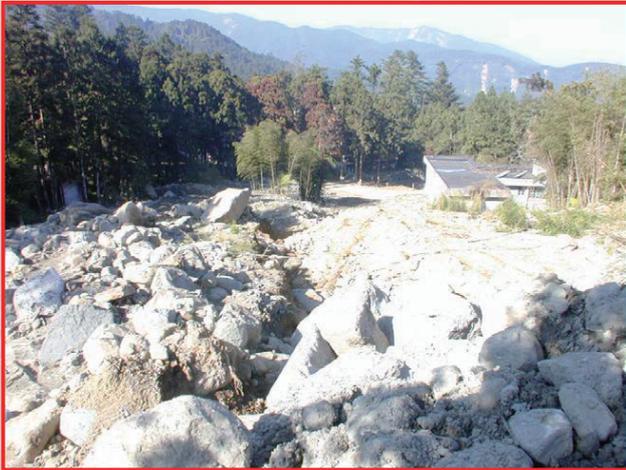

**重建後**



46


# 桃芝風災 — 繞至大崩坍坡內穩定岩盤，以 隧道方式避開崩坍區(隧道)

- 案例：安定彎隧道

**重建前**



**重建後**

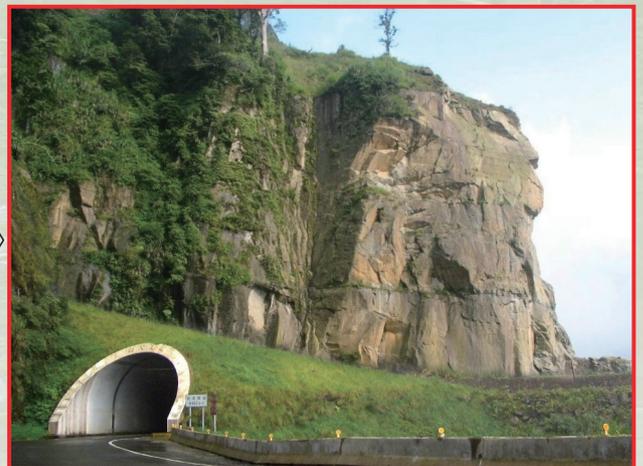

47

# 納莉風災 — 排樁配合地錨以及RC格框護坡 修復邊坡(排樁+地錨)

- 案例：陽明大學

**重建前**



**重建後**



48

# 象神風災 — 外移路線至大崩坍破壞影響區，以 大跨π型鋼橋跨越崩坍區(長跨橋)

- 案例：北29線汐萬路彩虹橋

**重建前**



**重建後**



49

# 象神風災一路堤擋土牆方式配合排水改善 修護路基(路堤擋土牆+排水改善)

- 案例：北33線汐碇路

**重建前**



**重建後**



50

# 國道3號3.1k順向坡滑動災害

**重建前**



**重建後**



51

# 重建方案及案例－隧道擴建

保留既有洞口擋土牆，作為施工及通行階段邊坡擋土牆  
採用縱向先撐構件，防止既有隧道頂拱空洞鬆弛掉落

● 案例：陽明-榮總連絡隧道

重建前



重建後




52


# 活動斷層影響－中寮隧道改善工程

國道三號中寮隧道下盤部分挖除(100m、75m)改為路塹。  
國道三號田寮三號橋拆除改為路堤。

改善前

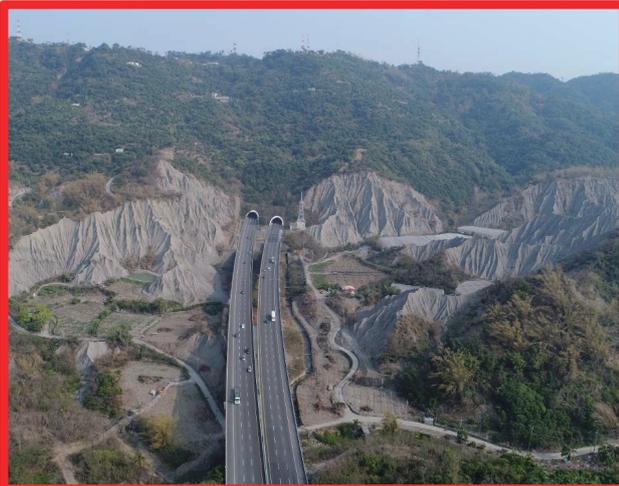

改善後

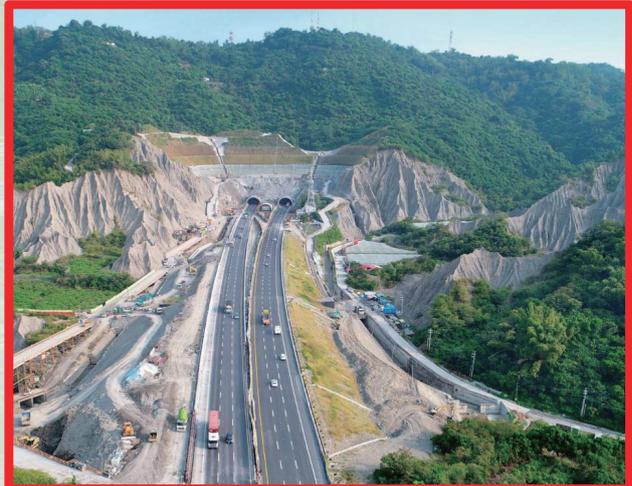

53

55

## 五、結語

---

- 山區道路工程困難度與複雜性較一般平地高，極易因未臻周詳設計或施工而發生損壞。
- 山區道路對於導水、排水處理最為重要。
- 我國地狹人稠，山區道路之新建或復建，宜應注意過去常見之缺失與問題，加以檢討與分析，提供借鏡，避免再度發生。
- 全球氣候遷及極端氣候影響之下，山區道路除設計時應將設計標準提高外，並以全生命週期之考量，施工完成後，平時加強維護及檢查，並確保道路工程長期穩定與安全。















